



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ**




**Έργο: «3η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020»
Αρ. Σύμβασης: 1487/24.05.2023**

3ο ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ

30 Νοεμβρίου 2023



3η Αξιολόγηση Εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020



REMACO
Management Consultants

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ.....	1
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.....	3
1.1.1. Στόχοι, Δομή και Λογική Παρέμβασης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	3
1.1.2. Αναθεωρήσεις του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.....	18
2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.....	26
2.1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.....	26
2.1.1. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 συνολικά	26
2.1.2. Διαχρονική εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ.....	34
2.1.3. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας	40
2.1.4. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ανά Θεματικό Στόχο.....	51
2.1.5. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα	62
2.1.6. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ σε όρους αποτελεσματικότητας	67
2.2. Αξιολόγηση της προόδου και της δυνατότητας επίτευξης των στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΤΠΑ	76
2.2.1. Αποτίμηση της προόδου επίτευξης των στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΤΠΑ (ανά Επενδυτική Προτεραιότητα).....	76
2.2.2. Εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης των τελικών τιμών στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΤΠΑ.....	91
2.3. Αξιολόγηση της προόδου και της δυνατότητας επίτευξης των στόχων των Δεικτών Εκροής και Άμεσου Αποτελέσματος ΕΚΤ.....	105
2.3.1. Αποτίμηση της προόδου επίτευξης των στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΚΤ (ανά Επενδυτική Προτεραιότητα).....	105
2.3.2. Ανάλυση δεδομένων τιμών επίτευξης των κοινών Δεικτών Εκροής και Άμεσου Αποτελέσματος ΕΚΤ	114
2.3.3. Εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης των τελικών τιμών στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΚΤ	123
2.4. Βασικά Συμπεράσματα από την ανάλυση της Αποτελεσματικότητας	130
3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ	135
3.1. Αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας	135
3.2. Εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων.....	139
3.3. Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων	142
4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.....	147
4.1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα	147
4.2. Εκτίμηση της επάρκειας των διατιθέμενων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	152
4.2.1. Βαθμός επικινδυνότητας των έργων του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020.....	152
4.2.2. Εκτίμηση του βαθμού οικονομικής ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων	153
4.3. Εντοπισμός τυχόν υπερβάσεων και αποκλίσεων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και ανάλυση του βαθμού επιρροής τους στη στοχοθεσία του Πλαισίου Επιδόσεων.....	156
5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.....	158
5.1. Βασικές εξελίξεις στο περιβάλλον και στους τομείς παρέμβασης του ΕΠ Ηπείρου.....	158
5.2. Αξιολόγηση επικαιρότητας της λογικής παρέμβασης και των ειδικών στόχων του ΕΠ	168
5.3. Αποτίμηση προόδου και δυνατότητας επίτευξης των τιμών στόχου των Δεικτών Αποτελέσματος ΕΤΠΑ/ΕΚΤ	172
5.4. Εξέταση της συμβολής των Δεικτών Εκροής και Αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος.....	187
5.4.1. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 1.....	187
5.4.2. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 2.....	192
5.4.3. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 3.....	197
5.4.4. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4.....	197
5.4.5. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 5.....	200
5.5. Συμπεράσματα από την ανάλυση της λογικής παρέμβασης του Προγράμματος.....	207

6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020	209
6.1. Αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020	209
6.2. Παρουσίαση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020» ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα	210
6.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ	210
6.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη	213
6.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	216
6.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας	217
6.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων	217
6.2.6. Άξονας Προτεραιότητας Τεχνικής Βοήθειας	220
7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	222
7.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ	222
7.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ	223
7.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη	228
7.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	234
7.1.4. Άξονας Προτεραιότητας 4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας	235
7.1.5. Άξονας Προτεραιότητας 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων	237
7.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	247
7.2.1. Προβλεπόμενες Αξιολογήσεις Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020	247
7.2.2. Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020	250
7.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ	259
7.3.1. Σκοπός και Αντικείμενο της Τελικής Αξιολόγησης Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020	259
7.3.2. Κριτήρια Αξιολόγησης και Αξιολογικά Ερωτήματα	260
7.3.3. Εξειδίκευση αξιολογικών ερωτημάτων ανά Θεματικό Στόχο	261
8. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020.....	270
9. ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ	275

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα Έκθεση αποτελεί το **3^ο Παραδοτέο** του Έργου «**3η Αξιολόγηση εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020**», το οποίο εκπονείται από την REMACO Α.Ε., με βάση την από 24 Μαΐου 2023 σχετική σύμβαση που υπογράφηκε με την *Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου*.

Βασικός σκοπός του Έργου της 3^{ης} Αξιολόγησης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, είναι να διαπιστώσει την απόδοση των υλοποιούμενων δράσεων, το βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων και την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος. Η Αξιολόγηση εστιάζει στην αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020, στο βαθμό επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων και στην επικαιρότητα της λογικής της Παρέμβασης, ενόψει και της τελικής αναθεώρησης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το παρόν Παραδοτέο αποτελεί την Τελική Αξιολόγηση του Προγράμματος, περιλαμβάνει απαντήσεις στο σύνολο των αξιολογικών ερωτημάτων των Ενοτήτων Α-Ζ της Αξιολόγησης, και έχει δομηθεί με βάση τις Ενότητες Αξιολόγησης και τα επιμέρους αξιολογικά ερωτήματα που προβλέπει η σχετική σύμβαση, ενώ παράλληλα περιλαμβάνει μια συνοπτική αναφορά στο περιεχόμενο και τους στόχους του Προγράμματος (Κεφάλαιο 1), καθώς και το Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της αξιολόγησης (Κεφάλαιο 9).

Ειδικότερα, το 3ο Παραδοτέο της «3ης Αξιολόγησης εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020», έχει δομηθεί ως ακολούθως:

1. Συνοπτική Παρουσίαση του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020
2. Αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης και της αποτελεσματικότητας του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου [Ενότητα Αξιολόγησης Α]
3. Αξιολόγηση της προόδου και των προοπτικών επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων [Ενότητα Αξιολόγησης Β]
4. Αξιολόγηση της αποδοτικότητας του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου [Ενότητα Αξιολόγησης Γ]
5. Ανάλυση της επικαιρότητας της λογικής παρέμβασης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου [Ενότητα Αξιολόγησης Δ]
6. Τεκμηρίωση ανάγκης αναθεώρησης του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου [Ενότητα Αξιολόγησης Ε]
7. Προετοιμασία για τις Αξιολογήσεις Επιπτώσεων [Ενότητα Αξιολόγησης ΣΤ]
8. Αποτίμηση της συνεισφοράς του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 στους στόχους της στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 [Ενότητα Αξιολόγησης Ζ]
9. Πλάνο διάδοσης συμπερασμάτων και συστάσεων της αξιολόγησης

Συμπληρωματικά προς τα παραπάνω διακριτά εκπονήθηκε Επιτελική Σύνοψη των συμπερασμάτων και των συστάσεων της Αξιολόγησης, καθώς και απλοποιημένη έκδοσή της, στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020: ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

1.1.1. Στόχοι, Δομή και Λογική Παρέμβασης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Το Ε.Π. «**Ηπειρος 2014-2020**» αποτελεί μέρος της δομής του ΕΣΠΑ 2014-2020 και ένα από τα 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο χρηματοδοτείται από δύο διαρθρωτικά Ταμεία (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από Εθνικούς Πόρους. **Εγκρίθηκε** με την C(2014) 10172 Εκτελεστική Απόφαση της 18.12.2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το **Αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας**, στο οποίο επικεντρώθηκε η δομή και διάρθρωση του ΕΠ «**Ηπειρος 2014-2020**» είναι:

«Να καταστεί Αξιοβίωτη και αυτοτροφοδοτούμενη, έχοντας εξωστρεφή ανάπτυξη, εστιασμένη στις παραγωγικές δραστηριότητες που αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα και ενισχύουν την τοπική ταυτότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον, την ιστορία και τον πολίτη της Ηπείρου»

Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην υλοποίηση της **Περιφερειακής Στρατηγικής «Εξυπνης Εξειδίκευσης»** η οποία αποτελεί κεντρική συνιστώσα της περιφερειακής στρατηγικής. Η στρατηγική της «Εξυπνης Εξειδίκευσης» βασίζεται στη διαμόρφωση ρεαλιστικών επιλογών για τις δυνατότητες και την προοπτική των υφιστάμενων ή αναδυόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων, οι οποίες με την εφαρμογή του κατάλληλου μίγματος πολιτικών μπορούν να αποτελέσουν τις βάσεις του οικονομικού μετασχηματισμού της Περιφέρειας Ηπείρου.

Ειδικότερα, οι βασικές κατευθύνσεις-επιλογές παρέμβασης αφορούν τους κάτωθι τομείς εξειδίκευσης:

- ✓ Πρωτογενής τομέας – μεταποίηση – αγροδιατροφή – γαστρονομία
- ✓ Βιομηχανία της εμπειρίας: Τουρισμός, Πολιτισμός & Δημιουργική Οικονομία
- ✓ Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, ΤΠΕ και νεανική επιχειρηματικότητα
- ✓ Υγεία και Ευεξία

Η επίτευξη του Αναπτυξιακού Οράματος της Περιφέρειας, ΑΠ αποτελέσει σημαντικό σημείο εκκίνησης στο νέο Αναπτυξιακό Πρότυπο της χώρας, καθώς σε αυτό προσδιορίζονται ως κρίσιμοι τομείς για την επανεκκίνηση της οικονομίας τόσο ο κλάδος του τουρισμού (προσέλκυση επενδύσεων, ανάπτυξη νέων προϊόντων), όσο και ο πρωτογενής τομέας (έμφαση στην αύξηση του ποσοστού μεταποίησης αγροτικών προϊόντων και στην προώθησή τους στις διεθνείς αγορές).

Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχονταν σε **260.677.513€** Κοινοτική Συνδρομή (325.846.893€ Δημόσια Δαπάνη), με πηγές χρηματοδότησης το **Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)** με 226.500.790€ ΚΣ (283.125.989€ ΔΔ) και το **Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)**, με 34.176.723€ ΚΣ 42.720.904€ ΔΔ).

Η επίτευξη του οράματος του ΕΠ «**Ηπειρος 2014-2020**» επιτυγχάνεται μέσω πέντε Στρατηγικών Στόχων:

- ▶ **ΣΣ1:** Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ
- ▶ **ΣΣ2:** Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη
- ▶ **ΣΣ3:** Ενίσχυση υποδομών μεταφορών
- ▶ **ΣΣ4:** Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας
- ▶ **ΣΣ5:** Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

Επιπρόσθετα, το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας περιλαμβάνει μία ολοκληρωμένη χωρική προσέγγιση με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων για προγράμματα τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών

κοινοτήτων, για ολοκληρωμένες δράσεις για βιώσιμη αστική ανάπτυξη και για ολοκληρωμένες εδαφικές επενδύσεις (ΟΕΕ).

Τέλος, αναφέρεται ότι η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει στην στρατηγική της Ε.Ε. για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR), στόχο της οποίας αποτελεί η προώθηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας μέσω της γαλάζιας ανάπτυξης, η δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης στην περιοχή μέσω της βελτίωσης της ελκυστικότητας, της ανταγωνιστικότητας και της συνδεσιμότητας των περιφερειών που συμμετέχουν στη στρατηγική. Στο πλαίσιο αυτό παρεμβάσεις που ΑΠ χρηματοδοτηθούν από το ΠΕΠ Ηπείρου ΑΠ εξυπηρετήσουν και την επίτευξη των στόχων της εν λόγω Μακροπεριφερειακής Στρατηγικής.

Κάθε Στρατηγικός Στόχος συνδέεται με συγκεκριμένους Θεματικούς Στόχους (ΘΣ) οι οποίοι ικανοποιούν την εθνική στρατηγική όπως αυτή εκφράζεται από το Σύμφωνο Εταιρικής Σχέσης 2014-2020 και την ευρωπαϊκή στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (Ευρώπη 2020). Η σύνδεση των Στρατηγικών Στόχων του ΕΠ «Ηπείρος 2014-2020» με τους Θεματικούς Στόχους παρουσιάζεται ακολούθως.

Πίνακας 1. Παρουσίαση Θεματικών Στόχων ανά Στρατηγικό Στόχο του ΕΠ

ΣΣ 1	Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ	ΕΤΠΑ
	▶ ΘΣ 1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της Καινοτομίας ▶ ΘΣ 2. Βελτίωση της πρόσβασης σε Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), της χρήσης και της ποιότητάς τους ▶ ΘΣ 3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων	
ΣΣ 2	Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη	ΕΤΠΑ
	▶ ΘΣ 4. Υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς ▶ ΘΣ 5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή και της πρόληψης των κινδύνων ▶ ΘΣ 6. Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων	
ΣΣ 3	Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	ΕΤΠΑ
	▶ ΘΣ 7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές δικτύων	
ΣΣ 4	Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας	ΕΤΠΑ
	▶ ΘΣ 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης ▶ ΘΣ 10. Επένδυση στην εκπαίδευση και κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και στη δια βίου μάθηση	
ΣΣ 5	Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων	ΕΚΤ
	▶ ΘΣ 8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων ▶ ΘΣ 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε διάκρισης	

Με βάση τις προαναφερόμενες προτεραιότητες για την εξυπηρέτηση του κεντρικού στόχου – οράματος της Περιφέρειας, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Ηπείρου δομείται σε 7 Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ), από τους οποίους οι πέντε πρώτοι ΑΠ αντιστοιχούν στους πέντε Στρατηγικούς Στόχους και οι δύο τελευταίοι ΑΠ αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ και ΕΤΠΑ του Προγράμματος.

Ειδικότερα, οι ΑΠ του ΕΠ «Ηπείρος 2014-2020» είναι οι εξής:

- **Άξονας Προτεραιότητας 1:** Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 1 στοχεύουν στην ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας (με επικέντρωση στις ΜΜΕ), με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ και εντάσσονται στους ακόλουθους Θεματικούς Στόχους (ΕΤΠΑ):

- ▶ **Θεματικός Στόχος 1.** Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας: *Δράσεις προώθησης της Στρατηγικής της Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας και διασύνδεσης του ερευνητικού συστήματος με τους παραγωγικούς τομείς της (πραγματική οικονομία).*
- ▶ **Θεματικός στόχος 2.** Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών: *Δράσεις ενίσχυσης της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ, Δράσεις ανάπτυξης και προώθησης της χρήσης ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α.*
- ▶ **Θεματικός στόχος 3.** Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων: *Δράσεις υποστήριξης νέων ή υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, Υποστήριξης της οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας των ΜΜΕ, Ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού, Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (ΤΕΠΙΧ II), Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19.*

- **Άξονας Προτεραιότητας 2:** Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 2 στοχεύουν στην Προστασία του περιβάλλοντος και την αειφόρο ανάπτυξη και εντάσσονται στους ακόλουθους Θεματικούς Στόχους (ΕΤΠΑ):

- ▶ **Θεματικός Στόχος 4.** Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς: *Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του τομέα μεταφορών, των δημόσιων και ιδιόκτητων κτηρίων.*
- ▶ **Θεματικός στόχος 5.** Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: *Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.*
- ▶ **Θεματικός στόχος 6.** Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων: *Δράσεις διαχείρισης υδάτινων πόρων και λυμάτων, ανάδειξης και αξιοποίησης του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος και προστασίας περιοχών οικολογικής αξίας.*

- **Άξονας Προτεραιότητας 3:** Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 3 στοχεύουν στην Ενίσχυση υποδομών μεταφορών και εντάσσονται στον ακόλουθο Θεματικό Στόχο (ΕΤΠΑ):

- ▶ **Θεματικός στόχος 7.** Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων: *Δράσεις υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομών και βελτίωσης της ασφάλειας του οδικού δικτύου.*

- **Άξονας Προτεραιότητας 4:** Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 4 στοχεύουν στην ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας και επαγγελματικής εκπαίδευσης και εντάσσονται στους ακόλουθους Θεματικούς

Στόχους (ΕΤΠΑ):

- ▶ Θεματικός στόχος 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης: *Δράσεις υποδομών υγείας, πρόνοιας, φροντίδας και στέγασης.*
 - ▶ Θεματικός στόχος 10. Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση: *Δράσεις υποδομών προσχολικής, σχολικής εκπαίδευσης και αρχικής εκπαίδευσης ενηλίκων.*
- **Άξονας Προτεραιότητας 5:** Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.

Οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 5 στοχεύουν στην της απασχόλησης και της κινητικότητας των εργαζομένων και την κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση των διακρίσεων και εντάσσονται στους ακόλουθους Θεματικούς Στόχους (ΕΚΤ):

- ▶ Θεματικός στόχος 8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων: *Δράσεις υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας τοπικών συμπράξεων.*
 - ▶ Θεματικός στόχος 9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης: *Δράσεις υποστήριξης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας.*
- **Άξονας Προτεραιότητας 6:** Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ.

Αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος για την εφαρμογή των δράσεων ΕΚΤ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5 και περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών της Διαχειριστικής Αρχής, των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης, καθώς και των Δικαιούχων και λοιπών εμπλεκόμενων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων ΕΚΤ του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:

- Δράσεις για την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- Εκπόνηση Αξιολογήσεων, Μελετών – Εμπειρογνωμοσύνη και Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων
- Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

- **Άξονας Προτεραιότητας 7:** Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ.

Αφορά στην Τεχνική Βοήθεια του Προγράμματος για την εφαρμογή των δράσεων ΕΤΠΑ που υλοποιούνται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1 έως 4 και περιλαμβάνει δράσεις για την ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών της Διαχειριστικής Αρχής, των υποστηρικτικών δομών του συστήματος διοίκησης, καθώς και των Δικαιούχων και λοιπών εμπλεκόμενων με στόχο την αποτελεσματική εφαρμογή των δράσεων ΕΤΠΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος. Ειδικότερα, περιλαμβάνει:


- Δράσεις για την προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος
- Εκπόνηση Αξιολογήσεων, Μελετών – Εμπειρογνωμοσύνη και Υπηρεσίες Τεχνικών Συμβούλων
- Ενέργειες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι η στρατηγική του ΕΠ εξειδικεύεται περαιτέρω σε Επενδυτικές Προτεραιότητες ανά Θεματικό Στόχο και Ειδικούς Στόχους ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, ενώ για την παρακολούθηση του ΕΠ έχουν διαμορφωθεί κατάλληλοι δείκτες εκροών και αποτελέσματος.

Η διάρθρωση του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 σε ΑΠ, ΘΣ, Ε.Π. και ΕΣ παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα, ενώ στον Πίνακα που ακολουθεί του Σχήματος αναλύεται η **Λογική Παρέμβασης του Προγράμματος με τη χρήση του**

Logical Framework, όπως διαμορφώθηκε μετά την 5η αναθεώρηση του Προγράμματος το 2021.

Σχήμα 1. Παρουσίαση Δομής ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

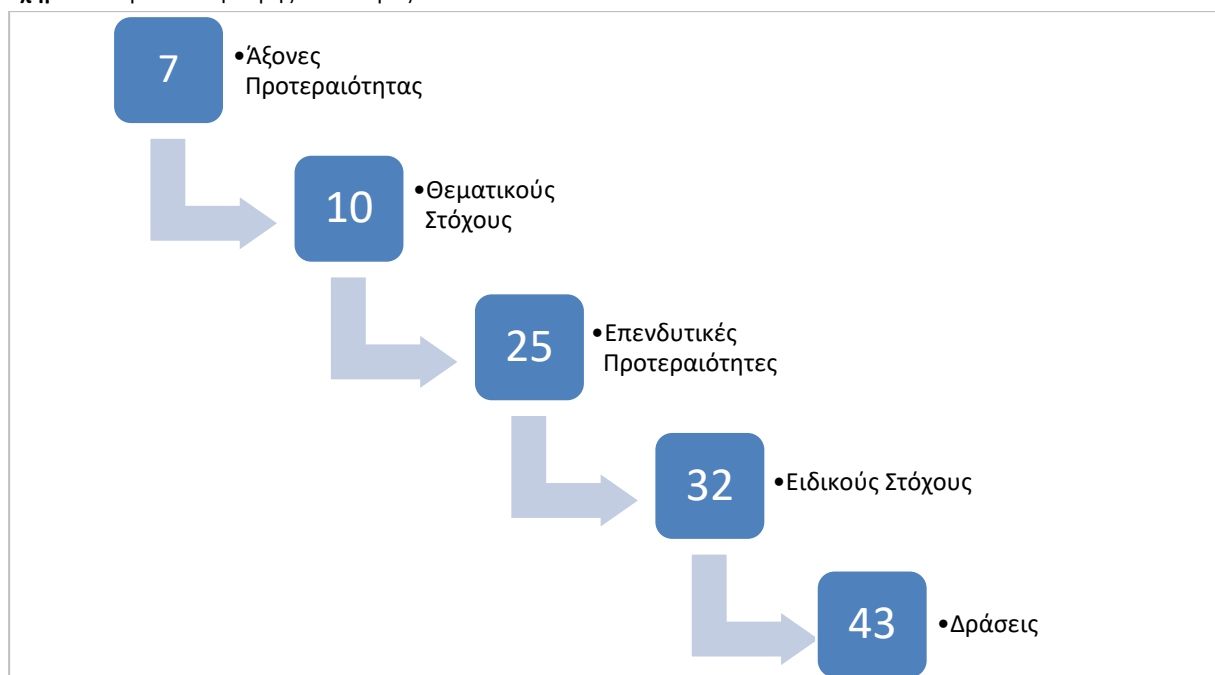

Πίνακας 2. Η Λογική Παρέμβασης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικοί Στόχοι	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας	- Ενίσχυση δράσεων ΕΤΑΚ σε βιολογική γεωργία, υδατοκαλλιέργειες, επεξεργασίας, τυποποίηση, συμπράξεις, προβολή, τουρισμό, πολιτισμό, διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος και ΑΠΕ. - Εστίαση σε 2-3 βασικές περιοχές έρευνας και επέκταση των υπηρεσιών τεχνολογίας για τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων γεωργικών προϊόντων διατροφής. - Ενίσχυση της ιδιωτικής Ε&Α.	1a. Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	Ειδικός Στόχος 1.1.1: Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο.	T1604: Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&ΤΑ	1.1.1.1: Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων.	SO033: Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται
		1b. Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών & συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας & ανάπτυξης & του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών	Ειδικός Στόχος 1.2.1: Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.	T1605: Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων	1.2.1.1: Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.	CO26: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα
2. Βελτίωση της πρόσβασης, της χρήσης και της ποιότητας των τεχνολογιών των πληροφοριών και των επικοινωνιών	- Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη χρήση ΤΠΕ & ευρυζωνικότητας. - e-διακυβέρνηση σε Περιφέρεια και Δήμους. - e-learning στα σχολεία, σε ομάδες πολιτών, ανάπτυξη κατάλληλων υλικών & διάχυση. - Ηλεκτρονική συνεργασία των νοσοκομείων. - Ψηφιακή ανάδειξη πολιτιστικού πλούτου, ηλεκτρονικά μουσεία. - Επενδύσεις σε ΤΠΕ και τεχνογνωσία για προστασία του περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας	2b. Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ	Ειδικός Στόχος 2.2.1: Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα	T1606: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ	2.2.1.2: Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ	CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
		2c. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία	Ειδικός Στόχος 2.3.1: Αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ	07904: Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες	2.3.1.1: Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α	SO007: Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχο	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
3. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων	- Σύνδεση εφαρμοσμένης έρευνας και επιχειρήσεων. - Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των επιχειρήσεων, της παραγωγής / αφομοίωσης καινοτομίας. - Βελτίωση ποιότητας προϊόντων, εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, υδατοκαλλιέργειας. - Ανάπτυξη νέων ειδικών μορφών τουρισμού. - Βελτίωση υποδομών εγκατάστασης και εξυπηρέτησης ΜΜΕ. - Αποτελεσματική χρήση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού.	3α. Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων.	Ειδικός Στόχος 3.1.1: Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας	T1608: Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες	3.1.1.1: Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών	CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται CO08: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται CO28: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά
		3β. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση.	Ειδικός Στόχος 3.2.1 Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας	T1609: Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου	3.2.1.1: Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας στις ΜΜΕ	CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση
		3γ. Στήριξη της δημιουργίας και επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.	Ειδικός Στόχος 3.3.1: Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας	T1610: Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου	3.3.1.1: Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού 3.3.1.2: Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας II 3.3.1.3: Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19	CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις CO03: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση CV23: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19 CV21: Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19 CV22: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχο	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
						CV20: Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχο	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
4.Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς.	- Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις και στον οικιακό τομέα - Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων. - Εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για τηλεθέρμανση με βιομάζα - Εκμετάλλευση βιοαερίου από απόβλητα. - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας	4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημοσίων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.	Ειδικός Στόχος 4.3.1: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας	T1613: Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας	4.3.1.1: Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια 4.3.1.2: Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα	CO31: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης CO32: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημοσίων κτηρίων CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
		4e. Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	Ειδικός Στόχος 4.5.1: Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας	T1614: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	4.5.1.1: Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές 4.5.1.2: Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα	CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων.	- Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και δημιουργία υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων - Προστασία του εδάφους και των ακτών από την διάβρωση - Ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών και τεχνικών αξιοποίησης αποθεμάτων - Προστασία και ορθολογική διαχείριση δασών και γεωργικής γης	5b. Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών.	Ειδικός Στόχος 5.2.1: Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών	T1616: Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της οδηγίας 2007/60/ΕΚ	5.2.1.1: Επενδύσεις σε έργα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	CO20: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 08704: Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή 08705: Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα 08711: Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας 08706: Ενέργειες αναβάθμισης δομών πολιτικής προστασίας

ΑΞΙΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικοί Στόχοι	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
	- Ολοκληρωμένη διαχείριση των παραμέτρων καθορισμού της βιοποικιλότητας - Πράσινες υποδομές για την επανασύνδεση υφιστάμενων φυσικών περιοχών - Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.					
6. Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων.	- Αποτελεσματική & ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. - Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ. - Αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ιλύος ΕΕΛ. - Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων. - Αποτελεσματική διαχείριση /αξιοποίηση ειδικών αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ και ιδιωτικών επενδύσεων. - Εκσυγχρονισμός και παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητας και της ποσότητας του νερού. - Παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, εφαρμογή ειδικών τιμολογιακών πολιτικών, αποκατάσταση υδροφορέων και δημιουργία σύγχρονων φορέων διαχείρισης υδάτων. - Προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και βιοποικιλότητας.	6b. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις. 6c. Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.	Ειδικός Στόχος 6.2.1: Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων	T1661: Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	6.2.1.1: Επενδύσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό) 6.2.1.2: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων	CO18: Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης CO19: Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
		6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.	Ειδικός στόχος 6.3.1: Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία.	T1662: Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ	6.3.1.1: Επενδύσεις για την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.	CO09: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών SO006: Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς
			Ειδικός στόχος 6.4.1: Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.	T1663: Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	6.4.1.1: Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου.	CO23: Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη

Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχοι	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
	- Ολοκλήρωση σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. - Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση τοπίων πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας και έλεγχος των πιέσεων. - Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού. - Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών.	6ε. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου	Ειδικός στόχος 6.5.1: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών	T1620: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 µg/m³ που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης	6.5.1.2: Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης.	CO38: Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχοι	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
7. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.	- Αναβάθμιση του Αεροδρομίου Ιωαννίνων - Δρομολόγηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου με την υπόλοιπη Ελλάδα - Ολοκλήρωση των ΔΕΔ-Μ που διέρχονται ή εξυπηρετούν την Περιφέρεια και διασύνδεση αυτών (Ιόνια οδός, Ε65) - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων, σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος και Συνοριακών σταθμών με τα ΔΕΔ-Μ - Παρεμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας - Ανάπτυξη Θαλάσσιων διαδρόμων και διασυνδέσεων μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου.	7b. Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων.	Ειδικός Στόχος 7.2.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος	T1667: Χρονοαπόσταση	7.2.1.1: Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομές	CO13: Συνολικό μήκος νέων δρόμων CO14: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων
			Ειδικός Στόχος 7.2.2: Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου	T1624: Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου (τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες/ έτος)	7.2.2.1: Επενδύσεις στη βελτίωση των συνηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο	SO022: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας.						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχοι	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.	- Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση - Βελτίωση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού αγροτο-διατροφικού συστήματος. - Σύνδεση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας - Σύνδεση κατάρτισης με τις ανάγκες της τοπικής αγοράς εργασίας - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και δράσεων τηλεκατάρτισης για την απομακρυσμένη εκπαίδευση ενηλίκων - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε σχέση με την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων σε δυσπρόσιτες περιοχές. - Λειτουργία δομών ανοικτού πανεπιστημίου και διαδικασιών αξιολόγησης στα ΑΕΙ της Περιφέρειας.	9a. Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και στις κοινωνικές υποδομές που συμβάλλουν στην εθνική, περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη, μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά στην κατάσταση στον τομέα της υγείας, και προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη βελτίωση της	Ειδικός Στόχος 9.1.1: Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες. Ειδικός Στόχος 9.1.2: Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων.	T1649: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) T1665: Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες υπηρεσίες	9.1.1.1: Υποδομές Υγείας	T1626: Μονάδες υγείας που βελτιώνονται
		9b. Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών	Ειδικός Στόχος 9.2.1: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου	T1666: Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης	9.2.1.1: Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες	SO031: Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται T1664: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών T1628: Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης
10. Επένδυση στην εκπαίδευση, κατάρτιση και επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση.		10a. Επενδύσεις για την ανάπτυξη υποδομών στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση.	Ειδικός Στόχος 10.1.1: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.	T1631: Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	10.1.1.1: Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης. 10.1.1.2: Υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 10.1.1.3: Υποδομές για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.	CO35: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικός Στόχος	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων.	- Χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής για την καταπολέμηση των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. - Υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας. - Ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας. - Δημιουργία τοπικών κοινωνικών συμπράξεων. - Ολοκληρωμένο δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας με διασύνδεση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων παροχής κοινωνικής προστασίας, δημοσίου, ιδιωτικού, εθελοντικού, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. - Ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. - Ανάπτυξη μοντέλων παροχής υπηρεσιών και καινοτόμων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας που αξιοποιούν στο έπακρο τις ΤΠΕ.	8i. Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων	Ειδικός Στόχος 8.1.1: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα	CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	8.1.1.1: Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία.	CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης.		9i. Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας.	Ειδικός Στόχος 9.1.1: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	9.1.1.1: Δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	10501: Ατομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων
		9ii. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά.	Ειδικός Στόχος 9.2.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες.	05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	9.2.1.1: Υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.	05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
			Ειδικός Στόχος 9.2.2: Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους	11105: Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδετοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης,	9.2.2.1: Υποστήριξη ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδετοι ανήλικοι) για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.	T1634: Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδετοι ανήλικοι)

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχοι	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
				συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης		
		9iii. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών.	Ειδικός Στόχος 9.3.1: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση	9.3.1.1: Δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν την φροντίδα παιδιών ΑμεΑ.	10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων
			Ειδικός Στόχος 9.3.2: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)	05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 11509: Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ	9.3.2.1. Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών	05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 11501: Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
		9iv. Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος.	Ειδικός Στόχος 9.4.1: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες	11206: Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 11207: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια 11208: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις	9.4.1.1 Ανάπτυξη δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας.	11202: Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 11203: Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν 11204: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας 11205: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις - CV30: Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19 - CV33: Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων.						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχοι	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
			Ειδικός Στόχος 9.4.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες	05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/ διευρυμένες υπηρεσίες	9.4.2.1: Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες	05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 11201: Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης
		9ν. Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση.	Ειδικός Στόχος 9.5.1: Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	9.5.1.1: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο.	11301: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
		9vi. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.	Ειδικός Στόχος 9.6.1: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού.	- CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους - CR03: Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την λήξη συμμετοχής τους	9.6.1.1: Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης.	- CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων - CO05: Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχο	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
			Ειδικός Στόχος 6.1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ.		- Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση. - Αξιολόγηση και μελέτες. - Πληροφόρηση και επικοινωνία.	T1645: Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται. T1646: Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. T1647: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις. 12105: Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ						
Θεματικός Στόχος	Ανάγκες	Επενδυτική Προτεραιότητα	Ειδικό Στόχο	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Δείκτες εκροών
			Ειδικός Στόχος 7.1: Ενίσχυση των συστημάτων και των διαδικασιών διοίκησης και εφαρμογής του ΠΕΠ.		- Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση, επιθεώρηση. - Αξιολόγηση και μελέτες. - Πληροφόρηση και επικοινωνία.	T1650: Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται. T1651: Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης. T1652: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις. 12105: Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται

1.1.2. Αναθεωρήσεις του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Από την αρχική του έγκριση τον Δεκέμβριο του 2014 [C(2014) 10172 Εκτελεστική Απόφαση της 18.12.2014 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής] το ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου τροποποιήθηκε με τις C(2017) 8406/06.12.2017, C(2018) 8765/11.12.2018, C(2020) 91 final/09.01.2020, C(2020) 4706/07.07.2020 και C(2021) 9151/07.12.2021 όμοιες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Οι αλλαγές και τροποποιήσεις που επέφεραν αυτές οι αναθεωρήσεις ήταν οι ακόλουθες:

Αναθεώρηση 2017

Η 1^η αναθεώρηση του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ έλαβε χώρα το 2017, στο πλαίσιο της τεχνικής αναπροσαρμογής των κονδυλίων της Πολιτικής Συνοχής για κάθε Κράτος Μέλος, προκειμένου να ληφθούν πλήρως υπόψη οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη και τις περιφέρειές της το 2009. Με βάση τα αποτελέσματα του επανυπολογισμού των κονδυλίων της πολιτικής συνοχής εξασφαλίστηκαν πρόσθετοι πόροι για την Ελλάδα ύψους €836,6 εκατ. (ΚΣ) σε τιμές 2011, ήτοι €1.050 εκατ. σε τρέχουσες τιμές. Οι πρόσθετοι αυτοί πόροι έγιναν διαθέσιμοι μέσω της αναθεώρησης των ΕΠ 2014-2020 (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ/ΠΑΝ) και του ΕΣΠΑ που πραγματοποιήθηκε στα τέλη του 2017 βάσει των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και των επιτακτικών αναγκών της χώρας σε επιμέρους τομείς πολιτικής, που καθόρισαν τον τρόπο κατανομής των πρόσθετων πόρων μεταξύ των ΕΠ της Πολιτικής Συνοχής. Τελικά, η συνολική ΔΔ της Πολιτικής Συνοχής για την Ελλάδα αυξήθηκε κατά €1.331 εκατ. ανεβάζοντας τους συνολικούς διαθέσιμους πόρους σε €20.454 εκατ.

Ειδικότερα, για το ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ, η διαδικασία τεχνικής προσαρμογής για το έτος 2017 είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των διαθέσιμων πόρων κατά 8.983.510€ σε όρους ΚΣ (11.229.388 ΔΔ), εκ των οποίων 1.097.518€ ΚΣ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 7.885.992€ ΚΣ από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Οι πρόσθετοι πόροι του ΕΤΠΑ, κατανεμήθηκαν στο ΘΣ 6 του ΑΠ2 και ειδικότερα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε για την ενίσχυση δράσεων Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, ενώ οι πρόσθετοι πόροι ΕΚΤ κατανεμήθηκαν στο ΘΣ 9 του ΑΠ 5 στις ακόλουθες Επενδυτικές Προτεραιότητες:

- 9i: αύξηση των διαθέσιμων πόρων κατά 2.750.500€ (ΚΣ) για την επέκταση της δράσης Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής με
- 9ii: αύξηση των διαθέσιμων πόρων κατά 1.617.760 (ΚΣ) για τη χρηματοδότηση Κέντρων Στήριξης Οικογένειας (ΚΣΟΙ) και Κέντρων Παρακολούθησης του Ολοκληρωμένου Συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας για Ηλικιωμένους (ΟΦΗΛΙ), καθώς και τη χρηματοδότηση δράσεων Υποστήριξης ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά),
- 9iii: αύξηση των διαθέσιμων πόρων κατά 1.768.503 (ΚΣ) για την επέκταση και ενίσχυση της δράσης Παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και Παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ, τη χρηματοδότηση της Αναμόρφωσης του συστήματος των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) και τη χρηματοδότηση της λειτουργίας Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ),
- 9iv: χρηματοδότηση πρόσθετων δράσεων στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας με 1.112.500€ (ΚΣ)
- 9v: ενίσχυση της χρηματοδότησης των δράσεων με 636.730€ (ΚΣ).

Αναθεώρηση 2018

Η 2^η Αναθεώρηση πραγματοποιήθηκε το 2018 και δεν επέφερε αλλαγές στους χρηματοδοτικούς πίνακες του Προγράμματος (δεν μεταφέρθηκαν πόροι μεταξύ των Αξόνων και Θεματικών Στόχων του ΕΠ). Με την 2^η αναθεώρηση του ΕΠ πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες αλλαγές:

- Διαγράφηκε η Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕΠΠρ) 7α «Στήριξη πολυτροπικού Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου Μεταφορών επενδύοντας στο δίκτυο του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)»

- Διαγράφηκε η ΕπΠρ 7e «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της ασφάλειας του εφοδιασμού μέσω της ανάπτυξης έξυπνων συστημάτων διανομής, αποθήκευσης και μεταφοράς ενέργειας και μέσω της ενσωμάτωσης σε αυτά της διανεμόμενης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές»
- Διαγράφηκε η δράση 6.5.1.1. «Εκπόνηση πολεοδομικών / χωροταξικών μελετών»
- Προστέθηκε η δράση 3.3.1.2 «Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας II»
- Τροποποιήθηκαν στοιχεία του πλαισίου επίδοσης και προσαρμόστηκαν επιμέρους δείκτες

Αναθεώρηση 2019

Η 3^η αναθεώρηση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε το 2019 με βάση τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Πλαισίου Επίδοσης του ΠΕΠ Ηπείρου, βάσει των στοιχείων και εκτιμήσεων που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης (ΕΕΥ) του 2018.

Στο πλαίσιο της αναθεώρησης αυτής πραγματοποιήθηκε η ανακατανομή του ποσού των 4.647.549€ (αποθεματικό επίδοσης) από τον Άξονα 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών» στον Άξονα 4 «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας» και συγκεκριμένα στην Επενδυτική Προτεραιότητα (ΕπΠρ) 9a «Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές ...» για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών των υποδομών υγείας.

Στους Πίνακες και το Διάγραμμα που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του Πλαισίου Επίδοσης του ΠΕΠ Ηπείρου ανά Άξονα Προτεραιότητας και Ταμείο (Πίνακας 3) και ανά Ταμείο, Άξονα Προτεραιότητας και Θεματικό Στόχο (Πίνακας 4 & Διάγραμμα 1), καθώς και οι αντίστοιχοι προγραμματικοί πόροι με διάκριση σε κύρια ενίσχυση και αποθεματικό επίδοσης.


Πίνακας 3. Αποτελέσματα αξιολόγησης του Πλαισίου Επίδοσης του ΠΕΠ Ηπείρου ανά ΑΠ και Ταμείο

ΑΠ	Ταμείο	Προγραμματικοί Πόροι (ΚΣ)	Κύρια ενίσχυση (ΚΣ)	Αποθεματικό ενίσχυσης (ΚΣ)	Αξιολόγηση ΠΕ
1	ΕΤΠΑ	35.011.173	32.822.975	2.188.198	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
2	ΕΤΠΑ	105.777.241	99.167.427	6.609.814	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
3	ΕΤΠΑ	59.488.624	55.770.585	3.718.039	ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜ.
4	ΕΤΠΑ	23.152.544	21.705.510	1.447.034	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
5	ΕΚΤ	41.433.696	38.850.333	2.583.363	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΝΟΛΟ		264.863.278	248.316.830	16.546.448	

Πίνακας 4. Αποτελέσματα αξιολόγησης του Πλαισίου Επίδοσης του ΠΕΠ Ηπείρου ανά Ταμείο / ΑΠ / ΘΣ

Ταμείο	ΑΠ	ΘΣ	Αποτέλεσμα ΠΕ	Προγραμματικοί Πόροι (ΚΣ)	Κύρια ενίσχυση (ΚΣ)	Αποθεματικό ενίσχυσης (ΚΣ)
ΕΚΤ	5	8	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	2.550.556,00	2.391.530,55	159.025,45
		9	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	38.883.140,00	36.458.802,45	2.424.337,55
ΕΤΠΑ	1	1	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	8.000.000,00	7.500.000,08	499.999,92
		2	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	7.231.158,00	6.779.210,67	451.947,33
		3	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	19.780.015,00	18.543.764,25	1.236.250,75
	2	4	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	20.197.031,00	18.934.957,82	1.262.073,18
		5	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	14.316.875,00	13.422.241,33	894.633,67
		6	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	71.263.335,00	66.810.227,85	4.453.107,15
	3	7	ΣΟΒΑΡΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ - ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΠΟΘΕΜ.	59.488.624,00	55.770.585,00	3.718.039,00
	4	9	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	10.376.272,00	9.727.755,00	648.517,00
		10	ΕΠΙΤΥΧΙΑ-ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ	12.776.272,00	11.977.755,00	798.517,00
Σύνολο				264.863.278,00	248.316.830,00	16.546.448,00

Διάγραμμα 1. Αποτελέσματα αξιολόγησης του Πλαισίου Επίδοσης του ΠΕΠ Ηπείρου ανά Ταμείο / ΑΠ / ΘΣ

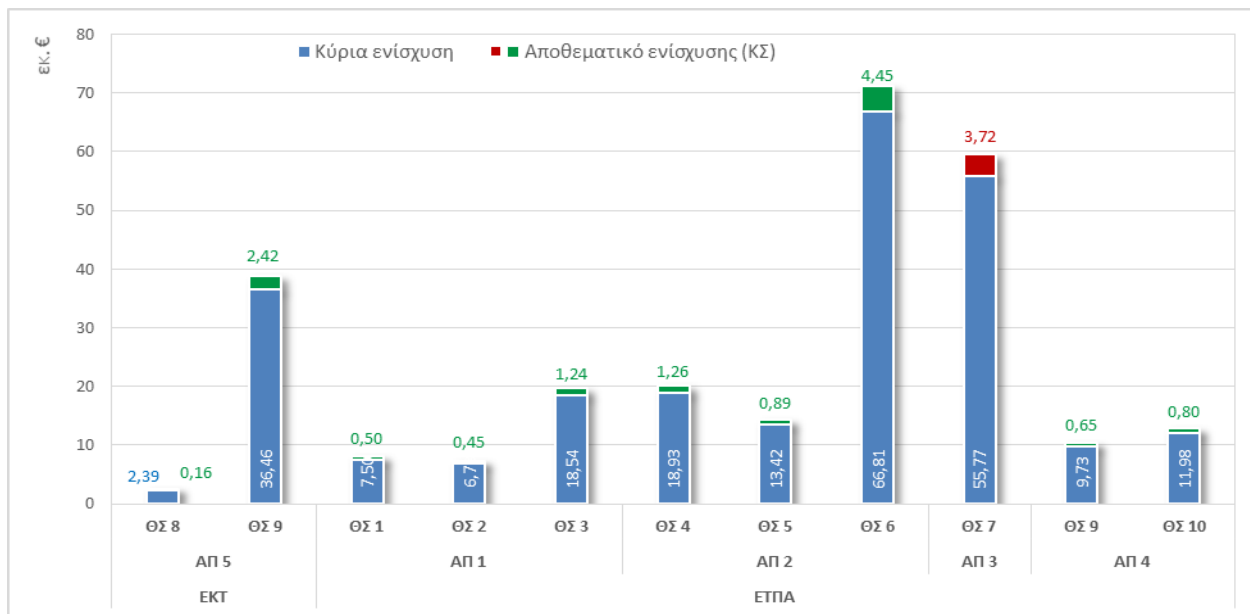

Αναθεώρηση 2020

Η 4^η Αναθεώρηση του Προγράμματος πραγματοποιήθηκε το Ιούνιο του 2020, με κύριο στόχο την προσαρμογή των συγχρηματοδοτούμενων ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 στα νέα δεδομένα που δημιουργήσε η πανδημία. Ειδικότερα για την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας προωθήθηκε στη χώρα ένα μεγάλο πλέγμα δράσεων, υγειονομικής και κοινωνικοοικονομικής στόχευσης και σημασίας, μέρος του οποίου δύναται και θα πρέπει να καλυφθεί από συγχρηματοδοτούμενους πόρους. Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε μεταφορά 33.257.216€ (Ενωσιακής Στήριξης - ΕΤΠΑ), 41.571.519€ Δημόσιας Δαπάνης από το ΕΠ Ήπειρος στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις απαιτήσεις για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας σε επίπεδο ΕΣΠΑ η οποία διέπεται από την λογική πλήρους εκμετάλλευσης της ευελιξίας που επιτρέπει ο κανονισμός για τη μεταφορά πόρων μεταξύ ΕΠ και Ταμείων με όριο τις κατανομές του έτους 2020.

Οι τροποποιήσεις που πραγματοποιήθηκαν αφορούν:

Άξονας 2 «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη»

- Μείωση του προϋπολογισμού του ΑΠ 2 κατά 27 εκ. € (ΔΔ) και ειδικότερα μείωση του π/υ των ΕπΠρ 5b, 6b, 6c, 6d, 6e σύμφωνα με τον κατωτέρω πίνακα:

ΘΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	π/υ ΔΔ (αναθεώρηση 2019)	Αναθεώρηση 2020	Μεταβολή
ΘΣ4	ΕΠ4c Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης.	12.000.000	12.000.000	0
ΘΣ4	ΕΠ4e Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	13.246.289	13.246.289	0
ΘΣ5	ΕΠ5b Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών.	17.896.094	10.896.094	-7.000.000
ΘΣ6	ΕΠ6b Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κекημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν	60.550.000	48.550.000	-12.000.000

ΘΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	π/υ ΔΔ (αναθεώρηση 2019)	Αναθεώρηση 2020	Μεταβολή
	προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις.			
ΘΣ6	ΕΠ6c Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς.	15.000.000	12.500.000	-2.500.000
ΘΣ6	ΕΠ6d Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών.	1.500.000	500.000	-1.000.000
ΘΣ6	ΕΠ6e Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων	12.029.169	7.529.169	-4.500.000
		132.221.552	105.221.552	-27.000.000

- Αναλογική με την μείωση του π/υ των ΕπΠρ, μείωση των τιμών των δεικτών εκροής:
 - ΕπΠρ 5b: CO20 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα». Μείωση κατά 7.000.000€/17.896.094€ = 39,1% από 80.000 σε 48.720 άτομα.
 - ΕπΠρ 5b: 08711 «Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας». Μείωση κατά 7.000.000€/17.896.094€ = 39,1% από 89.000 σε 54.200 στρέμματα.
 - ΕπΠρ 6b: CO19 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων». Μείωση κατά 12.000.000€/54.107.271€ (από τα 60.550.000€ της ΕπΠρ τα 54.107.271 αφορούν την Επεξεργασία υγρών λυμάτων) = 22,2% από 57.125 σε 44.443 άτομα.
 - ΕπΠρ 6c: CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών». Μείωση κατά 2.500.000€/15.000.000€ = 16,7% από 10.000 σε 8.330 άτομα.
 - ΕπΠρ 6d: CO23 «Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης». Μείωση κατά 1.000.000€/1.500.000€ = 66,7% από 92.000 σε 30.636 εκτάρια.
 - ΕπΠρ 6e: CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές». Μείωση κατά 4.500.000€/12.029.169€ = 37,4% από 59.860 σε 37.472 μ².
- Αναλογική με την μείωση του π/υ των ΕπΠρ, μείωση των τιμών των δεικτών του πλαισίου επίδοσης:
 - CO19 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων». Μείωση κατά 12.000.000€/54.107.271€ (από τα 60.550.000€ της ΕπΠρ τα 54.107.271 αφορούν την Επεξεργασία υγρών λυμάτων) = 22,2% από 57.125 σε 44.443 άτομα.
 - CO09 «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών». Μείωση κατά 2.500.000€/15.000.000€ = 16,7% από 10.000 σε 8.330 άτομα.
 - F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών». Μείωση κατά 27.000.000€ από 132.221.552€ σε 105.221.552€

Άξονας 3 «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών»

- Μείωση του προϋπολογισμού της ΕπΠρ 7b σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα και συνολικά του Άξονα κατά 14,57εκ€ (ποσά σε δημόσια δαπάνη). Η προτεινόμενη μείωση βασίζεται στην ωριμότητα των προτάσεων που υποβλήθηκαν.

ΘΣ	ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ	π/υ ΔΔ (αναθεώρηση 2019)	Αναθεώρηση 2020	Μεταβολή
ΘΣ7	ΕΠ7b Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων.	69.713.232	55.141.712	-14.571.520

- Αναλογική με την μείωση του π/υ της ΕπΠρ, μείωση των τιμών των δεικτών εκροής:

- ΕπΠρ 7b: CO13 «Συνολικό μήκος νέων δρόμων». Μείωση κατά 14.571.519€/64.713.231€ (από τα 69.713.231€ της ΕπΠρ τα 64.713.231 αφορούν την Βελτίωση της προσβασιμότητας) = 22,5% από 11,6 σε 9 χλμ.
- ΕπΠρ 7b: CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων». Μείωση κατά 14.571.519€/64.713.231€ (από τα 69.713.231€ της ΕπΠρ τα 64.713.231 αφορούν την Βελτίωση της προσβασιμότητας) = 22,5% από 12,5 σε 9,7 χλμ.
- Αναλογική με την μείωση του π/υ της ΕπΠρ, μείωση των τιμών των δεικτών του πλαισίου επίδοσης:
 - CO14 «Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων». Μείωση κατά 14.571.519€/64.713.231€ (από τα 69.713.231€ της ΕπΠρ τα 64.713.231 αφορούν την Βελτίωση της προσβασιμότητας) = 22,5% από 12,5 σε 9,7 χλμ.
 - F100 «Ποσό πιστοποιημένων δαπανών». Μείωση κατά 14.571.519€ από 69.713.231€ σε 55.141.712€.

Αναθεώρηση 2021

Η 5^η Αναθεώρηση του Προγράμματος εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2021 με την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C(2021) 9151/07.12.2021 και είχε ως κύριο στόχο την τακτοποίηση των υπερδεσμεύσεων του Προγράμματος για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου σημαντικής επιβάρυνσης του μη συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ανάγκη μείωσης του κινδύνου απώλειας πόρων στο κλείσιμο του Προγράμματος).

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκε εσωτερική ανακατανομή των πόρων του Προγράμματος και αντίστοιχες μεταβολές σε επιμέρους δείκτες του.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της 5ης Αναθεώρησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες εσωτερικές ανακατανομές των πόρων του:

- ΑΠ1: Αύξηση της ΚΣ κατά 23.604.816 € από 35.011.173 € σε 58.615.989 €
- ΑΠ2: Μείωση της ΚΣ κατά 2.000.000 € από 84.177.241 € σε 82.177.241 €
- ΑΠ3: Μείωση της ΚΣ κατά 19.200.000 € από 44.113.369 € σε 24.913.369 €
- ΑΠ4: Μείωση της ΚΣ κατά 1.604.816 € από 26.870.583 € σε 25.265.767 €
- ΑΠ5: Αύξηση της ΚΣ κατά 400.000 € από 41.433.696 € σε 41.833.696 €
- ΑΠ6: Μείωση της ΚΣ κατά 400.000 € από 629.019 € σε 229.019 €
- ΑΠ7: Μείωση της ΚΣ κατά 800.000 € από 4.168.726 € σε 3.368.726 €

Ο προϋπολογισμός με βάση την τελευταία αναθεώρηση του ΠΕΠ ανέρχεται σε 236.403.807€ Κοινοτική Συνδρομή (295.504.762,00€ Δημόσια Δαπάνη) και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με 194.341.092 € ΚΣ (242.926.368 € ΔΔ) και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), με 42.062.715€ ΚΣ (52.578.394.€ ΔΔ).

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Άξονες Προτεραιότητας (ΑΠ) του ΕΠ, οι Θεματικοί Στόχοι (ΘΣ) ανά ΑΠ, η πηγή χρηματοδότησης και η συνολική δημόσια δαπάνη αυτών, όπως διαμορφώθηκε κατόπιν των παραπάνω αναθεωρήσεων του ΕΠ:


Πίνακας 5. Διαθέσιμοι πόροι ανά Άξονα Προτεραιότητας του ΕΠ (ποσά σε ΔΔ)

Άξονας Προτεραιότητας	Ταμείο	Θεματικοί Στόχοι	Δημόσια Δαπάνη (€)
ΑΠ 1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ	ΕΤΠΑ	ΘΣ 1, 2, 3	73.269.987
ΑΠ 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη	ΕΤΠΑ	ΘΣ 4, 5, 6	102.721.552
ΑΠ 3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	ΕΤΠΑ	ΘΣ 7	31.141.712
ΑΠ 4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας	ΕΤΠΑ	ΘΣ 9, 10	31.582.209


Άξονας Προτεραιότητας	Ταμείο	Θεματικοί Στόχοι	Δημόσια Δαπάνη (€)
ΑΠ 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων	ΕΚΤ	ΘΣ 8, 9	52.292.120
ΑΠ 6. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	ΕΚΤ		286.274
ΑΠ 7. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ		4.210.908
Σύνολο ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ			295.504.762

Στα διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζονται οι διαχρονικές μεταβολές στους διαθέσιμους πόρους του Προγράμματος ανά Ταμείο, ΑΠ & ΘΣ.


Διάγραμμα 2. Διαχρονικές μεταβολές ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 ανά Ταμείο

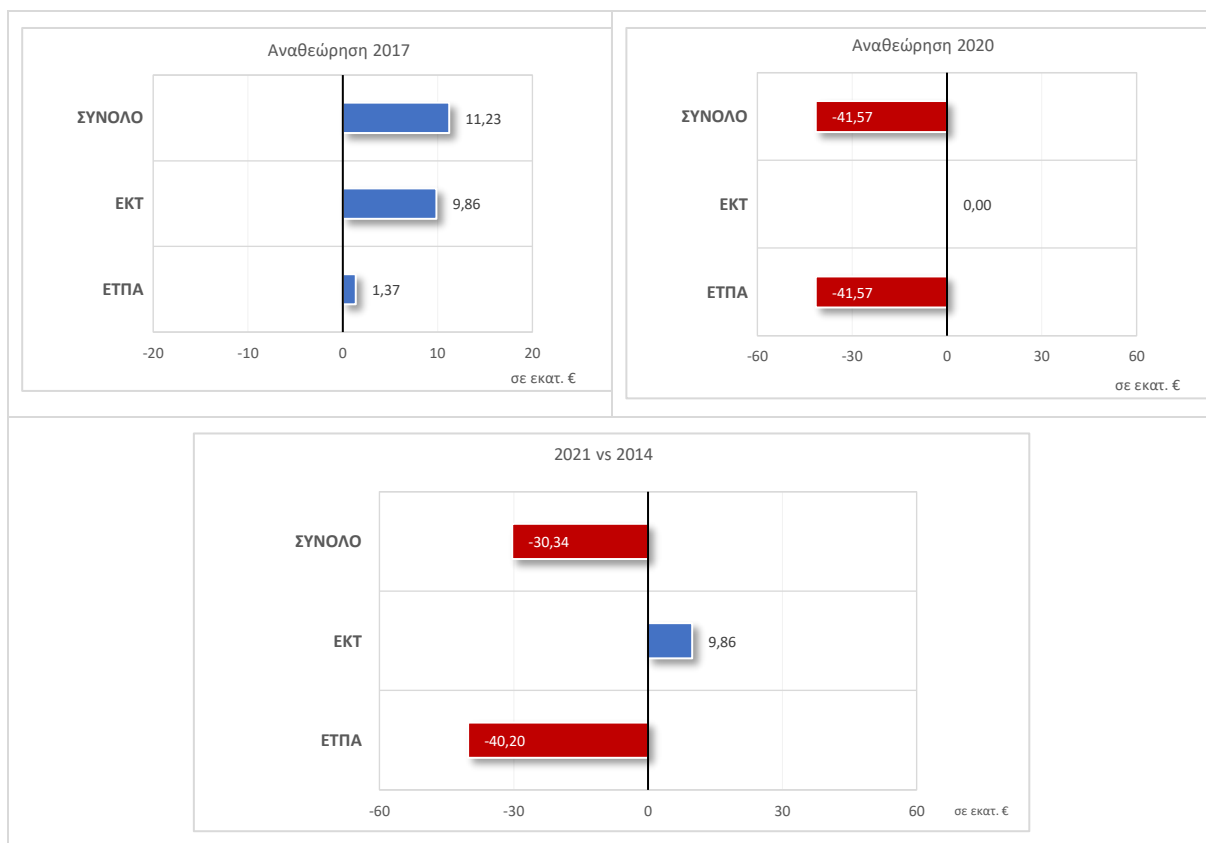

Διάγραμμα 3. Διαχρονικές μεταβολές του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας

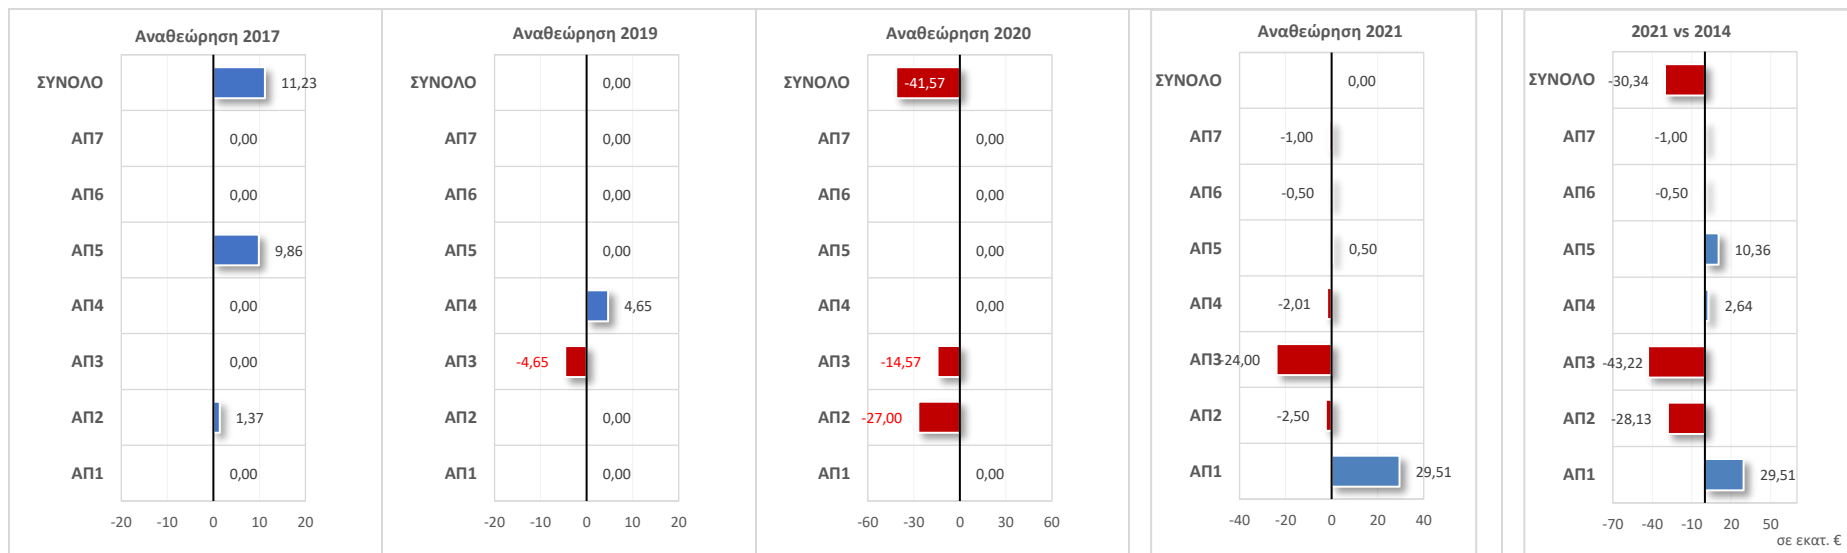

Διάγραμμα 4. Διαχρονικές μεταβολές του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 ανά Θεματικό Στόχο

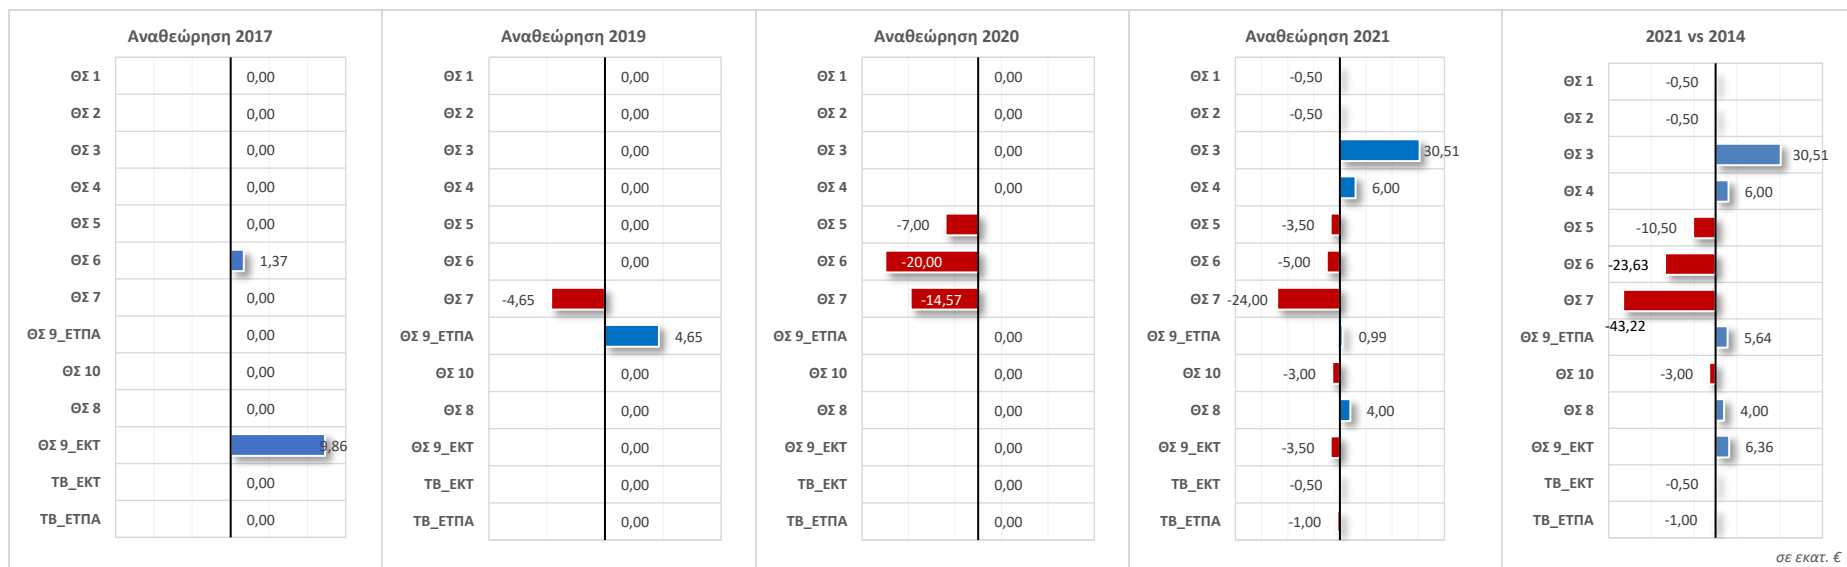

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

2. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

2.1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

2.1.1. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 συνολικά

Με ημερομηνία αναφοράς **07.11.2023** η εικόνα υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος έχει ως ακολούθως (ποσά σε Δημόσια Δαπάνη):


- ▶ ο Προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε **295,50 εκ. €**,
- ▶ έχουν εξειδικευθεί 92 δράσεις συνολικού προϋπολογισμού **424,31 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **143,6% των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος**,
- ▶ έχουν εκδοθεί **108 Προσκλήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **470,12 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **159,1% του προγραμματικού προϋπολογισμού** και στο **110,8% του προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων**,
- ▶ έχουν ενταχθεί **5.386 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης **467,71 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **158,3% του Προϋπολογισμού του Προγράμματος** και στο **99,5% του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων**,
- ▶ οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **411,69 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **139,3% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος** και στο **88% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων**,
- ▶ οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **280,2 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **94,8% του Προγραμματικού Προϋπολογισμού**, το **59,9% του Προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων** και το **68,1% των Νομικών Δεσμεύσεων**.

Πίνακας 6. Πρόοδος Υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ

ΑΠ	Π/Υ	Εξειδίκευση	Προσκλήσεις	Εντάξεις	Συμβάσεις	Δαπάνες
ΑΠ 1	73.269.987,00	70.663.967,00	113.100.000,00	95.233.236,44	93.955.791,22	60.727.743,03
ΑΠ 2	102.721.552,00	156.689.287,12	165.054.037,00	172.951.140,93	140.881.833,34	100.722.295,22
ΑΠ 3	31.141.712,00	93.860.780,00	97.860.780,00	83.197.061,41	68.275.349,20	28.447.472,19
ΑΠ 4	31.582.209,00	40.925.340,00	29.335.340,00	38.420.993,68	37.275.761,36	33.240.480,68
ΑΠ 5	52.292.120,00	56.172.209,99	58.775.382,24	71.346.902,09	66.631.595,09	53.120.369,28
ΑΠ 6	286.274,00	786.274,00	786.274,00	322.962,00	125.379,89	93.976,13
ΑΠ 7	4.210.908,00	5.210.908,00	5.210.908,00	6.237.912,32	4.541.040,82	3.848.200,19
Σύνολο	295.504.762,00	424.308.766,11	470.122.721,24	467.710.208,87	411.686.750,92	280.200.536,72

Πηγή: ΟΠΣ, 07.11.2023

Διάγραμμα 5. Συνοπτική εικόνα υλοποίησης Οικονομικού Αντικειμένου του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ έως 07.11.2023

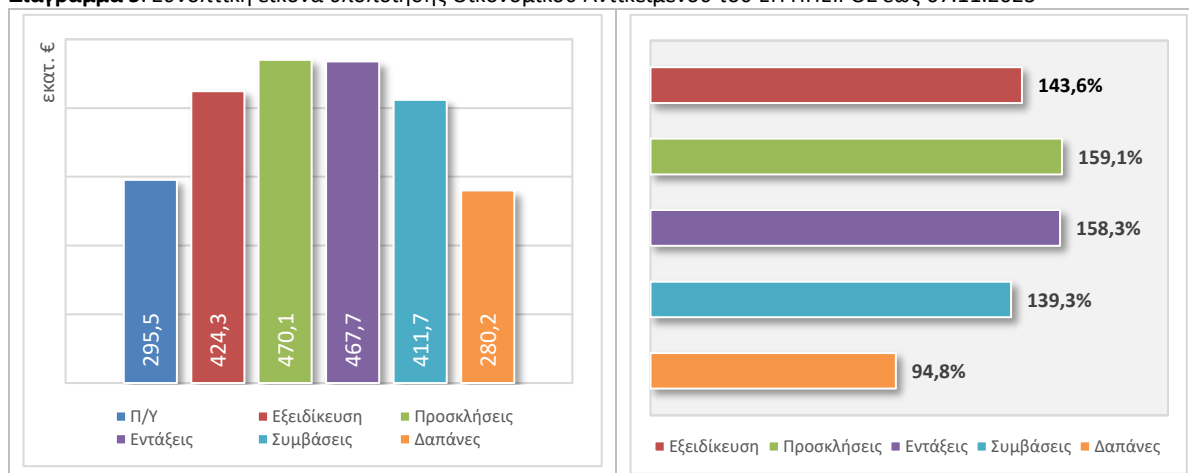

Πηγή: ΟΠΣ, 07.11.2023

Συνολικά, το Πρόγραμμα εμφανίζει **υψηλό βαθμό ενεργοποίησης, εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων** και **ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης** (λαμβάνοντας υπόψη ότι βρισκόμαστε στο τέλος της τρέχουσας ΠΠ 2014-2020).

Με βάση την κατάσταση υλοποίησης των έργων και τις εκτιμήσεις για την ολοκλήρωσή τους εντός της τρέχουσας ΠΠ, αυτά κατατάσσονται στις κατηγορίες που παρατίθενται στον Πίνακα που ακολουθεί. Η κατηγοριοποίηση αυτή ταυτίζεται με την κατηγοριοποίηση που χρησιμοποιείται στο πλαίσιο κατάρτισης των Σχεδίων Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Πίνακας 7. Κατηγορίες κατάταξης Έργων με βάση την κατάσταση υλοποίησής τους

Κωδικός	Κατάσταση	Παρατηρήσεις
0	Ολοκληρωμένα έργα	Ως ολοκληρωμένα θεωρούνται τα έργα με ολοκληρωμένο οικονομικό αντικείμενο, ανεξάρτητα αν έχουν δηλωθεί ως τέτοια στο ΟΠΣ
1	Ενταγμένα έργα - εκτίμηση ολοκλήρωσης εντός ΠΠ	Ενταγμένα έργα που αναμένεται να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα έως το τέλος του 2023
1α	Ενταγμένες μελέτες ωρίμανσης	Ενταγμένες μελέτες ωρίμανσης έργων που θα είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση, είτε στην τρέχουσα, είτε και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027
2	Έργα προς ένταξη – Νέα έργα	Πρόκειται για έργα που προβλέπεται να ενταχθούν και αναμένεται να δώσουν δαπάνες εντός της ΠΠ 2014-2020. Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν είναι πλέον διαθέσιμη προς χρήση στα Σχέδια Δράσης δαπανών των Προγραμμάτων, δεδομένης της αναστολής νέων εντάξεων έργων στα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020.
2α	Νέα έργα προς ένταξη -μελέτες ωρίμανσης έργου	Νέα έργα προς ένταξη τα οποία αφορούν αποκλειστικά μελέτες ωρίμανσης έργων που θα είναι επιλέξιμα για συγχρηματοδότηση, είτε στην τρέχουσα, είτε και στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027. Η συγκεκριμένη κατάσταση δεν είναι πλέον διαθέσιμη προς χρήση στα Σχέδια Δράσης δαπανών των Προγραμμάτων, δεδομένης της αναστολής νέων εντάξεων έργων στα ΕΠ ΕΣΠΑ 2014-2020.
3	Έργα phasing	Ενταγμένα Έργα που δεν ολοκληρώνονται εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και προτείνεται η ολοκλήρωσή τους στην επόμενη προγραμματική περίοδο (έργα phasing). Για τα έργα αυτά ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 118 και 118α του Καν. (ΕΕ) αριθ. 2021/1060.
3Α	Συνεχιζόμενες Δράσεις Δομών ΕΚΤ	Αφορά σε πράξεις ΕΚΤ (πχ Δομές) που υλοποιούνται στο τρέχον ΕΠ με δυνατότητα «πρώρης διακοπής» ώστε μέρος του φυσικού και οικονομικού τους αντικείμενου να συνεχιστεί ως νέα πράξη στο διάδοχο πρόγραμμα της ΠΠ 2021-2027.
4	Έργα ημιτελή	Έργα ημιτελή που δεν ολοκληρώνονται εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου και δεν υπάρχει δυνατότητα ολοκλήρωσής τους στην επόμενη προγραμματική περίοδο είτε λόγω μη επιλεξιμότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα πρόταση της ΕΕ, είτε γιατί δεν μπορούν να γίνουν phasing λόγω προϋπολογισμού. Τα έργα αυτά θα δηλωθούν ως ημιτελή στα έγγραφα κλεισίματος.
4α	Έργα λειτουργικά που ολοκληρώνονται μετά την 31/12/23	Έργα που θα συμμετέχουν στα έγγραφα κλεισίματος ως ολοκληρωμένα και λειτουργικά, αλλά θα έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μετά την 31/12/2023.
5	Έργα προς απένταξη	Έργα ενταγμένα προς απένταξη τα οποία δεν είναι δυνατόν να «μεταφερθούν» στην επόμενη Π.Π.
6	Έργα με δυνατότητα Μεταφοράς στην ΠΠ 21-27	Ενταγμένα έργα που δεν θα συμμετάσχουν στο κλείσιμο των Ε.Π. της Π.Π. 2014-2020 και δύνανται να αποτελέσουν υλικό των προγραμμάτων της Π.Π. 2021-2027. Πρόκειται για έργα που ωριμάζουν στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, δεν έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες πριν την 1/1/2021 και έχουν δυνατότητα «μεταφοράς» στη νέα Π.Π. 2021-2027, ώστε να δημιουργηθεί έτσι και η απαραίτητη ύλη που θα δώσει δαπάνες στην έναρξη υλοποίησής της.

Τα ενταγμένα έργα του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ κατατάσσονται με βάση το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του ΠΕΠ (Νοέμβριος 2023) στις ακόλουθες κατηγορίες:

- **0. Ολοκληρωμένα έργα**
- **1. Ενταγμένα έργα - εκτίμηση ολοκλήρωσης εντός ΠΠ**
- **3. Έργα phasing**
- **3Α. Έργα "phasing" ΕΚΤ**
- **4α. Έργα λειτουργικά που ολοκληρώνονται μετά την 31/12/23**
- **5. Έργα προς απένταξη**
- **6. Έργα με δυνατότητα Μεταφοράς στην ΠΠ 21-27**

Όσον αφορά τα έργα πλην Κρατικών Ενισχύσεων από τα 237 ενταγμένα έργα του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, 99 έργα (41,8% του πλήθους) έχουν ήδη ολοκληρωθεί, 101 έργα (42,6% του πλήθους) βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα έως το τέλος του 2023, ενώ 13 έργα (5,5% του πλήθους) αφορούν σε έργα υποστήριξης της λειτουργίας κοινωνικών δομών των οποίων η χρηματοδότηση θα μεταφερθεί στην ΠΠ 21-27 (κατηγορία 3Α) και 9 έργα π/υ 69,65 εκ. € αποτελούν τμηματοποιημένα έργα (phasing), των οποίων η β' φάση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027. Οι παραπάνω κατηγορίες συγκεντρώνουν το **93,7%** του πλήθους των ενταγμένων έργων πλην ΚΕ, το **84%** του προϋπολογισμού των Εντάξεων, το **90,3%** των συμβάσεων και το **91%** των πραγματοποιηθέντων πληρωμών.

Επίσης, 8 ενταγμένα έργα (**3,4%** του πλήθους των ενταγμένων έργων πλην ΚΕ και **9,7%** του προϋπολογισμού των εντάξεων) έχουν χαρακτηριστεί ως μεταφερόμενα, 3 έργα π/υ 0,68 εκατ. € είναι προς απένταξη (κατηγορία 5) και 4 έργα π/υ 23,1 εκ. € θα συμμετέχουν στα έγγραφα κλεισίματος ως ολοκληρωμένα και λειτουργικά, αλλά θα έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μετά την 31/12/2023 (κατηγορία 4α). Οι ανωτέρω τρεις κατηγορίες συγκεντρώνουν το **6,3%** του πλήθους των ενταγμένων έργων πλην ΚΕ, το **16%** του προϋπολογισμού των Εντάξεων, το **9,7%** των συμβάσεων και το **9%** των δαπανών.

Πίνακας 8. Κατηγοριοποίηση των έργων πλην Κρατικών Ενισχύσεων του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατάσταση Έργου	Αριθμός Έργων	π/υ εντάξεων	π/υ Συμβάσεων	Πληρωμές
0. Ολοκληρωμένα έργα	99	60.011.982	55.966.935	53.366.810
1. Ενταγμένα έργα - εκτίμηση ολοκλήρωσης εντός ΠΠ	101	176.139.249	166.065.960	116.634.944
3. Έργα phasing	9	69.651.942	56.648.373	26.082.157
3Α. Έργα "phasing" ΕΚΤ	13	10.478.249	10.374.358	6.229.822
4α. Έργα λειτουργικά που ολοκληρώνονται μετά την 31/12/23	4	23.093.002	22.647.943	20.021.974
5. Έργα προς απένταξη	3	677.785	0	0
6. Έργα με δυνατότητα Μεταφοράς στην ΠΠ 21-27	8	36.347.296	8.574.613	0
Σύνολο ΕΡΓΩΝ ΠΛΗΝ ΚΕ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ	237	376.399.504	320.278.182	222.335.707

Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 | ΟΠΣ, 07.11.2023

Όσον αφορά τα έργα Κρατικών Ενισχύσεων, από τα 5.149 ενταγμένα έργα του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ στις 07.11.2023 έχουν ολοκληρωθεί 4.982 έργα, προϋπολογισμού 67,12 εκ. €, με επιλέξιμες πληρωμές ύψους 50,4 εκ. €. Επισημαίνεται ότι στο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, τα έργα κρατικών ενισχύσεων αποτυπώνονται συνολικά ανά πρόσκληση και ως εκ τούτου και η κατάσταση των έργων που δηλώνεται αφορά το σύνολο των έργων της κάθε πρόσκλησης. Με βάση την αποτύπωση αυτή, εμφανίζονται ως ολοκληρωμένα μόλις τα 102 έργα.


Πίνακας 9. Κατηγοριοποίηση των έργων Κρατικών Ενισχύσεων του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ

Κατάσταση Έργου	Αριθμός Έργων	π/υ εντάξεων	π/υ Συμβάσεων	Πληρωμές
0. Ολοκληρωμένα έργα	4.982	67.119.497	67.120.150	50.387.030
1. Ενταγμένα έργα - εκτίμηση ολοκλήρωσης εντός ΠΠ	167	24.191.208	24.288.419	7.477.800
Σύνολο ΕΡΓΩΝ ΚΕ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ	5.149	91.310.705	91.408.569	57.864.830

Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 – Επεξεργασία Συμβούλου | ΟΠΣ, 07.11.2023


Συνολικά, από τα **5.386 ενταγμένα έργα του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ στις 07.11.2023**, 5.081 έργα (94,3% του πλήθους) έχουν ήδη ολοκληρωθεί, 268 έργα (5% του πλήθους) βρίσκονται σε εξέλιξη και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα έως το τέλος του 2023, ενώ 13 έργα ανήκουν στην κατηγορία 3Α και 9 έργα π/υ 69,65 εκ. € αποτελούν τμηματοποιημένα έργα (phasing), των οποίων η β' φάση θα χρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027. Οι παραπάνω κατηγορίες συγκεντρώνουν το **99,7%** του πλήθους των ενταγμένων έργων του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ, το **87,1%** του προϋπολογισμού των Εντάξεων, το **92,4%** των συμβάσεων και το **92,9%** των πραγματοποιηθέντων πληρωμών.

Διάγραμμα 6. Κατηγοριοποίηση Ενταγμένων Έργων Πλην ΚΕ

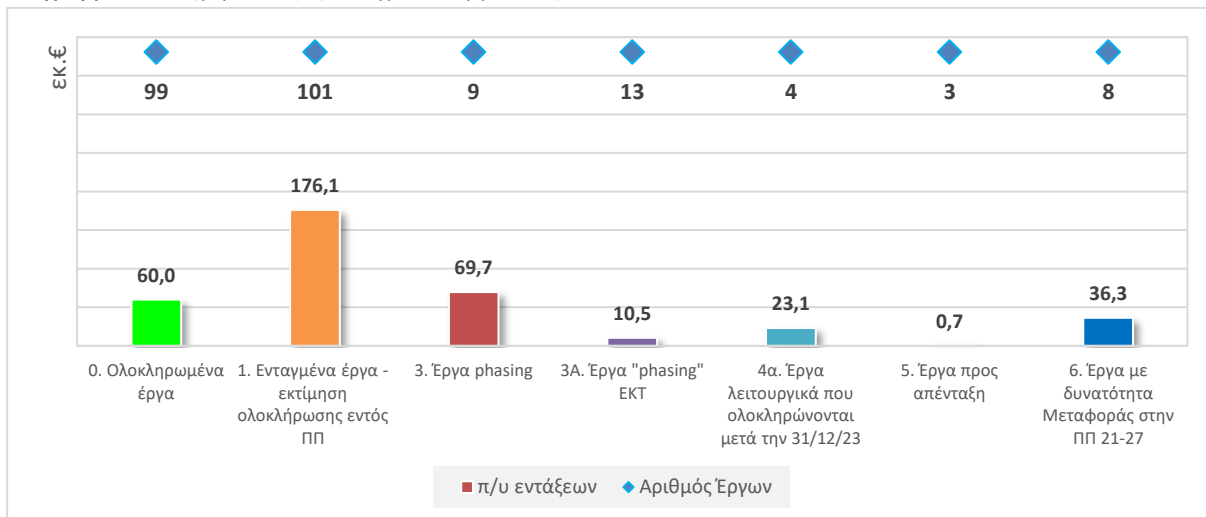


Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 | ΟΠΣ, 07.11.2023

Διάγραμμα 7. Κατηγοριοποίηση Ενταγμένων Έργων Κρατικών Ενισχύσεων

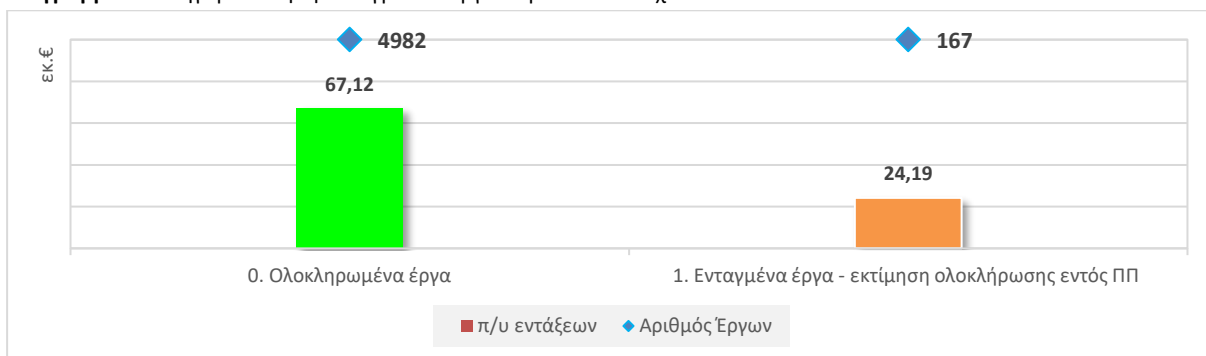


Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 – Επεξεργασία Συμβούλου | ΟΠΣ, 07.11.2023

Διάγραμμα 8. Ανάλυση π/υ εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά κατηγορία έργων (έργα πλην ΚΕ)

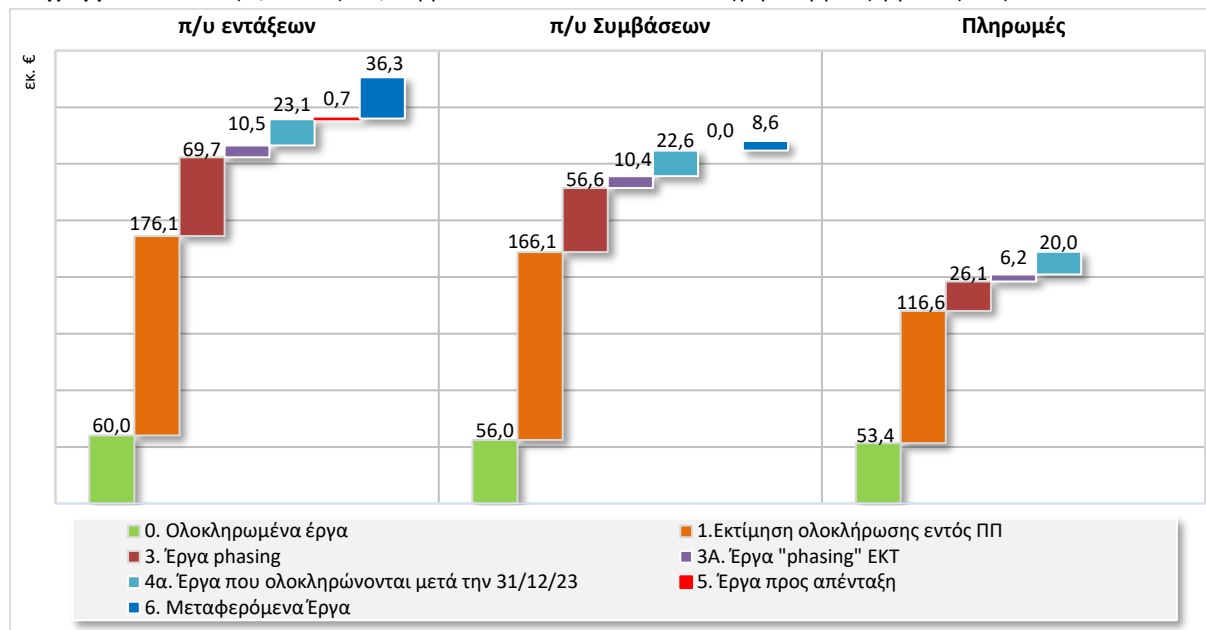


Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 | ΟΠΣ, 07.11.2023

Διάγραμμα 9. Ανάλυση π/υ εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών ανά κατηγορία έργων (Σύνολο έργων)

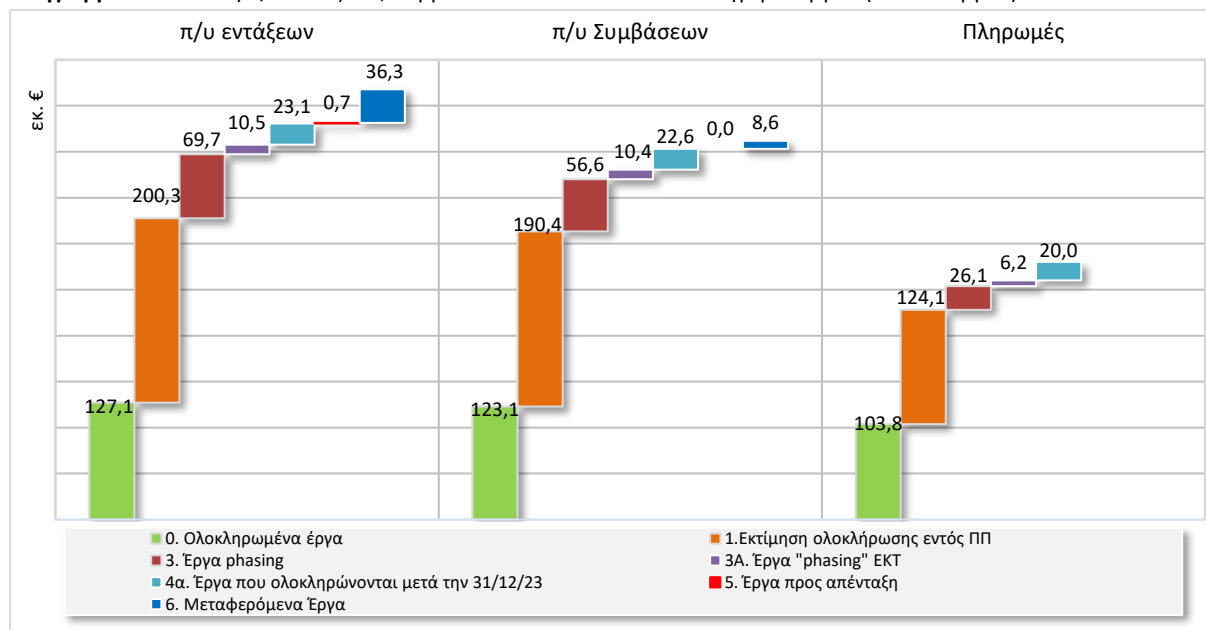


Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 – Επεξεργασία Συμβούλου | ΟΠΣ, 07.11.2023

Η διάρθρωση του προϋπολογισμού εντάξεων, συμβάσεων και δαπανών των ενταγμένων έργων του ΕΠ ανά κατηγορία έργων παρατίθεται και στα ακόλουθα Διαγράμματα:

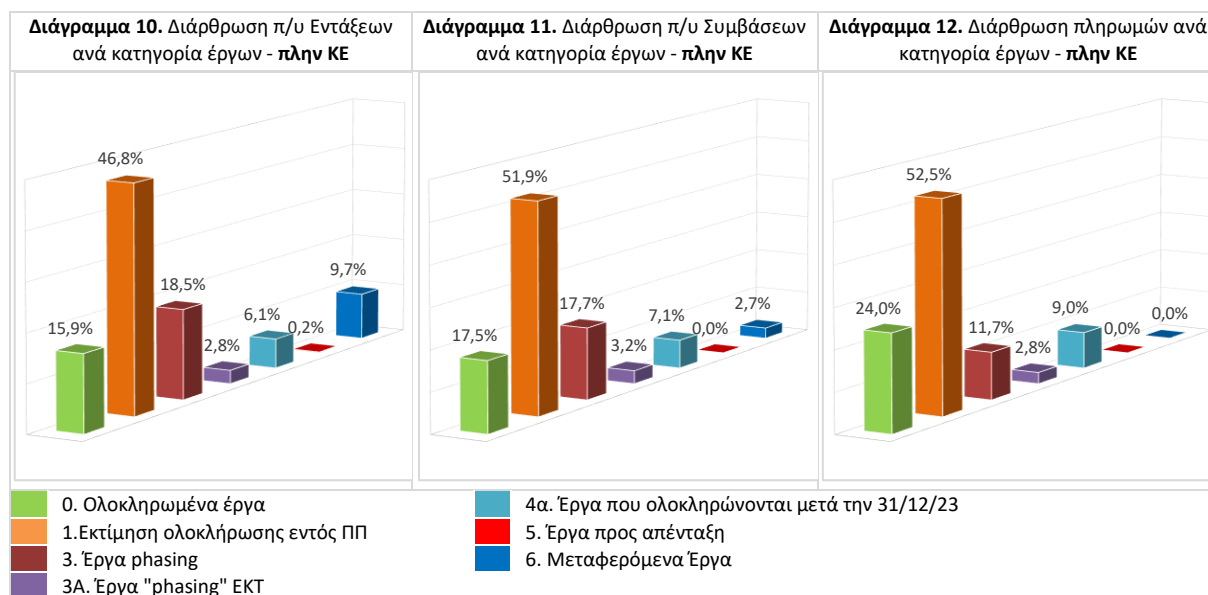

Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 | ΟΠΣ, 07.11.2023

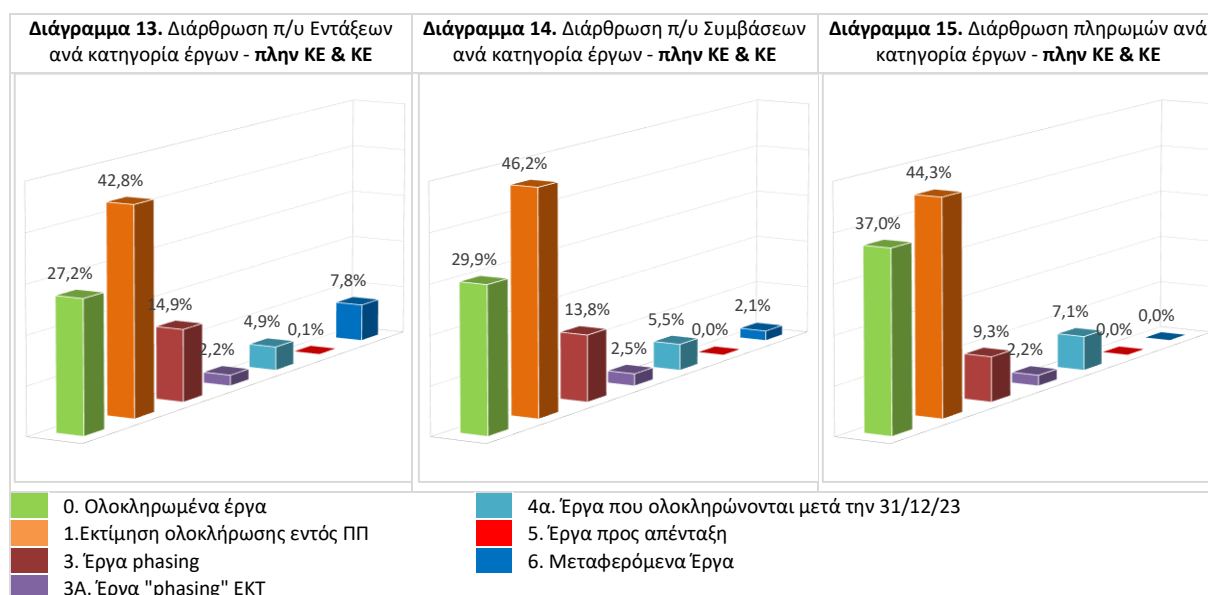

Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 | ΟΠΣ, 07.11.2023

Από τα στοιχεία των ανωτέρω Διαγραμμάτων προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Το 46,8% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων **πλην ΚΕ** αφορά σε έργα που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας ΠΠ, η πλειοψηφία των οποίων υλοποιούνται ομαλά. Τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν συμβάσεις που αντιστοιχούν στο 51,9% του συνόλου των συμβάσεων, ενώ οι πληρωμές τους αποτελούν το 52,5% των συνολικών πληρωμών των ενταγμένων έργων **πλην ΚΕ**.
- Έχουν ολοκληρωθεί 99 έργα **πλην ΚΕ**, π/υ 60 εκ. €, ήτοι το 15,9% του συνολικού π/υ εντάξεων, των οποίων οι συμβάσεις αποτελούν το 17,5% του συνόλου των συμβάσεων και οι πληρωμές τους το 24% των συνολικών πληρωμών των έργων **πλην ΚΕ**.
- 13 ενταγμένα έργα υποστήριξης της λειτουργίας κοινωνικών δομών ΕΚΤ, π/υ 10,5 εκ. € (2,8%), θα χρηματοδοτηθούν μέχρι το τέλος του 2021 από το ΠΕΠ Ηπείρου, ενώ η χρηματοδότησή τους από 01.01.2022 θα μεταφερθεί στην ΠΠ 2021-2027. Τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν συμβάσεις

που αντιστοιχούν στο 3,2% του συνόλου των συμβάσεων, ενώ οι πληρωμές τους αποτελούν το 2,8% των συνολικών πληρωμών των ενταγμένων έργων πλην ΚΕ.

- Το 9,7% του συνολικού προϋπολογισμού των Εντάξεων των έργων **πλην ΚΕ** αφορά συνολικά σε 8 έργα με δυνατότητα μεταφοράς στην επόμενη ΠΠ (με αθροιστικό π/υ εντάξεων 36,34 εκατ.€). Οι συμβάσεις των έργων της συγκεκριμένης κατηγορίας αποτελούν το 2,7% των συνολικών συμβάσεων, ενώ οι δαπάνες τους είναι μηδενικές.
- 9 έργα, π/υ 69,65 εκ. €, ήτοι το 18,5% του συνολικού π/υ εντάξεων των έργων **πλην ΚΕ** θα αποτελέσουν τμηματοποιημένα έργα. Οι συμβάσεις των συγκεκριμένων έργων ανέρχονται σε 56,65 εκ. € και οι δαπάνες τους σε 26,1 εκ. €.
- 4 έργα π/υ 23,1 εκ. € θα συμμετέχουν στα έγγραφα κλεισίματος ως ολοκληρωμένα και λειτουργικά, αλλά θα έχουν οικονομικές εκκρεμότητες μετά την 31/12/2023. Οι συμβάσεις των συγκεκριμένων έργων ανέρχονται σε 22,65 εκ. € και οι δαπάνες τους σε 20 εκ. €.
- Τέλος, 3 έργα π/υ 0,68 εκ. € θα απενταχθούν από το Πρόγραμμα.
- Αναφορικά με τα **έργα Κρατικών Ενισχύσεων**, από τα 5.149 έργα π/υ 91,31 εκ. € έχουν ολοκληρωθεί τα 4.982 έργα π/υ ΔΔ 67,12 εκ. €, ενώ οι συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες τους ανέρχονται σε 50,4 εκ. €.


Εξετάζοντας το σύνολο των ενταγμένων έργων του ΕΠ (πλην ΚΕ & ΚΕ) προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Το 42,8% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων αφορά σε έργα που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας ΠΠ, η πλειοψηφία των οποίων υλοποιούνται ομαλά. Τα έργα της συγκεκριμένης κατηγορίας έχουν συμβάσεις που αντιστοιχούν στο 46,2% του συνόλου των συμβάσεων του ΕΠ, ενώ οι πληρωμές τους αποτελούν το 44,3% των συνολικών πληρωμών των ενταγμένων έργων.
- Έχουν ολοκληρωθεί 5.081 έργα, π/υ 127,13 εκ. €, ήτοι το 27,2% του συνολικού π/υ εντάξεων, των οποίων οι συμβάσεις αποτελούν το 29,9% του συνόλου των συμβάσεων και οι πληρωμές τους το 37% των συνολικών πληρωμών.
- Το 70% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων αφορά σε έργα που έχουν ολοκληρωθεί (κατάσταση 0) και έργα που εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως 31.12.2023 (κατάσταση 1). Τα συγκεκριμένα έργα έχουν συμβάσεις που αντιστοιχούν στο 76,1% του συνόλου των συμβάσεων του ΕΠ, ενώ οι πληρωμές τους αποτελούν το 81,3% των συνολικών πιστοποιημένων πληρωμών του ΕΠ.
- Τα 13 έργα κατηγορίας 3α (συνεχιζόμενες δράσεις Δομών ΕΚΤ) π/υ 10,5 εκ. € έχουν πιστοποιημένες πληρωμές 6,23 εκ. €, ανεβάζοντας το ποσοστό απορρόφησης των διαθέσιμων πόρων του ΕΠ στο **83,5%** μαζί με τα έργα κατηγορίας 0 & 1.
- Το 7,8% του συνολικού προϋπολογισμού των εντάξεων αφορά τα 8 έργα τα οποία θα μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027.

Στο Διάγραμμα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή των ολοκληρωμένων έργων του ΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας από τα στοιχεία του οποίου προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Η πλειοψηφία των ολοκληρωμένων έργων εντάσσεται στον ΑΠ 1 (93%) του ΕΠ, με τον π/υ τους όμως να ανέρχεται στο 53% του συνολικού προϋπολογισμού των ολοκληρωμένων έργων.
- Το 25% του συνολικού προϋπολογισμού των ολοκληρωμένων έργων αφορά τον ΑΠ 5, και ακολουθεί ο ΑΠ 4 με 12%. Την ίδια περίπου κατανομή ακολουθεί και ο π/υ των συμβάσεων.
- Αναφορικά με τις συνολικές πληρωμές των ολοκληρωμένων έργων, ο ΑΠ 1 συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ποσοστό (49%) και ακολουθεί ο ΑΠ 5 (27%) και ο ΑΠ 4 (13%).

Διάγραμμα 16. Ολοκληρωμένα έργα ανά ΑΠ

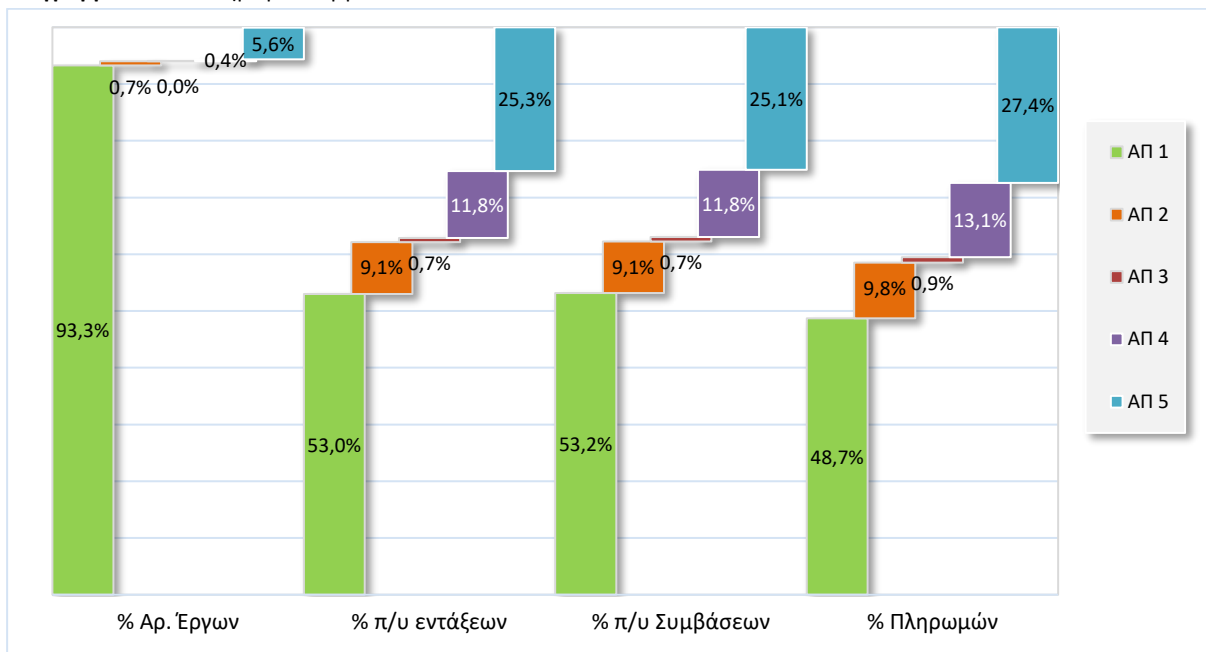


Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 | ΟΠΣ, 07.11.2023

Εξετάζοντας την κατανομή των ολοκληρωμένων έργων ανά ΘΣ προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Ο ΘΣ 3 παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό όσο αφορά τον αριθμό των ολοκληρωμένων έργων με 82% (π/υ 48,36 εκατ. €), ακολουθεί ο ΘΣ 2 με 13% (6,74 εκ. €) και ο ΘΣ 8 με 4% (4,72 εκ. €).
- Ο ΘΣ 2 παρουσιάζει το μεγαλύτερο ποσοστό όσο αφορά τον π/υ των εντάξεων με 45% και ακολουθεί ο ΘΣ 9- ΕΚΤ με 21% (22,67 εκ. €).
- Ο ΘΣ 2 παρουσιάζει επίσης το μεγαλύτερο ποσοστό όσο αφορά τον π/υ των συμβάσεων με 45% (48,36 εκ. €), καθώς και των δαπανών 41% (36,33 εκ. €). Ακολουθεί ο ΘΣ 9- ΕΚΤ με 21% (22,35 εκ. €) αναφορικά με τον π/υ εντάξεων και 24% (20,86 εκ. €) αναφορικά με τις δαπάνες.

Διάγραμμα 17. Ολοκληρωμένα έργα ανά ΘΣ

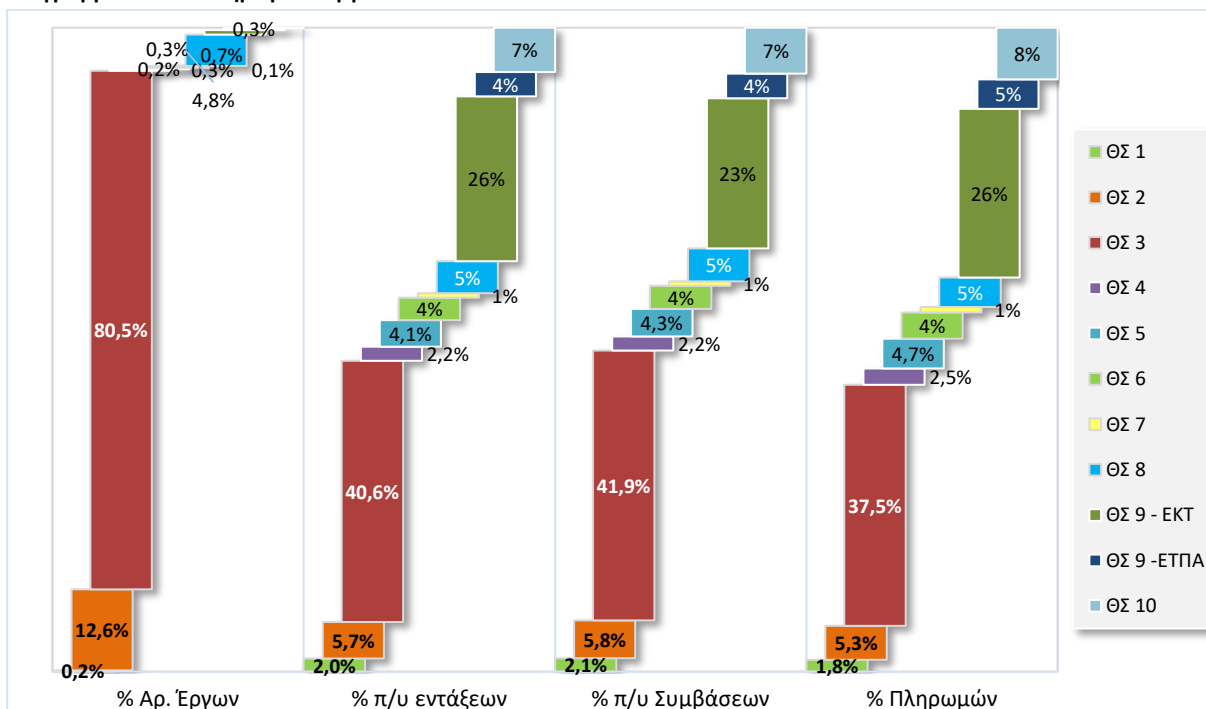

Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 | ΟΠΣ, 07.11.2023

2.1.2. Διαχρονική εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ

Η διαχρονική εξέλιξη στην υλοποίηση του Προγράμματος παρουσιάζεται στα Διαγράμματα που ακολουθούν και τα βασικά συμπεράσματα της σχετικής ανάλυσης συνοψίζονται στη συνέχεια.

Στο **τέλος του 2015** το Πρόγραμμα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:

- ▶ Κατά τα έτη 2014-2015 εξειδικεύθηκαν **43 δράσεις δημόσιας δαπάνης 228,9 εκατ. € που αντιστοιχούν στο 70,3% του προγράμματος.**
- ▶ Ο **βαθμός ενεργοποίησης** του Προγράμματος, με βάση τη συνολική Δημόσια Δαπάνη των Προσκλήσεων που εκδόθηκαν μέχρι 31.12.2015, ανήλθε στο **27,1%** επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος, καθώς ο **συνολικός προϋπολογισμός τους ανήλθε σε 88,3 εκατ. €.** Αυτό το ποσό αντιστοιχεί στο **38,6% του συνολικού προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων** του Προγράμματος.
- ▶ Το **σύνολο του προϋπολογισμού των 11 ενταγμένων έργων** ανήλθε στα **17,7 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **5,4% του προγραμματικού προϋπολογισμού** και στο **20,1% του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων.**
- ▶ Το **σύνολο των Νομικών Δεσμεύσεων** ανήλθε στα **8,79 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **2,7%** του προγραμματικού προϋπολογισμού και στο **49,6% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των εντάξεων.**
- ▶ Οι **πιστοποιημένες δαπάνες** του Προγράμματος ανήλθαν σε **4,18 εκατ. €**, απορροφώντας το **1,3% του προϋπολογισμού** του Προγράμματος, το **23,6% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων** και το **47,5% των νομικών δεσμεύσεων.**

Συμπερασματικά: Ικανοποιητική έναρξη του Προγράμματος με πολύ υψηλό ποσοστό εξειδίκευσης δράσεων (70,3% του προγραμματικού Π/Υ), που δηλώνει την προϋπαρξη ώριμων έργων. Ικανοποιητικό και το ποσοστό ενεργοποίησης (27,1%) του Προγράμματος βάσει προσκλήσεων. Οι εντάξεις έργων ήταν περίπου στο 20% του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων, ενώ το ποσό των νομικών δεσμεύσεων αντιστοιχεί στο 49,6% του επιλέξιμου Π/Υ των ενταγμένων έργων, δίνοντας την εικόνα μη ύπαρξης αρκετών ώριμων έργων κατά την αρχή της Προγραμματικής Περιόδου για το Πρόγραμμα. Οι πιστοποιημένες δαπάνες ανήλθαν μόλις στο 1,3% των νομικών δεσμεύσεων, καταδεικνύοντας έναν πολύ χαμηλό και μη ικανοποιητικό ρυθμό υλοποίησης έργων.

Στο **τέλος του 2016** το Πρόγραμμα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:

- ▶ Κατά την διάρκεια του έτους **δεν εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις.** Ο **βαθμός ενεργοποίησης** του Προγράμματος ανήλθε στο **40%** της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, που αντιστοιχεί σε **130,3 εκατ. €**, δεδομένου ότι κατά το 2016 ο συνολικός προϋπολογισμός των Προσκλήσεων ήταν αυξημένος κατά 41,94 εκατ. €. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων στις 31.12.2016 **αντιστοιχεί στο 53,9% του συνόλου των πόρων των εξειδικευμένων δράσεων** του Προγράμματος.
- ▶ Η συνολική δημόσια δαπάνη των ενταγμένων έργων κατά τη διάρκεια του έτους ανήλθε σε 164,8 εκατ. €, **ανεβάζοντας το συνολικό ποσό των εντάξεων στα 182,5 εκατ. €, ήτοι στο 56% του προϋπολογισμού του Προγράμματος και στο 140% του προϋπολογισμού των δημοσιευμένων προσκλήσεων.**
- ▶ Οι **νομικές δεσμεύσεις του Προγράμματος** κατά τη διάρκεια του έτους έφτασαν τα 30,17 εκατ. €, αυξάνοντας το σύνολό τους από την αρχή υλοποίησης του Προγράμματος στα **38,9 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **12% του προϋπολογισμού** του και το **21,3% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων.**
- ▶ Σημαντική αύξηση παρουσίασαν και οι **πιστοποιημένες δαπάνες** του Προγράμματος, οι οποίες στο **τέλος του 2016 ανήλθαν σε 24,7 εκατ. €**, απορροφώντας το **7,6% του προϋπολογισμού του Προγράμματος**, το **13,5% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων** και το **63,3% των νομικών δεσμεύσεων.**

Συμπερασματικά: Επιταχύνθηκε, αλλά με μικρό ρυθμό, η πορεία υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς δεν εξειδικεύτηκαν νέα έργα, ενώ το ποσοστό ενεργοποίησης του Προγράμματος βάσει Προσκλήσεων ανήλθε στο 40% (από 27,1% το 2015). Παρατηρείται δηλαδή μια χαμηλή συνολική ενεργοποίηση αρκετά χαμηλότερη από το 50%. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ήταν σχεδόν κατά 930% αυξημένος σε σύγκριση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ οι νομικές δεσμεύσεις αυξήθηκαν κατά 343% σε σχέση με το 2015, δηλαδή με χαμηλότερο ρυθμό από την ένταξη έργων. Ως εκ τούτου, το 2016 ο προϋπολογισμός των συμβάσεων αποτέλεσε το 21,3% του επιλέξιμου προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων, όταν την προηγούμενη χρονιά αποτελούσε το 49,6%. Παρατηρείται ως εκ τούτου μία καθυστέρηση στις συμβασιοποιήσεις έργων. Επιπλέον, οι πιστοποιημένες δαπάνες αυξήθηκαν σχεδόν κατά 490% σε σχέση με το 2015, δηλώνοντας την υλοποίηση των ήδη συμβασιοποιημένων έργων (αύξηση σε 63,3% από 47,5% το 2015), υστερώντας όμως σημαντικά σε ποσοστό ως προς τον προϋπολογισμό των εντάξεων (σε 13,5% από 23,6% το 2015).

Στο **τέλος του 2017** το Πρόγραμμα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:

- ▶ Κατά την διάρκεια του έτους **εξειδικεύθηκαν 11 νέες δράσεις δημόσιας δαπάνης 11,2 εκατ. €.**
- ▶ Η **συνολική Δημόσια Δαπάνη των Προσκλήσεων** που είχαν εκδοθεί μέχρι 31.12.2017 **ανήλθε σε 194,4 εκατ. €**, αυξημένη κατά 64,1 εκατ. € κατά τη διάρκεια του 2017, γεγονός που αύξησε τον **βαθμό ενεργοποίησης** του Προγράμματος στο **57,7%** επί της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων στις 31/12/2017 **αντιστοιχεί στο 71,5% του συνολικού προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων** του Προγράμματος.
- ▶ Ο αριθμός των ενταγμένων έργων ανήλθε στο τέλος του έτους σε 111 έργα και ο **προϋπολογισμός** τους στα **177,5 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **52,7%** του προγραμματικού προϋπολογισμού **και στο 91,3% του προϋπολογισμού των δημοσιευμένων προσκλήσεων.**
- ▶ Οι **νομικές δεσμεύσεις** του Προγράμματος ανήλθαν σε **83,3 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **24,7% του προϋπολογισμού του** και το **46,9% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων.**
- ▶ Οι **πιστοποιημένες δαπάνες** που καταχωρήθηκαν στο ΟΠΣ έως **31.12.2017** ανήλθαν σε **42,2 εκατ. €**, απορροφώντας το **12,5% του προϋπολογισμού του Προγράμματος**, το **23,8% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων** και το **50,7% των νομικών δεσμεύσεων.**

Συμπερασματικά: Το 2017 αυξήθηκαν σημαντικά οι συμβάσεις (+113,8%, ήτοι 44,3 εκατ. €) δίνοντας ώθηση στην υλοποίηση του Προγράμματος. Ως αποτέλεσμα, το ποσοστό του προϋπολογισμού των συμβάσεων ως προς εκείνον των εντάξεων αυξήθηκε σε 46,9% από 21,3% το 2016. Τέλος, οι πιστοποιημένες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 71,1%, ήτοι 17,6 εκατ. €, αυξάνοντας το ποσοστό τους ως προς τις εντάξεις σε 23,8% από 13,5% το 2016, αλλά μειώνοντας το ποσοστό τους ως προς τις συμβάσεις σε 50,7% από 63,3% το 2016.

Στο **τέλος του 2018** το Πρόγραμμα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:

- ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους **εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις δημόσιας δαπάνης 10,3 εκατ. €.**
- ▶ Ο **βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος** ανήλθε στο **84,1%** της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, καθώς ο **συνολικός προϋπολογισμός των δημοσιευμένων προσκλήσεων** ανήλθε στο τέλος του έτους σε **283,6 εκατ. €**, παρουσιάζοντας **αύξηση κατά 46% (προϋπολογισμός νέων προσκλήσεων 89,2 εκατ. €) σε σχέση με τις 31/12/2017.** Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων στις 31/12/2018 **αντιστοιχεί στο 100,5% του συνολικού προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων** του Προγράμματος.
- ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους ο **προϋπολογισμός των νέων εντάξεων** ανήλθε σε **34,2 εκατ. €**, ανεβάζοντας το **συνολικό τους ποσό σε 211,8 εκατ. €** που αντιστοιχεί στο **62,8% του διαθέσιμου προϋπολογισμού** και στο **74,7% του προϋπολογισμού των δημοσιευμένων προσκλήσεων.**
- ▶ Οι **νομικές δεσμεύσεις του Προγράμματος** αυξήθηκαν κατά **49,6 εκατ. €** σε σχέση με τις νομικές δεσμεύσεις στο τέλος του προηγούμενου έτους, και ανήλθαν σε **132,9 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί

στο 39,4% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του και το 62,8% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων.

- ▶ Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Προγράμματος αυξήθηκαν κατά 24,9 εκατ. €, φτάνοντας συνολικά τα 67,2 εκατ. €, απορροφώντας το 19,9% του προϋπολογισμού του Προγράμματος, το 31,7% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το 50,5% των νομικών δεσμεύσεων.

Συμπερασματικά: Κατά το 2018 οι συμβάσεις σημειώνουν σημαντική αύξηση (+59,6%) βελτιώνοντας το ποσοστό τους ως προς τον προϋπολογισμό των εντάξεων σε 62,8% από 52,7% το 2017. Αντίστοιχα, οι πιστοποιημένες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 24,9 εκατ. € παρουσιάζοντας σχεδόν τον ίδιο ρυθμό αύξησης με τις συμβάσεις (+59,1%) και μεγαλύτερο από τις εντάξεις.

Στο τέλος του 2019 το Πρόγραμμα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:

- ▶ Κατά την διάρκεια του έτους εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις δημόσιας δαπάνης 73,2 εκατ. €.
- ▶ Ο βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος ανήλθε στο 101,7% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανήλθε στο τέλος του έτους σε 342,9 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 59,3 εκατ. € σε σχέση με τις 31.12.2018. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων στις 31.12.2019 αντιστοιχεί στο 96,5% του συνολικού προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων του Προγράμματος, ποσοστό μικρότερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του προηγούμενου έτους (100,5%), λόγω της σημαντικής αύξησης των εξειδικευμένων δράσεων κατά το 2019.
- ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους ο προϋπολογισμός των νέων εντάξεων ανήλθε σε 72,1 εκατ. €, ανεβάζοντας το συνολικό τους ποσό σε 283,9 εκατ. € που αντιστοιχεί στο 84,2% του διαθέσιμου προϋπολογισμού και στο 82,8% του προϋπολογισμού των δημοσιευμένων προσκλήσεων.
- ▶ Οι νομικές δεσμεύσεις του Προγράμματος αυξήθηκαν κατά 54,8 εκατ. € σε σχέση με τις νομικές δεσμεύσεις στο τέλος του προηγούμενου έτους, και ανήλθαν σε 187,7 εκατ. €, ποσό που αντιστοιχεί στο 55,7% του διαθέσιμου προϋπολογισμού του και το 66,1% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων.
- ▶ Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Προγράμματος αυξήθηκαν κατά 27,9 εκατ. €, φτάνοντας συνολικά τα 95 εκατ. €, απορροφώντας το 28,2% του προϋπολογισμού του Προγράμματος, το 33,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων και το 50,6% των νομικών δεσμεύσεων.

Συμπερασματικά: Κατά το 2019 σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εντάξεις έργων στο ΕΠ (+34%). Μικρότερη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αύξηση σημειώνουν οι συμβάσεις κατά το 2019 (+41,2%). Η αύξηση που παρουσιάζουν οι συμβάσεις έργων είναι μεγαλύτερη αυτής που παρουσιάζουν οι εντάξεις (34%), με αποτέλεσμα ο Δείκτης [Συμβάσεις / Εντάξεις] να αυξάνεται σε 66,1% από 62,8% του προηγούμενου έτους. Τέλος, οι πιστοποιημένες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 27,9 εκατ. € παρουσιάζοντας μικρότερο ρυθμό αύξησης (+41,5%) από το προηγούμενο έτος (+59,1%).

Στο τέλος του 2020 το Πρόγραμμα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:

- ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις δημόσιας δαπάνης 69 εκατ. €.
- ▶ Ο βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος ανήλθε στο 153,5% της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, καθώς ο συνολικός προϋπολογισμός των δημοσιευμένων προσκλήσεων ανήλθε στο τέλος του έτους σε 453,7 εκατ. €, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 110,8 εκατ. € σε σχέση με τις 31.12.2019. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων στις 31.12.2020 αντιστοιχεί στο 106,9% του συνολικού προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων του Προγράμματος, ποσοστό μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του προηγούμενου έτους (96,5%).
- ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους ο προϋπολογισμός των νέων εντάξεων ανήλθε σε 131,8 εκατ. €, ανεβάζοντας το συνολικό τους ποσό σε 415,7 εκατ. € που αντιστοιχεί στο 140,7% του διαθέσιμου

προϋπολογισμού και στο 91,6% του προϋπολογισμού των δημοσιευμένων προσκλήσεων.

- ▶ Οι **νομικές δεσμεύσεις του Προγράμματος** αυξήθηκαν κατά **49,3 εκατ. €** σε σχέση με τις νομικές δεσμεύσεις στο τέλος του προηγούμενου έτους, και ανήλθαν σε **237 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **80,2% του διαθέσιμου προϋπολογισμού** του και το **57% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων**.
- ▶ Οι **πιστοποιημένες δαπάνες** του Προγράμματος αυξήθηκαν κατά **34,7 εκατ. €**, φτάνοντας **συνολικά τα 129,8 εκατ. €**, απορροφώντας το **43,9% του προϋπολογισμού του Προγράμματος**, το **31,2% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων** και το **54,7% των νομικών δεσμεύσεων**.

Συμπερασματικά: Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του π/υ του Προγράμματος κατά 12,3%, γεγονός που επηρεάζει όλους τους δείκτες που αναφέρονται στην παρούσα συγκριτική μελέτη, όσον αφορά στην εξέλιξη του προγράμματος κατά το έτος 2020, σημειώνονται τα εξής:

- Σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι εντάξεις έργων στο ΕΠ (+46,4%) ενώ αύξηση σημειώνουν και οι συμβάσεις κατά το 2020 (+26,3%).
- Η αύξηση που παρουσιάζουν οι συμβάσεις έργων είναι μικρότερη αυτής που παρουσιάζουν οι εντάξεις, με αποτέλεσμα ο Δείκτης [Συμβάσεις / Εντάξεις] να μειώνεται σε 57% από 66,1% του προηγούμενου έτους.
- Τέλος, οι πιστοποιημένες δαπάνες αυξήθηκαν κατά 34,7 εκατ. € παρουσιάζοντας σχεδόν διπλάσιο ρυθμό αύξησης (+15,7%) από το προηγούμενο έτος (+8,3%).

Στο **τέλος του 2021** το Πρόγραμμα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:

- ▶ Κατά τη διάρκεια του 2021 δεν **εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις**.
- ▶ Ο **βαθμός ενεργοποίησης του Προγράμματος** ανήλθε στο **159%** της συνολικής συγχρηματοδοτούμενης Δημόσιας Δαπάνης, καθώς ο **συνολικός προϋπολογισμός των δημοσιευμένων προσκλήσεων** ανήλθε στο τέλος του έτους σε **469,9 εκατ. €**, παρουσιάζοντας **αύξηση κατά 16,2 εκατ. € σε σχέση με τις 31.12.2020**. Το σύνολο της δημόσιας δαπάνης των Προσκλήσεων στις 31.12.2021 **αντιστοιχεί στο 110,8% του συνολικού προϋπολογισμού των εξειδικευμένων δράσεων** του Προγράμματος, ποσοστό ελαφρά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο ποσοστό στο τέλος του προηγούμενου έτους (106,9%), λόγω της μικρής αύξησης των εξειδικευμένων δράσεων κατά το 2021.
- ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους ο **προϋπολογισμός των νέων εντάξεων** ανήλθε σε **102,5 εκατ. €**, ανεβάζοντας το **συνολικό τους ποσό σε 518,1 εκατ. €** που αντιστοιχεί στο **175,3% του διαθέσιμου προϋπολογισμού** και στο **110,3% του προϋπολογισμού των δημοσιευμένων προσκλήσεων**.
- ▶ Οι **νομικές δεσμεύσεις του Προγράμματος** αυξήθηκαν κατά **60% ή 142,3 εκατ. €** σε σχέση με τις νομικές δεσμεύσεις στο τέλος του προηγούμενου έτους, και ανήλθαν σε **379,4 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **128,4% του διαθέσιμου προϋπολογισμού** του και το **73,2% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων**.
- ▶ Οι **πιστοποιημένες δαπάνες** του Προγράμματος αυξήθηκαν κατά **79,1 εκατ. €**, φτάνοντας **συνολικά τα 208,8 εκατ. €**, απορροφώντας το **70,7% του προϋπολογισμού του Προγράμματος**, το **40,3% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων** και το **55% των νομικών δεσμεύσεων**.

Συμπερασματικά: Κατά το 2021 σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι συμβασιοποιήσεις των έργων του Προγράμματος (+60%). Μικρότερη, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, αύξηση σημειώνει η ενεργοποίηση του προγράμματος (μόλις 3,6%). Τέλος, οι πιστοποιημένες δαπάνες αυξήθηκαν σημαντικά (κατά 79,1 εκατ. €) φθάνοντας το 70,7% του προγράμματος.

Στο **τέλος του 2022** το Πρόγραμμα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:

- ▶ Κατά τη διάρκεια του έτους **δεν εξειδικεύθηκαν δράσεις, δεν ενεργοποιήθηκαν νέες προσκλήσεις ενώ οι εντάξεις μειώθηκαν κατά 7,5 εκ. €** λόγω απεντάξεων έργων. Κατά το έτος 2022 εντάχθηκαν 4 νέα έργα συνολικού π/υ 823,3 χιλ. €.
- ▶ Οι **νομικές δεσμεύσεις του Προγράμματος** αυξήθηκαν κατά **42,5 εκατ. €** σε σχέση με τις νομικές δεσμεύσεις στο τέλος του προηγούμενου έτους, και ανήλθαν σε **421,9 εκατ. €**, ποσό που αντιστοιχεί στο **142,8% του διαθέσιμου προϋπολογισμού** του και το **82,6% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων**.
- ▶ Οι **πιστοποιημένες δαπάνες** του Προγράμματος αυξήθηκαν κατά **42,3 εκατ. €**, φτάνοντας **συνολικά τα 251,2 εκατ. €**, απορροφώντας το **85% του προϋπολογισμού του Προγράμματος**, το **49,2% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων** και το **59,5% των νομικών δεσμεύσεων**.


Συμπερασματικά: Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η συγκεκριμένη χρονική περίοδος είναι η προτελευταία χρονιά της Προγραμματικής Περιόδου, είναι λογικό να παρουσιάζεται ύφεση στις εξειδικεύσεις νέων δράσεων και τις ενεργοποιήσεις προσκλήσεων, με το βάρος της διαχείρισης να πέφτει στις υλοποιήσεις των έργων και την αποπληρωμή τους. Έτσι, φαίνεται απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη η αύξηση των συμβασιοποιήσεων και της απορρόφησης καλύπτοντας ποσοστά 142,8% και 85% του Προγράμματος, που θεωρούνται και στις δύο περιπτώσεις ικανοποιητικά.

Την **7^η/11/2023** το Πρόγραμμα εμφάνιζε την ακόλουθη εικόνα:


- ▶ Κατά τη διάρκεια της δεκάμηνης αυτής περιόδου, **δεν εξειδικεύθηκαν νέες δράσεις** ενώ ενεργοποιήθηκε μια πρόσκληση π/υ 200.000€. 85 έργα απεντάχθηκαν με αποτέλεσμα το ποσοστό εντάξεων να παρουσιάζει μικρή μείωση (-3,5%).
- ▶ Οι **πιστοποιημένες δαπάνες** του Προγράμματος αυξήθηκαν κατά σχεδόν **29 εκατ. €**, φτάνοντας **συνολικά τα 280,2 εκατ. €**, απορροφώντας το **94,8% του προϋπολογισμού του Προγράμματος**, το **59,9% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων** και το **68,1% των νομικών δεσμεύσεων**.

Συμπερασματικά: Στην περίοδο αυτή του τελευταίου έτους της ΠΠ 2014-2020, το Πρόγραμμα παρουσιάζει πολύ ικανοποιητικά ποσοστά όλων των δεικτών (ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποιήσεων) ενώ ικανοποιητικό ποσοστό είναι και αυτό της **απορρόφησης**, με το **94,8% των πόρων** του προγράμματος να έχει απορροφηθεί.

Διάγραμμα 18. Διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ

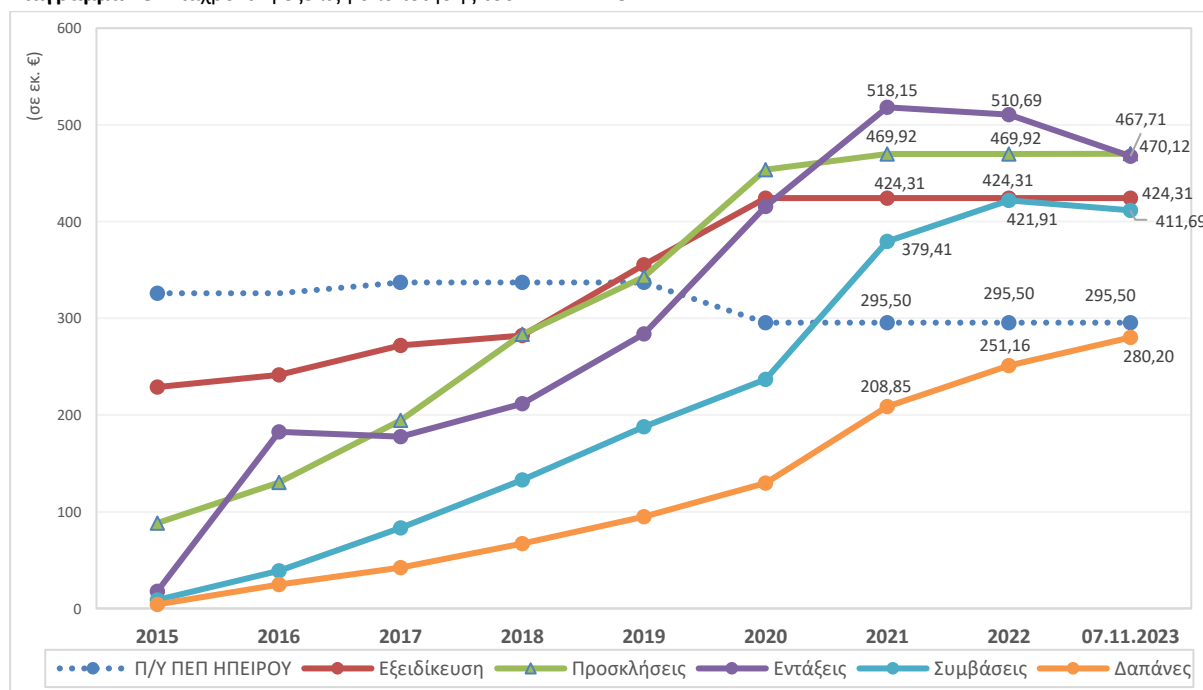

Διάγραμμα 19. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ ως % του π/υ του

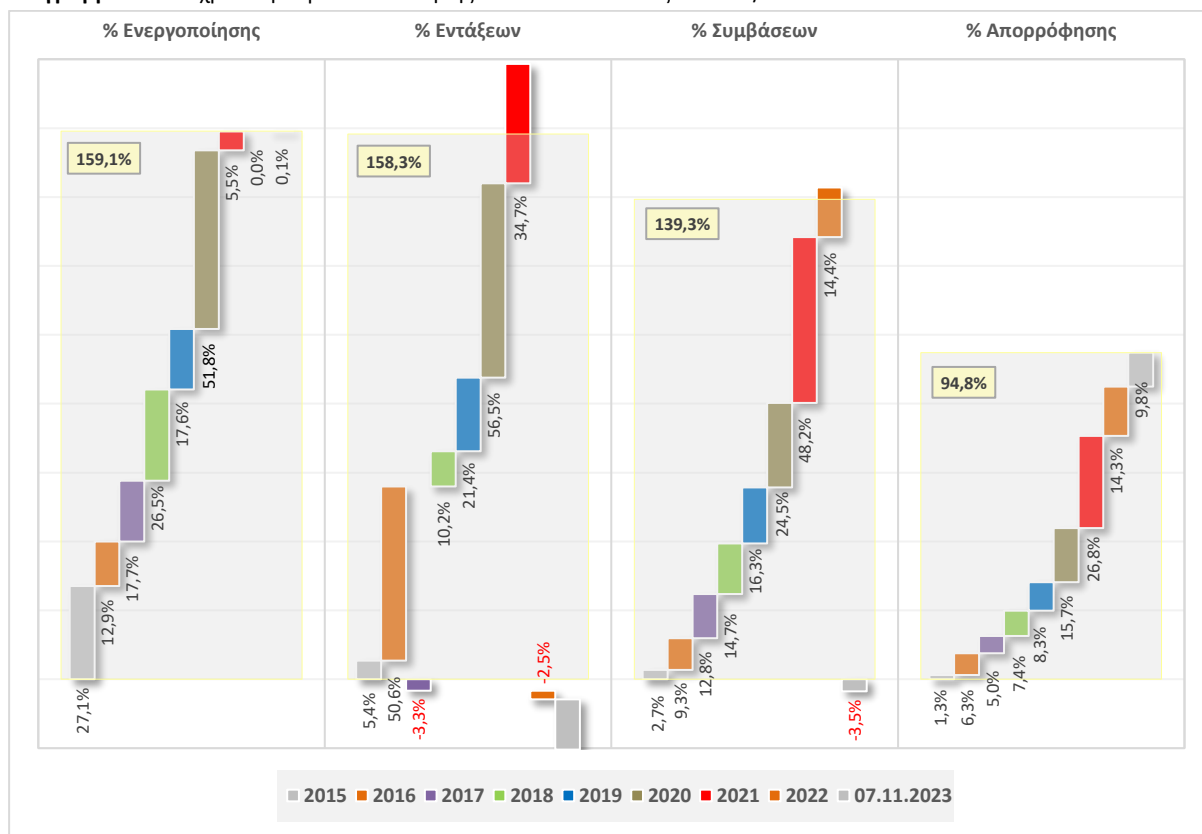

2.1.3. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας

Άξονας Προτεραιότητας 1


Ο **Άξονας Προτεραιότητας 1**, «Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ», μετά την αναθεώρηση του 2021 έχει πλέον **προϋπολογισμό 73,27 εκ. €** από 43,76 εκ. € και αντιπροσωπεύει σχεδόν το **24,8%** του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ.

Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΑΠ 1 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί **14 Προσκήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **113,10 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **154,4%** του προϋπολογισμού του ΑΠ,
- έχουν **ενταχθεί 4.896 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης **95,2 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **130%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **84,2%** του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **93,96 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **128,2%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **98,7%** του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **60,73 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **82,9%** του προϋπολογισμού του ΑΠ, το **63,8%** του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το **64,6%** των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΑΠ 1 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 20. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΑΠ 1 (ως % του π/υ του)

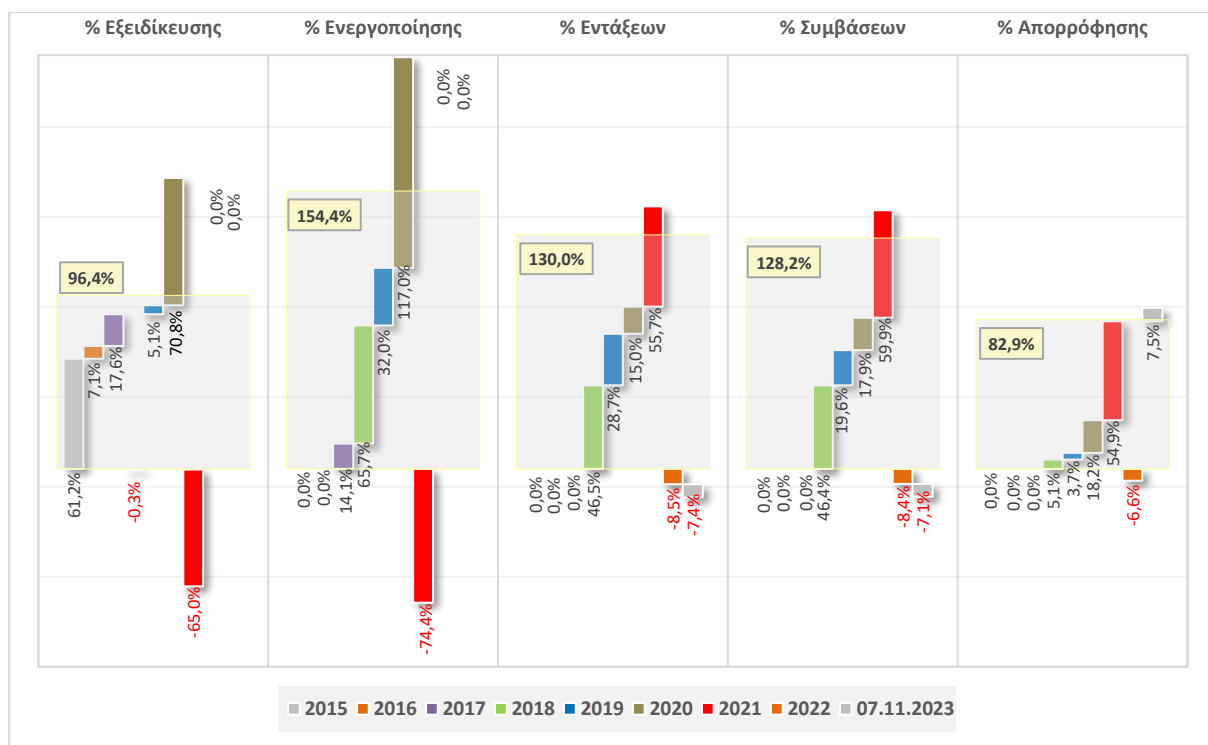

Ο ΑΠ 1 εμφανίζει υψηλούς βαθμούς ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποιήσεων (154,4%, 130% και 128,2% αντίστοιχα) που ουσιαστικά αποτυπώνουν την ενεργοποίηση της δράσης του COVID-19 του 2021, τα έργα της οποίας έχουν πλέον απορροφήσει δαπάνες, ανεβάζοντας και τον βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων σε ικανοποιητικά επίπεδα (82,9%). Τα αρνητικά ποσοστά των δεικτών εξειδίκευσης και ενεργοποίησης του 2021 οφείλονται στη διόρθωση των δεικτών μετά τη μεγάλη αύξηση των πόρων του ΑΠ1 με την αναθεώρηση του 2021, αφού η εξειδίκευση των δράσεων και η ενεργοποίηση των σχετικών προσκλήσεων είχαν ήδη γίνει από το 2020.

Άξονας Προτεραιότητας 2


Ο **Άξονας Προτεραιότητας 2**, «Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη», έχει προϋπολογισμό **102,72 εκ. €** και αντιπροσωπεύει σχεδόν το **34,8%** του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ.

Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΑΠ 2 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί **30 Προσκήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **165 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **160,7%** του προϋπολογισμού του ΑΠ,
- έχουν **ενταχθεί 89 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης **172,95 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **168,4%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **104,8%** του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **140,88 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **137,1%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **81,5%** του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **100,72 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **98,1%** του προϋπολογισμού του ΑΠ, το **58,2%** του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το **71,5%** των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΑΠ 2 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 21. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΑΠ 2 (ως % του π/υ του)

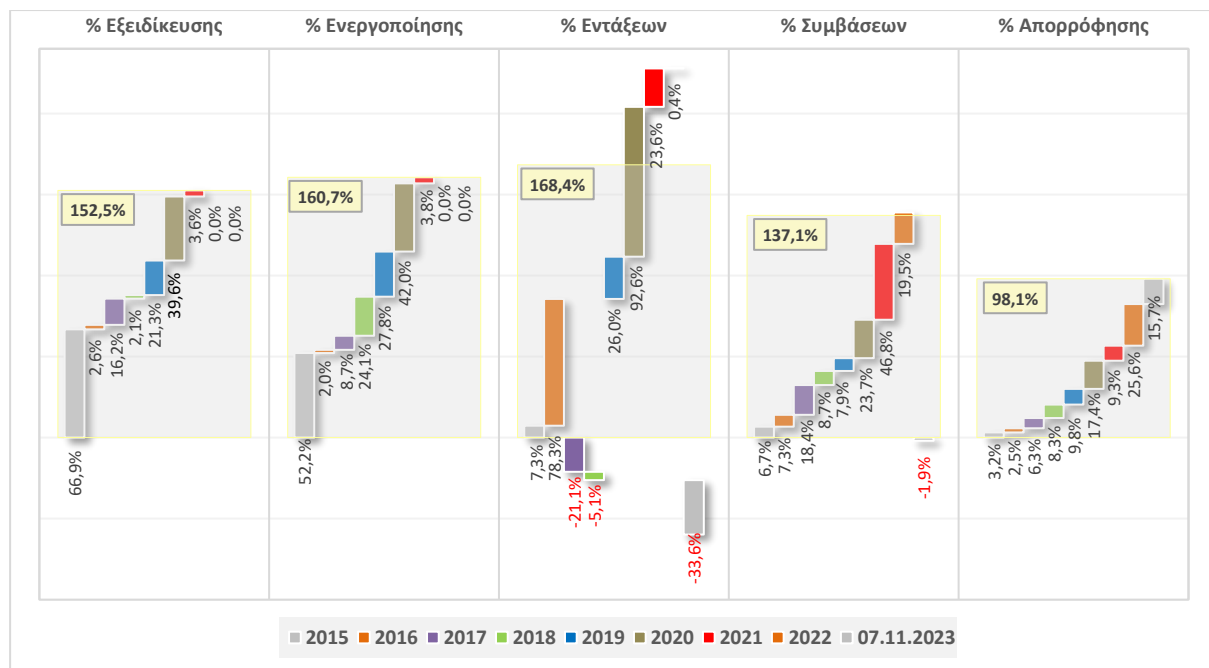

Ο ΑΠ 2 εμφανίζει πολύ υψηλούς βαθμούς ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποίησης (160,7%, 168,4% & 137,1% αντίστοιχα) και υψηλό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (98,1%). Σημαντική επιτάχυνση παρατηρήθηκε στη συμβασιοποίηση των έργων κατά το έτος 2021 (+46,8%) που έδωσαν ώθηση και στην πραγματοποίηση δαπανών κατά το 2022 (+25,6%).

Άξονας Προτεραιότητας 3


Ο **Άξονας Προτεραιότητας 3**, «Ενίσχυση υποδομών μεταφορών», έχει προϋπολογισμό **31,1 εκ. €** και αντιπροσωπεύει το **10,5%** του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ, μετά τη μείωσή του κατά την αναθεώρηση του 2021.

Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΑΠ 3 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί **7 Προσκήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **97,86 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **314,2%** του προϋπολογισμού του ΑΠ,
- έχουν ενταχθεί **5 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης **83,2 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **267,2%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **85%** του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **68,3 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **219,2%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **82,1%** του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **28,45 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **91,3%** του προϋπολογισμού του ΑΠ, το **34,2%** του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το **41,7%** των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΑΠ 3 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 22. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΑΠ 3 (ως % του π/υ του)

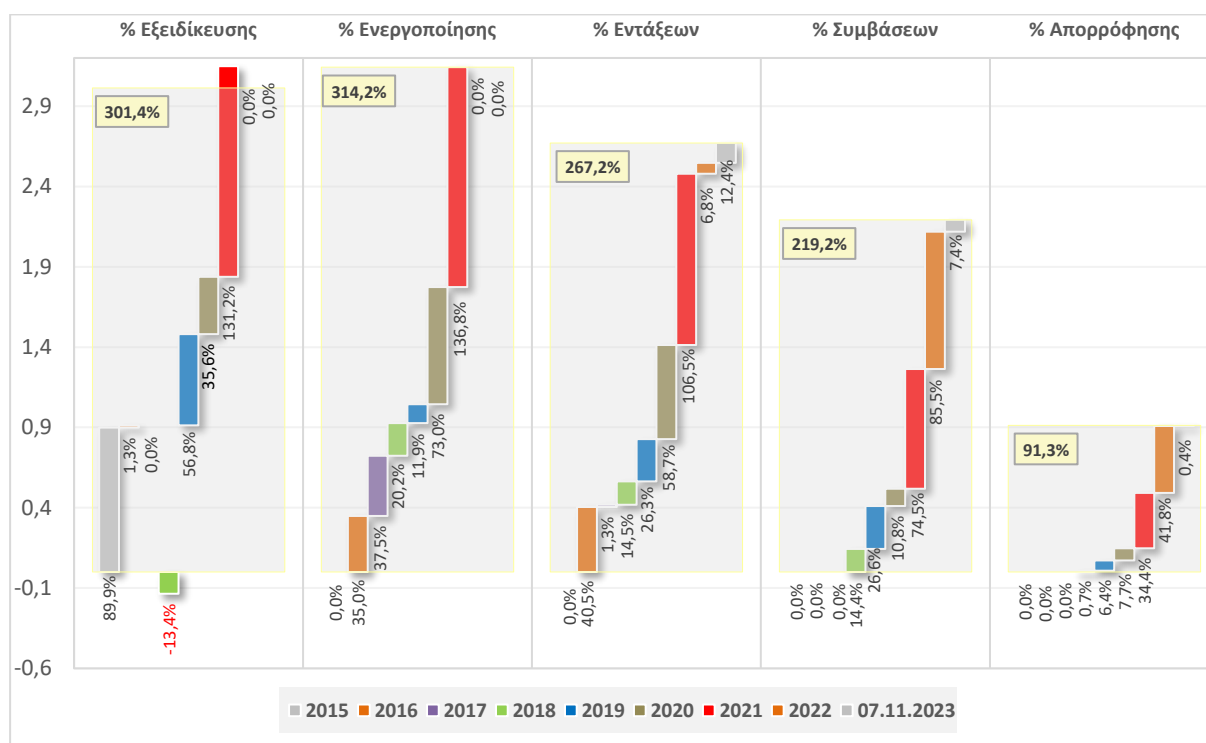

Ο ΑΠ 3 εμφανίζει υψηλότερους βαθμούς ενεργοποίησης (314,2%), εντάξεων (267,2%) και συμβάσεων (219,2%), και πολύ ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (91,3%), με την πλειοψηφία των δαπανών να πραγματοποιούνται κατά τα προηγούμενα δύο έτη (2021 & 2022).

Άξονας Προτεραιότητας 4


Ο **Άξονας Προτεραιότητας 4**, «Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας», έχει προϋπολογισμό **31,58 εκ. €** και αντιπροσωπεύει το **10,7%** του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ.

Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΑΠ 4 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί **11 Προσκήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **29,34 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **92,9%** του προϋπολογισμού του ΑΠ,
- έχουν ενταχθεί **25 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης **38,42 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **121,7%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **131%** του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **37,28 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **118%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **97%** του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **33,24 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το σύνολο των διαθέσιμων πόρων (**105,3%** του προϋπολογισμού του ΑΠ), το **86,5%** του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το **89,2%** των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΑΠ 4 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 23. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΑΠ 4 (ως % του π/υ του)

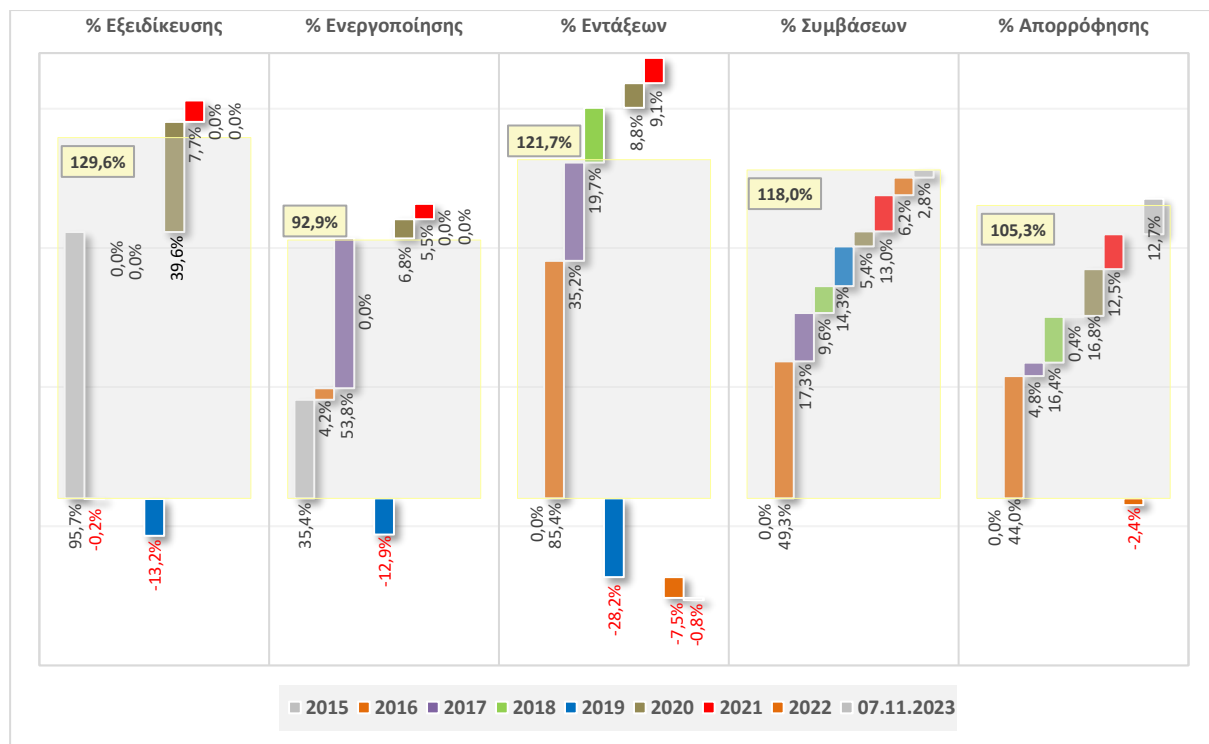

Ο ΑΠ 4 εμφανίζει υπερδέσμευση στις εντάξεις (121,7%), στις συμβασιοποιήσεις (118%) και στις δαπάνες (105,3%).

Η πλειοψηφία των εντάξεων στο ΑΠ 4 πραγματοποιήθηκε τη διετία 2016 – 2017, ενώ αρκετά από τα ενταγμένα έργα του Άξονα αποτελούν έργα μεταφερόμενα από την προηγούμενη ΠΠ 2007 -2013.

Άξονας Προτεραιότητας 5


Ο **Άξονας Προτεραιότητας 5**, «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων», έχει προϋπολογισμό **52,29 εκ. €** και αντιπροσωπεύει το **17,7%** του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ.

Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΑΠ 5 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί **44 Προσκήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **58,77 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **112,4%** του προϋπολογισμού του ΑΠ,
- έχουν ενταχθεί **354 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης **71,35 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **136,4%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **121,4%** του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **66,63 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **127,4%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **93,4%** του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **53,12 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **101,6%** του προϋπολογισμού του ΑΠ, το **74,5%** του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το **79,7%** των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΑΠ 5 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 24. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΑΠ 5 (ως % του π/υ του)

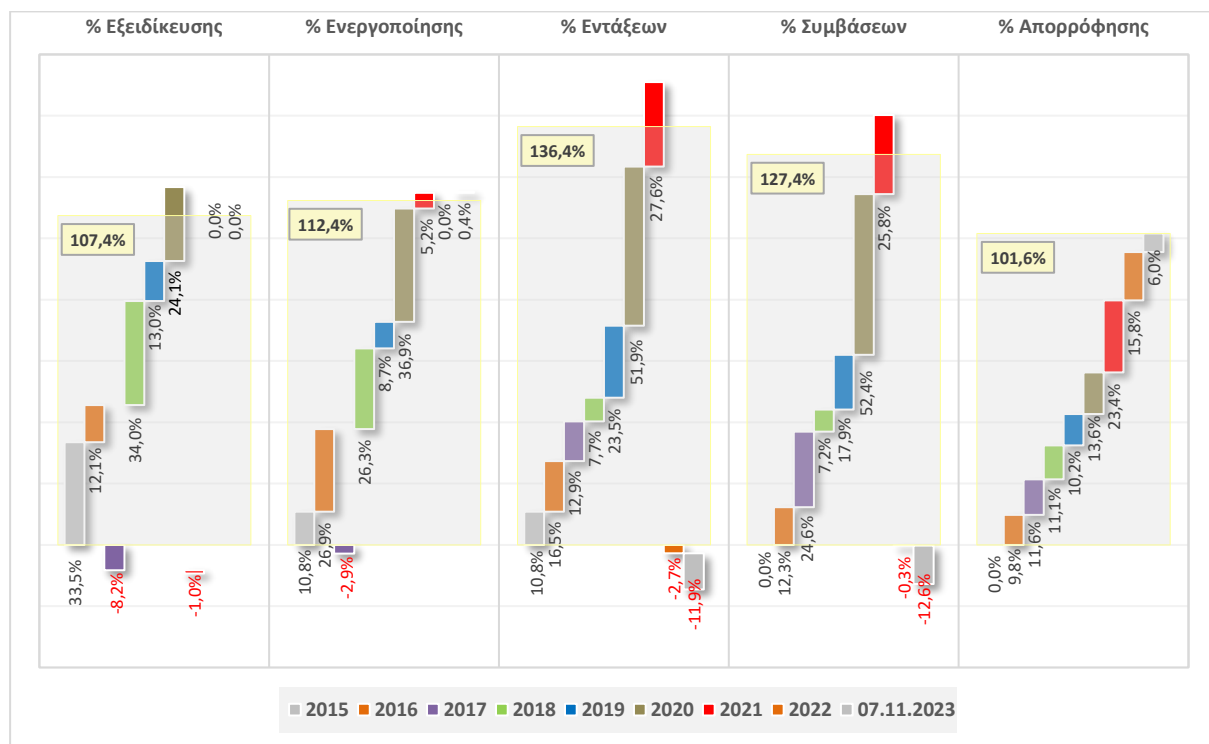

Ο ΑΠ 5 φαίνεται να επιτυγχάνει τους στόχους του ήδη, αφού οι δαπάνες υπερκαλύπτουν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ, όντας στο 101,6%, ενώ σημαντική είναι και η υπερδέσμευση των εντάξεων (136,4%) και των συμβασιοποιήσεων (127,4%).

Άξονας Προτεραιότητας 6


Ο **Άξονας Προτεραιότητας 6**, «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ», έχει **προϋπολογισμό 286.274 €** και αντιπροσωπεύει μόλις το **0,10%** του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ.

Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΑΠ 6 έχει ως εξής:

- έχει εκδοθεί **1 Πρόσκληση** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **786.274 €**, που αντιστοιχεί στο **274,7%** του προϋπολογισμού του ΑΠ,
- έχουν **ενταχθεί 5 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης **322,96 χιλ. €** που αντιστοιχεί στο **112,8%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **41,1%** του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **125,4 χιλ. €** που αντιστοιχεί στο **43,8%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **38,8%** του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **93,98 χιλ. €** και έχουν απορροφήσει το **32,8%** του προϋπολογισμού του ΑΠ, το **29,1%** του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το **75%** των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΑΠ 6 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 25. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΑΠ 6 (ως % του π/υ του)

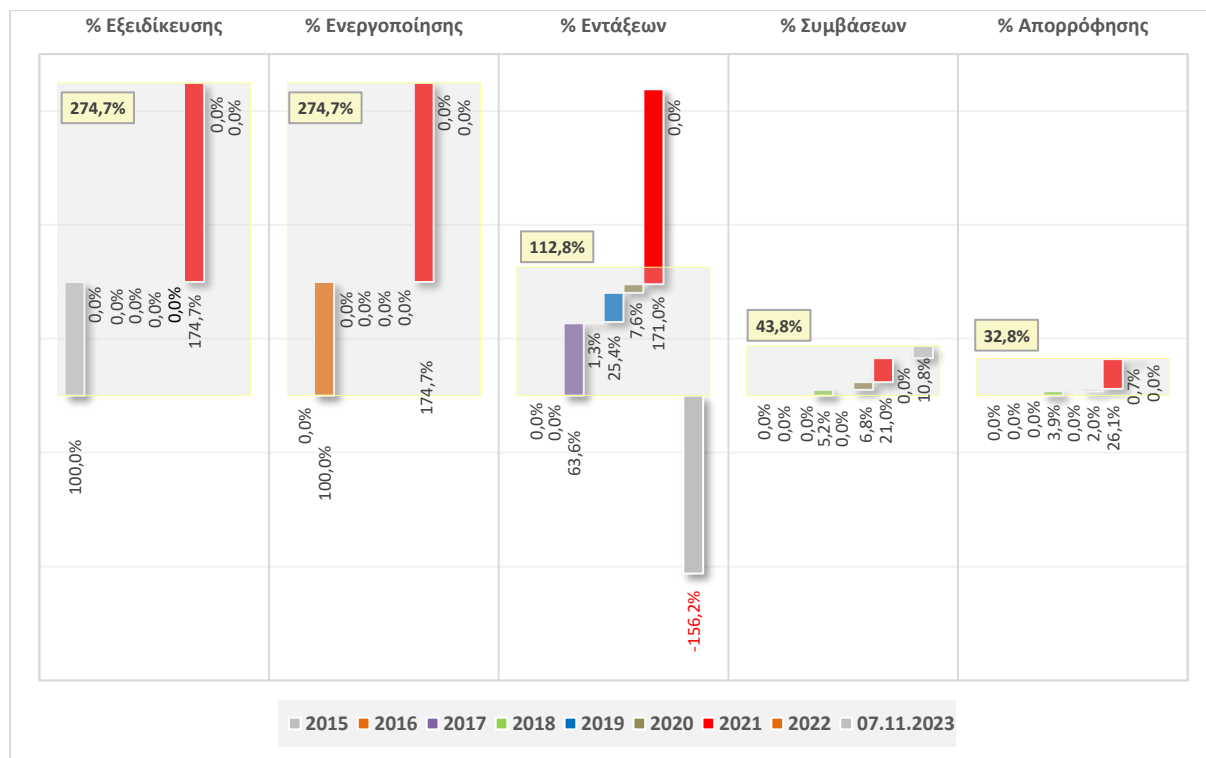

Ο ΑΠ 6 εμφανίζει πλήρη ενεργοποίηση και εντάξεις, αλλά πολύ χαμηλό βαθμό συμβασιοποίησης (43,8%) και απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (32,8%).

Η επιτάχυνση που παρατηρήθηκε στις διαδικασίες ένταξης των έργων το 2017 δεν έχει μέχρι στιγμής προσδώσει την απαιτούμενη δυναμική στην υλοποίηση του ΑΠ 6.

Άξονας Προτεραιότητας 7


Ο **Άξονας Προτεραιότητας 7**, «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», έχει προϋπολογισμό **4,21 εκ. €** και αντιπροσωπεύει μόλις το **1,4%** του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ.

Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΑΠ 7 έχει ως εξής:

- έχει εκδοθεί **1 Πρόσκληση** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **5,21 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **123,7%** του προϋπολογισμού του ΑΠ,
- έχουν **ενταχθεί 12 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης **6,24 εκ. €** που αντιστοιχούν στο **148,1%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **119,7%** του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **4,54 εκ. €** που αντιστοιχούν στο **107,8%** του προϋπολογισμού του ΑΠ και στο **72,8%** του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **3,85 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **91,4%** του προϋπολογισμού του ΑΠ, το **61,7%** του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το **84,7%** των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΑΠ 7 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 26. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΑΠ 7 (ως % του π/υ του)

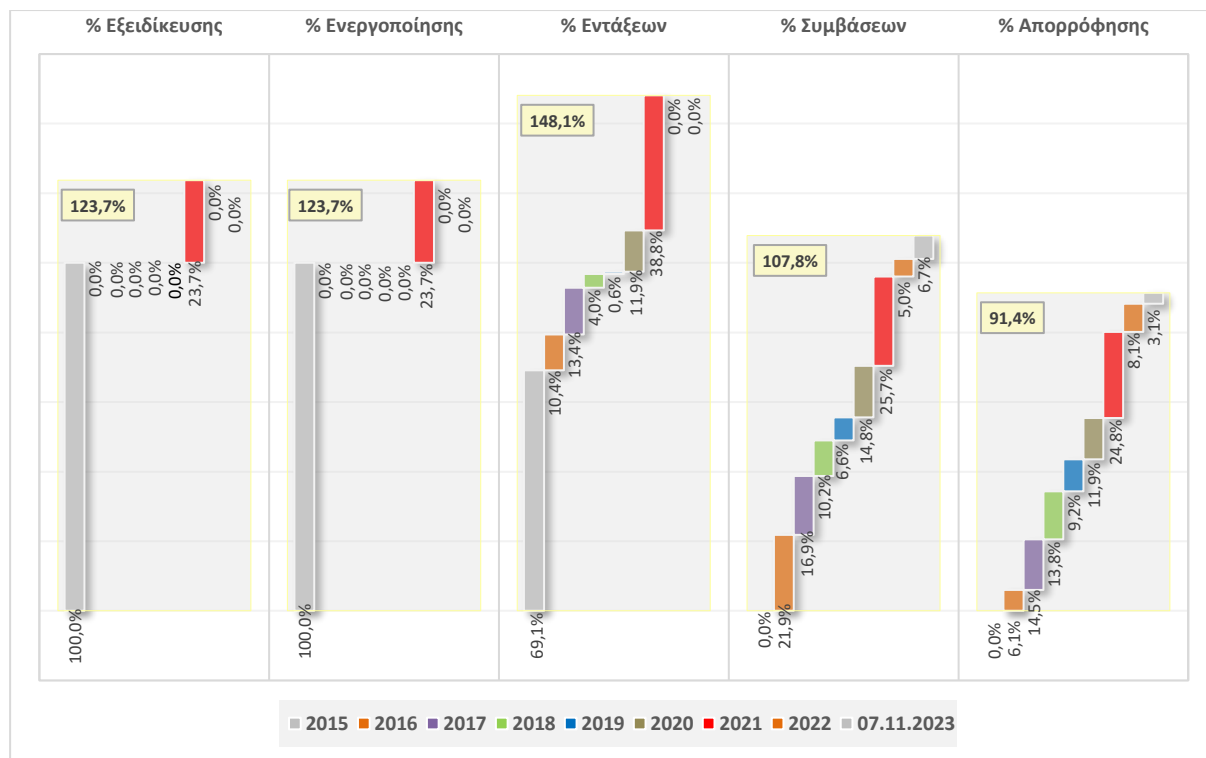


Ο ΑΠ 7 εμφανίζει πλήρη ενεργοποίηση, υπερδέσμευση σε εντάξεις και συμβάσεις (148,1% & 107,8% αντίστοιχα) και σχετικά ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (91,4%).


Συγκριτική Ανάλυση της προόδου υλοποίησης του ΕΠ Ήπειρος ανά Άξονα Προτεραιότητας

Στα Διαγράμματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εικόνα υλοποίησης του Προγράμματος ανά Άξονα Προτεραιότητας με ημερομηνία αναφοράς **07.11.2023**.


Διάγραμμα 27. Πρόοδος Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ 1 έως ΑΠ 5), 07.11.2023

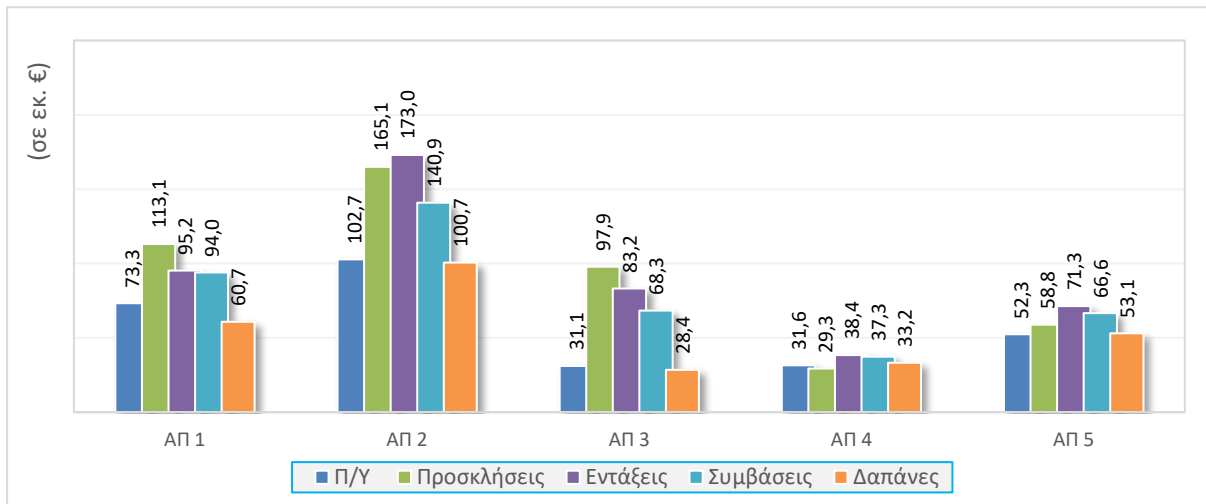

Διάγραμμα 28. Πρόοδος Υλοποίησης ανά Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ 6 & ΑΠ 7), 07.11.2023

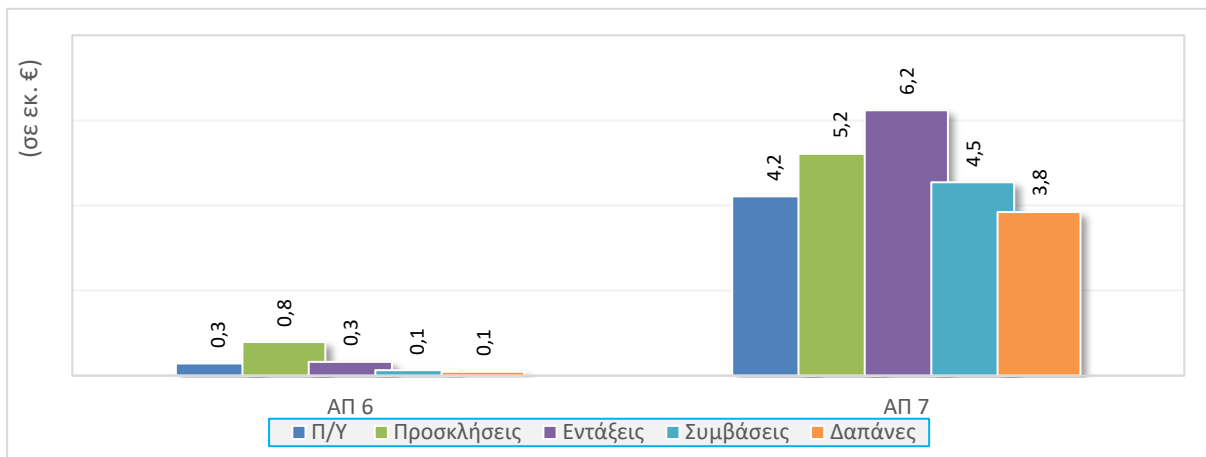


Διάγραμμα 29. % συνεισφοράς κάθε ΑΠ στην Πρόοδο Υλοποίησης του Προγράμματος, 07.11.2023

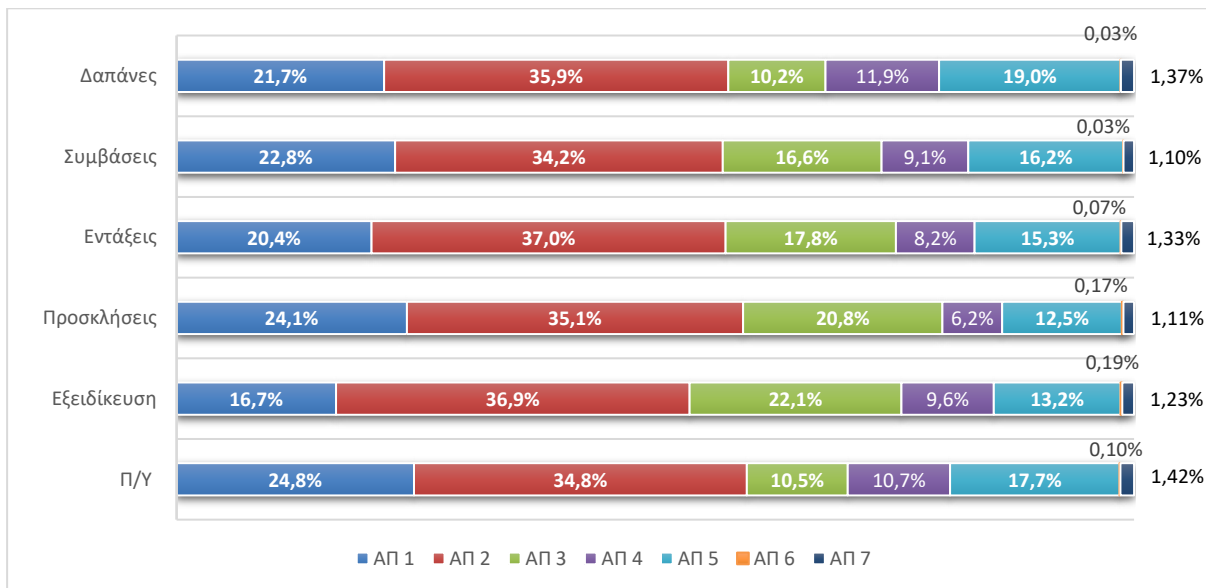


Αναλύοντας την εικόνα υλοποίησης του Προγράμματος **ανά Άξονα Προτεραιότητας στις 07.11.2023**, προκύπτει ότι:

- Όλοι οι Άξονες Προτεραιότητας έχουν πετύχει **υπερδέσμευση** στην ενεργοποίηση των πόρων τους, τις εντάξεις και τη συμβασιοποίηση, με τον **ΑΠ 3** να υπερκαλύπτει από 2 έως 3 φορές τους διαθέσιμους πόρους του στους παραπάνω δείκτες.
- Όλοι οι Άξονες Προτεραιότητας παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης που κυμαίνεται από **91,3%** έως **105,3%** των διαθέσιμων πόρων. Μόνο ο **ΑΠ 1** παρουσιάζει χαμηλότερο ποσοστό, στο **82,9%**.

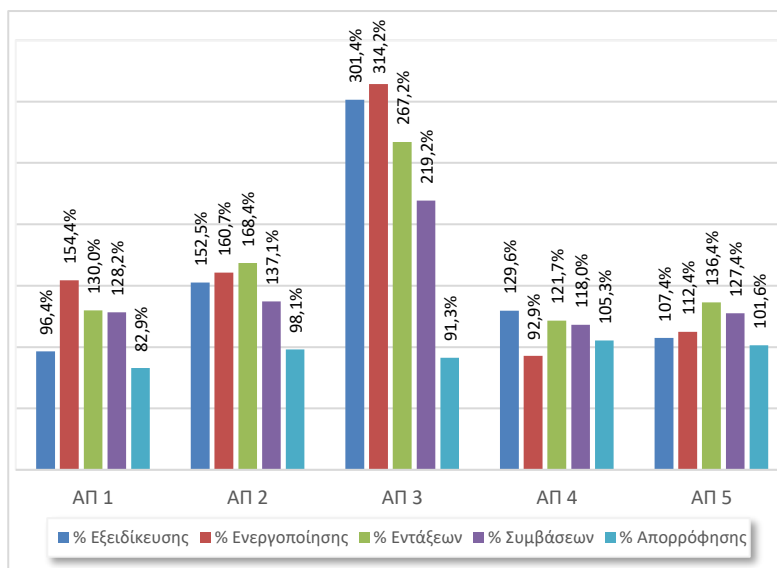


- Από τους Άξονες Προτεραιότητας της **Τεχνικής Βοήθειας**, καλύτερη συγκριτικά πρόοδο εμφανίζει ο **ΑΠ 7** (ΕΤΠΑ) έχοντας συμβασιοποιήσει το **107,8%** των διαθέσιμων πόρων και με δαπάνες που φτάνουν το **91,4%** του προϋπολογισμού του και το **84,7%** των συμβασιοποιημένων έργων, σε αντίθεση με τον **ΑΠ 6** (ΕΚΤ) που η απορρόφηση φθάνει το πολύ χαμηλό ποσοστό του 32,8%. Αντιστάθμισμα, ο πολύ μικρός προϋπολογισμός του άξονα αυτού άρα και η βαρύτητά του στο ΕΠ (1%).


Διάγραμμα 30. Διαχρονική εξέλιξη Προσκλήσεων ανά ΑΠ

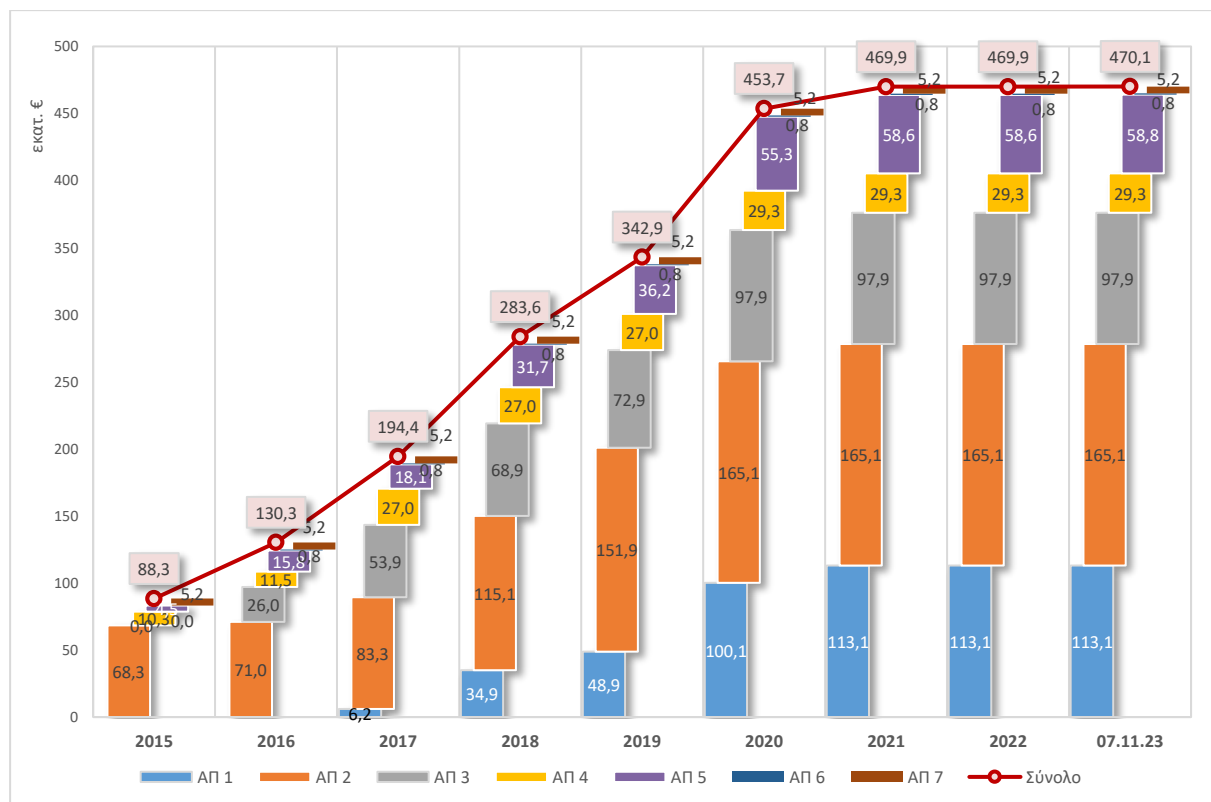


Διάγραμμα 31. Διαχρονική εξέλιξη Εντάξεων ανά ΑΠ

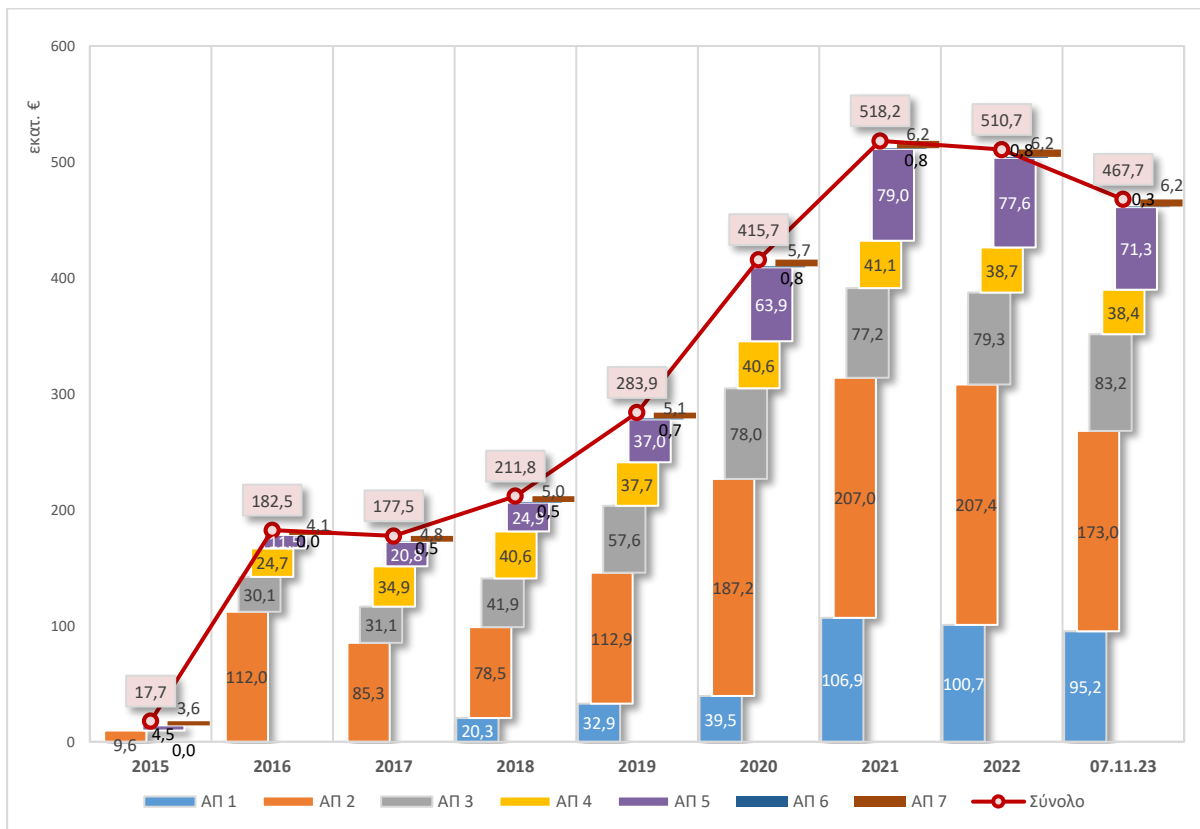

Διάγραμμα 32. Διαχρονική εξέλιξη Συμβάσεων ανά ΑΠ

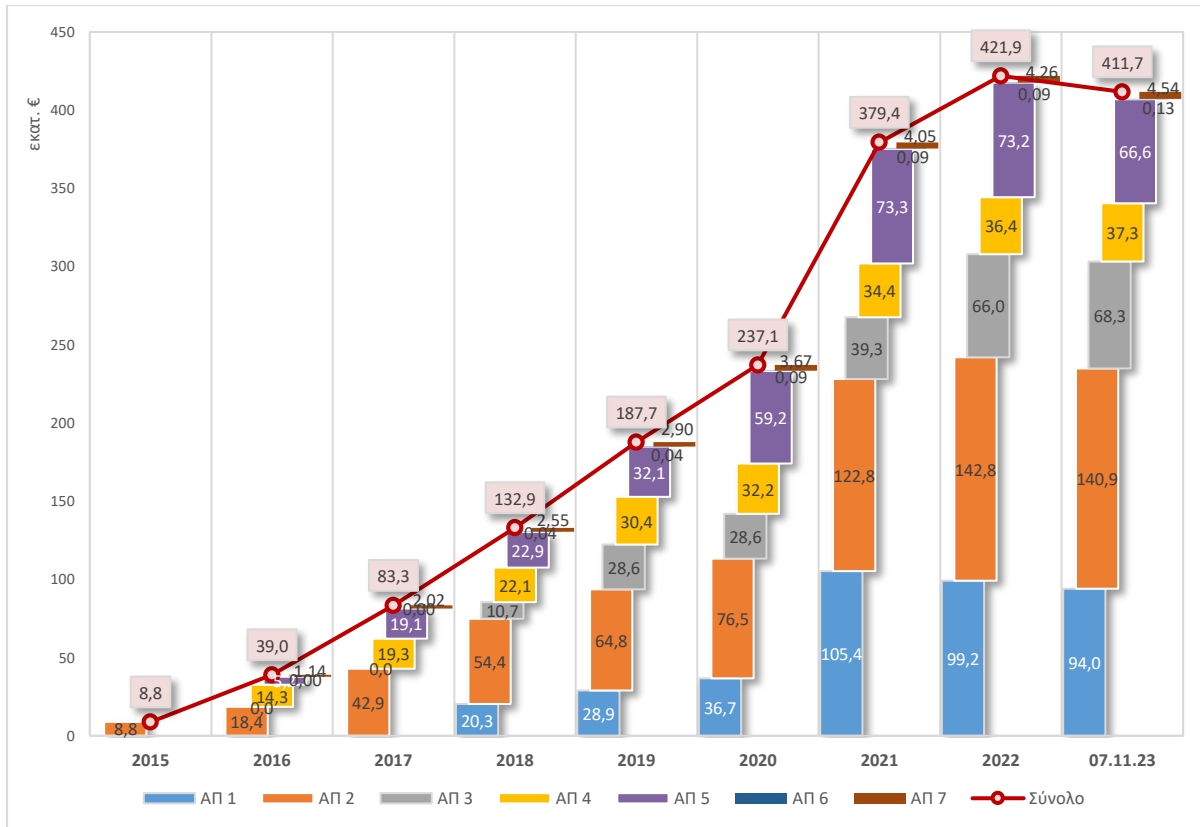

Διάγραμμα 33. Διαχρονική εξέλιξη Δαπανών ανά ΑΠ

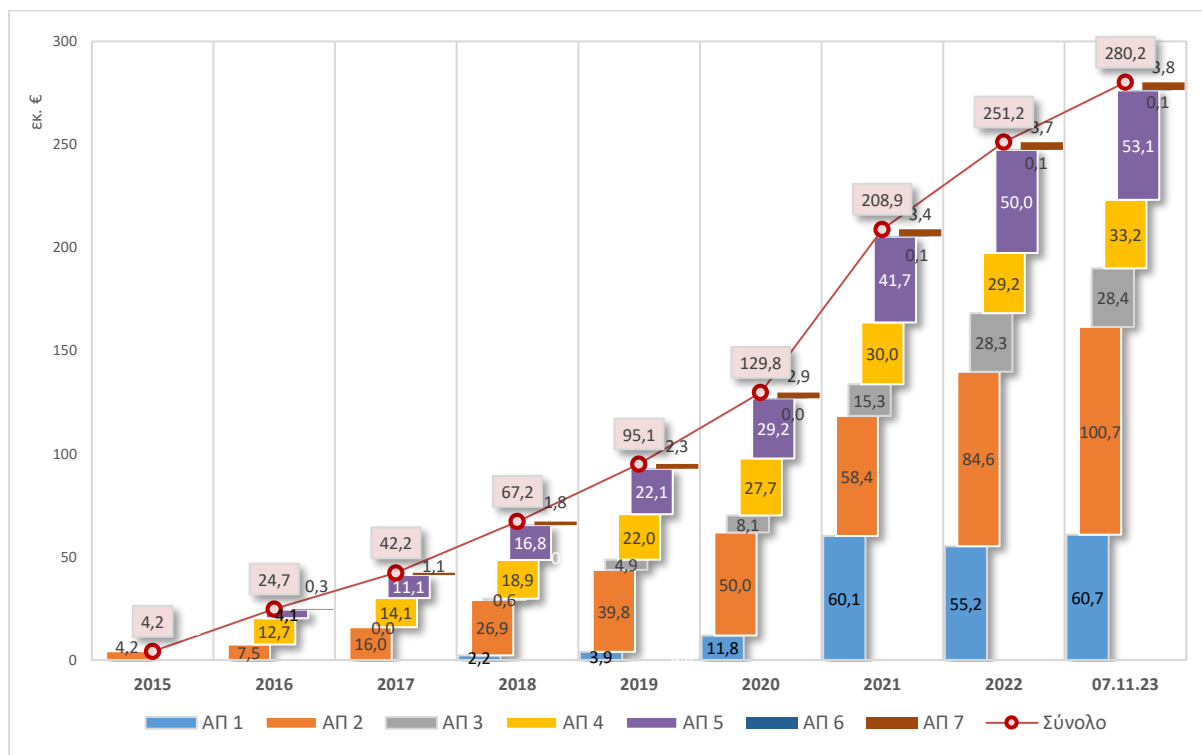

2.1.4. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ανά Θεματικό Στόχο


Θεματικός Στόχος 1

Ο **ΘΣ 1** έχει **προϋπολογισμό 9,5 εκ. €**. Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 1 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί **2 Προσκλήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **13,5 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **142,1% του προϋπολογισμού του ΘΣ**,
- έχουν **ενταχθεί 46 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης **12,3 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **129,3% του προϋπολογισμού του ΘΣ** και στο **91% του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων**,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε **11,7 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **123,2% του προϋπολογισμού του ΘΣ** και στο **95,3% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων**,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **4,94 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **52% του προϋπολογισμού του ΘΣ**, το **40,2% του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων** και το **42,2% των Νομικών Δεσμεύσεων**.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 1 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 34. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 1 (ως % του π/υ του)

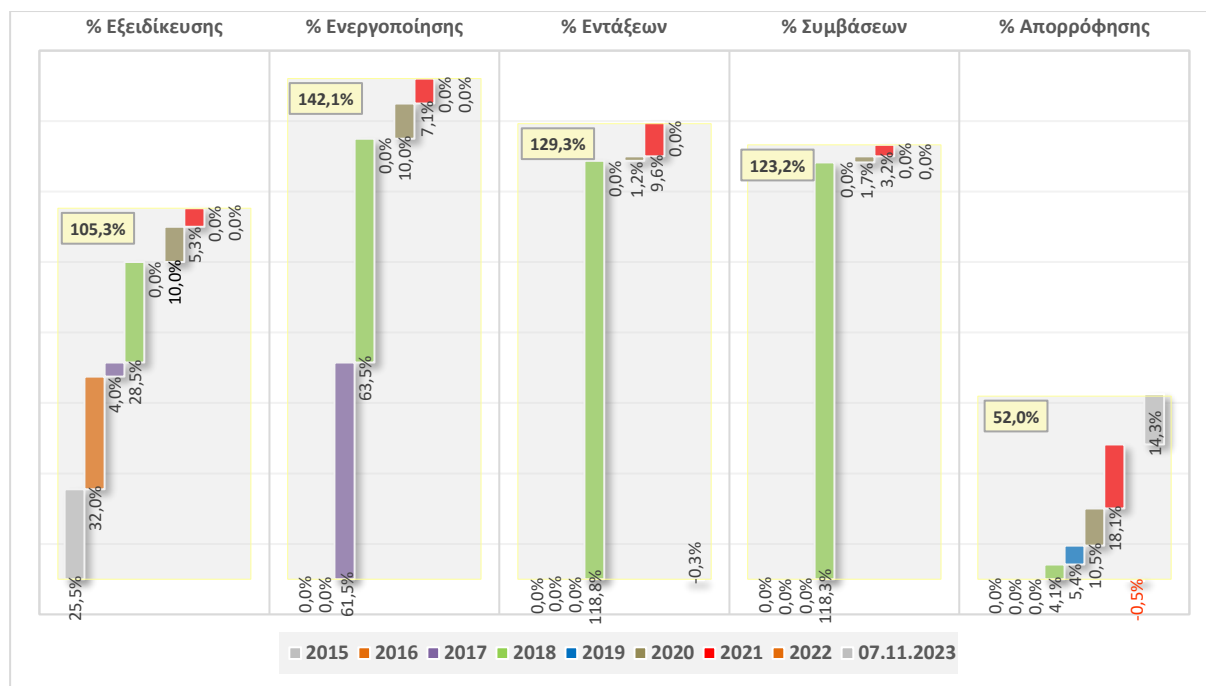

Ο ΘΣ 1 εμφανίζει υψηλό βαθμό ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποίησης αλλά χαμηλό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (52%). Η ενεργοποίηση των διαδικασιών εντάξεων και συμβασιοποίησης πραγματοποιήθηκε το 2018.


Θεματικός Στόχος 2

Ο ΘΣ 2 έχει προϋπολογισμό 8,5 εκ. €. Στις 07.11.2023, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 2 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί 5 Προσκήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 13,4 εκ. €, που αντιστοιχεί στο 156,9% του προϋπολογισμού του ΘΣ,
- έχουν ενταχθεί 693 έργα συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου 10,9 εκ. € που αντιστοιχεί στο 127,5% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 81,2% του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε περίπου 10,2 εκ. € που αντιστοιχεί στο 119,3% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 93,5% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι Πιστοποιημένες Δαπάνες ανέρχονται σε 5,93 εκ. € και έχουν απορροφήσει το 69,4% του προϋπολογισμού του ΘΣ, το 54,5% του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το 58,2% των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 2 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 35. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 2 (ως % του π/υ του)

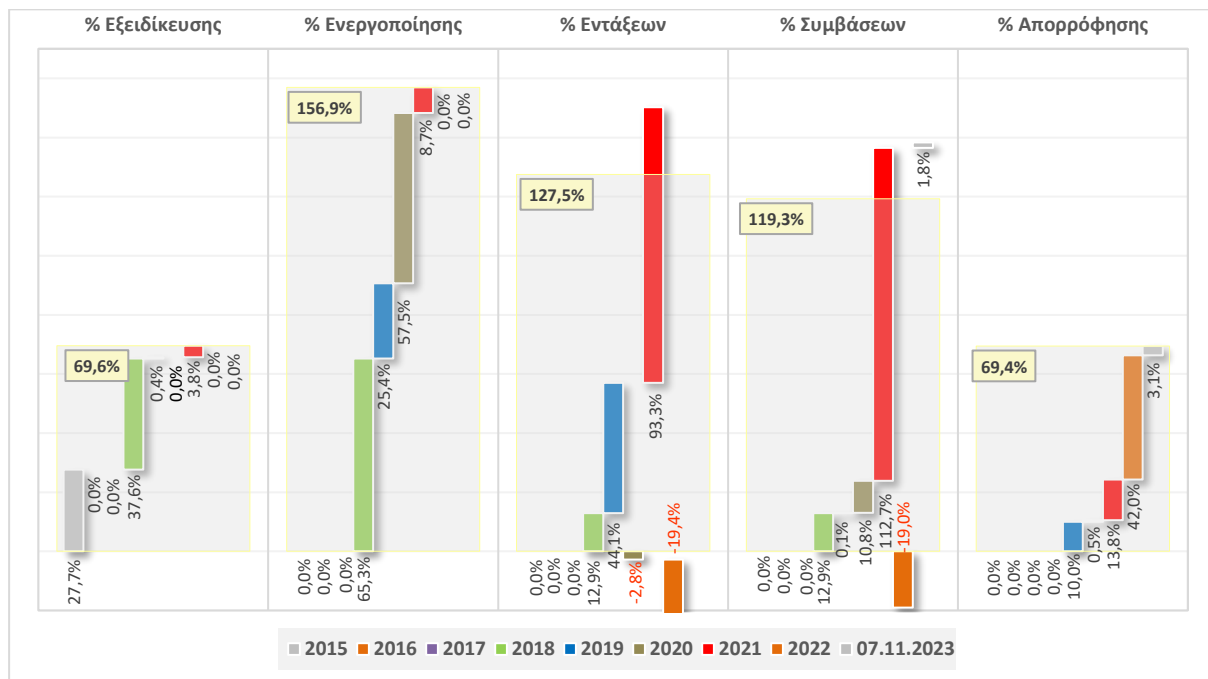

Ο ΘΣ 2 εμφανίζει υπερδέσμευση σε όλους τους δείκτες, που δεν έχει φτάσει όμως και σ' αυτόν της απορρόφησης (69,4%).


Θεματικός Στόχος 3

Ο ΘΣ 3 έχει προϋπολογισμό 55,23 εκ. €. Στις 07.11.2023, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 3 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί 7 Προσκήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 86,2 εκ. €, που αντιστοιχεί στο 156,1% του προϋπολογισμού του ΘΣ,
- έχουν ενταχθεί 4.157 έργα συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου 72,1 εκ. € που αντιστοιχεί στο 130,5% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 83,6% του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε περίπου 72,1 εκ. € που αντιστοιχεί στο 130,5% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 100% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι Πιστοποιημένες Δαπάνες ανέρχονται σε 49,86 εκ. € και έχουν απορροφήσει το 90,3% του προϋπολογισμού του ΘΣ και το 69,2% του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 3 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 36. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 3 (ως % του π/υ του)

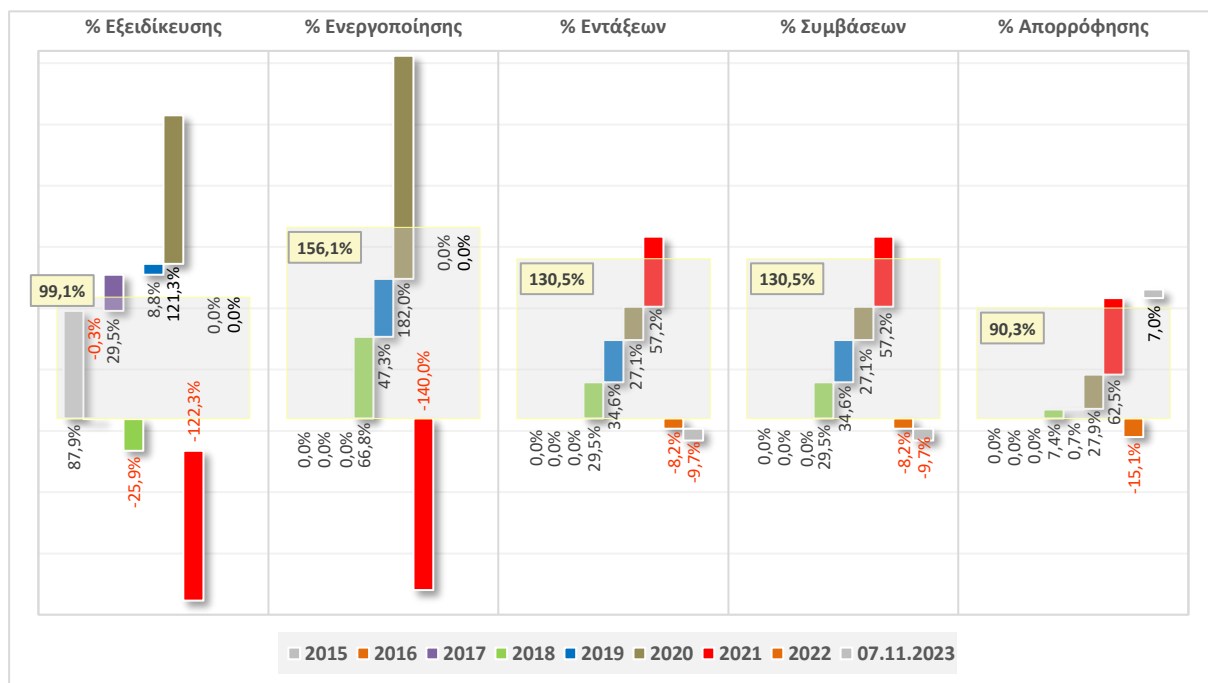

Ο ΘΣ 3 εμφανίζει υψηλότερο (υπερδέσμευση) βαθμό ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποίησης, και σχετικά ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (90,3%).


Θεματικός Στόχος 4

Ο ΘΣ 4 έχει προϋπολογισμό 31,2 εκ. €. Στις 07.11.2023, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 4 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί 9 Προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 40,9 εκ. €, που αντιστοιχεί στο 130,8% του προϋπολογισμού του ΘΣ,
- έχουν ενταχθεί 31 έργα συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου 56,64 εκ. € που αντιστοιχεί στο 181,3% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 138,6% του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων,
- οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε περίπου 42,67 εκ. € που αντιστοιχεί στο 136,6% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 75,3% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι Πιστοποιημένες Δαπάνες ανέρχονται σε 28,1 εκ. € και έχουν απορροφήσει το 89,9% του προϋπολογισμού του ΘΣ, το 49,6% του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το 65,8% των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 4 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 37. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 4 (ως % του π/υ του)

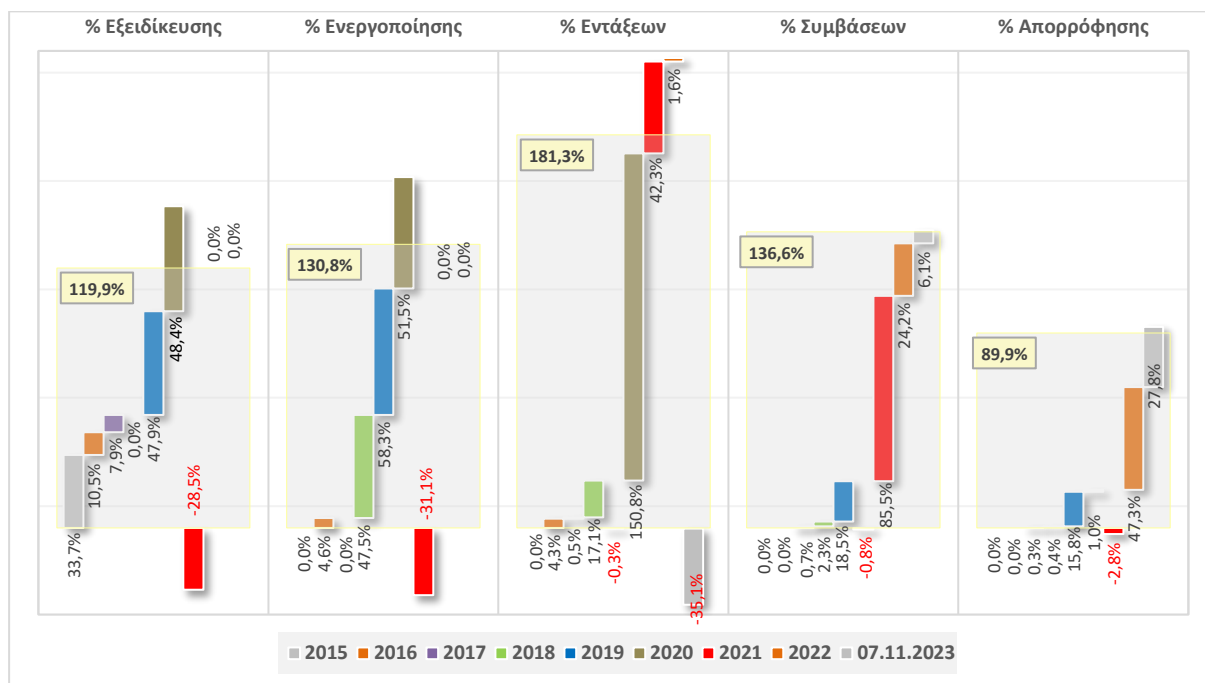

Ο ΘΣ 4 εμφανίζει πολύ υψηλό βαθμό ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποίησης, αλλά σχετικά χαμηλό βαθμό απορρόφησης (89,9%) των προγραμματικών πόρων, δεδομένης της περιόδου που διανύουμε.


Θεματικός Στόχος 5

Ο ΘΣ 5 έχει προϋπολογισμό 7,4 εκ. €. Στις 07.11.2023, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 5 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί 7 Προσκλήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 22,6 εκ. €, που αντιστοιχεί στο 306,4% του προϋπολογισμού του ΘΣ,
- έχουν ενταχθεί 17 έργα συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου 25,9 εκ. € που αντιστοιχεί στο 350,6% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 114,4% του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων,
- οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε περίπου 20,16 εκ. € που αντιστοιχεί στο 272,6% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 77,8% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι Πιστοποιημένες Δαπάνες ανέρχονται σε 9,02 εκ. € και έχουν απορροφήσει το 121,9% του προϋπολογισμού του ΘΣ, το 34,8% του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το 44,7% των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 5 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 38. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 5 (ως % του π/υ του)

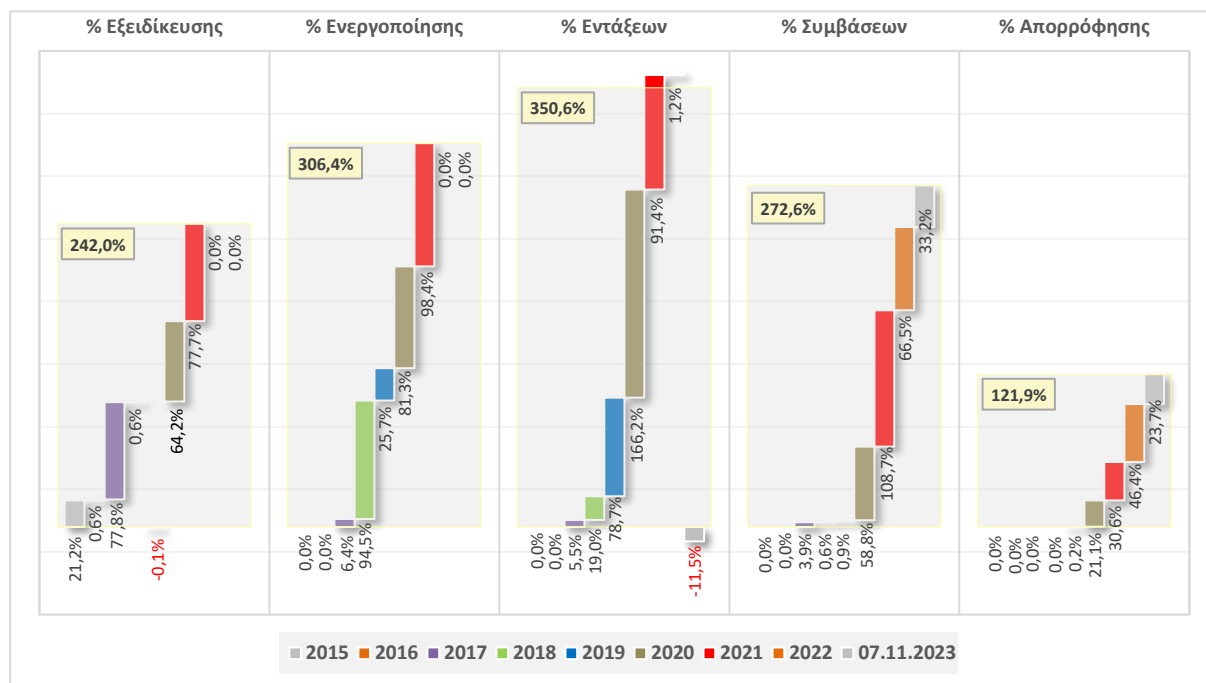

Ο ΘΣ 5 εμφανίζει υψηλότατο βαθμό ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποιήσεων (υπερδέσμευση), ενώ παράλληλα έχει απορροφήσει πλήρως τους προγραμματικούς πόρους (121,9%).


Θεματικός Στόχος 6

Ο ΘΣ 6 έχει προϋπολογισμό 64,1 εκ. €. Στις 07.11.2023, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 6 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί **14 Προσκήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **101,5 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **158,4%** του προϋπολογισμού του ΘΣ,
- έχουν **ενταχθεί 41 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου **90,38 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **141%** του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο **89%** του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε περίπου **78,05 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **121,8%** του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο **86,4%** του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **63,61 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **99,3%** του προϋπολογισμού του ΘΣ, το **70,4%** του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το **81,5%** των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 6 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 39. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 6 (ως % του π/υ του)

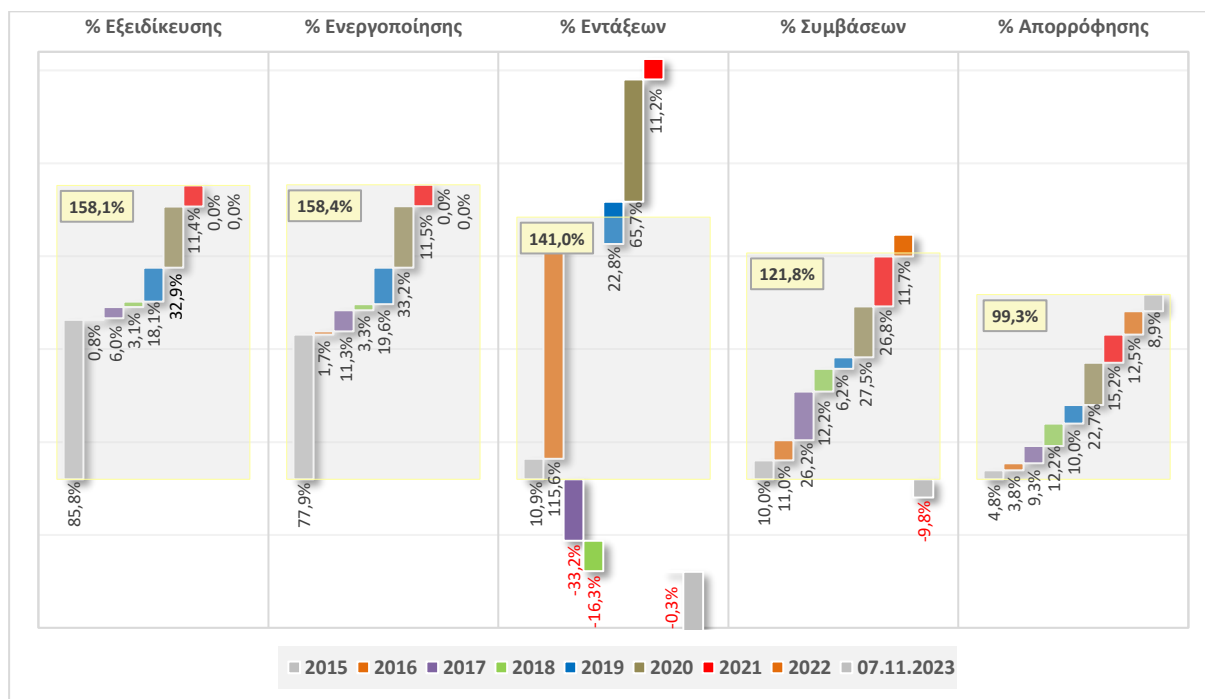

Ο ΘΣ 6 εμφανίζει υπερδέσμευση στις εντάξεις και τις συμβασιοποιήσεις και υψηλό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (99,3%).


Θεματικός Στόχος 7

Ο ΘΣ 7 έχει προϋπολογισμό 31,1 εκ. €. Στις 07.11.2023, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 7 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί 7 Προσκήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 97,9 εκ. €, που αντιστοιχεί στο 314,2% του προϋπολογισμού του ΘΣ,
- έχουν ενταχθεί 5 έργα συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου 83,2 εκ. € που αντιστοιχεί στο 267,2% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 85% του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε περίπου 68,3 εκ. € που αντιστοιχεί στο 219,2% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 82,1% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι Πιστοποιημένες Δαπάνες ανέρχονται σε 28,45 εκ. € και έχουν απορροφήσει το 91,3% του προϋπολογισμού του ΘΣ, το 34,2% του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το 41,7% των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 7 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 40. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 7 (ως % του π/υ του)

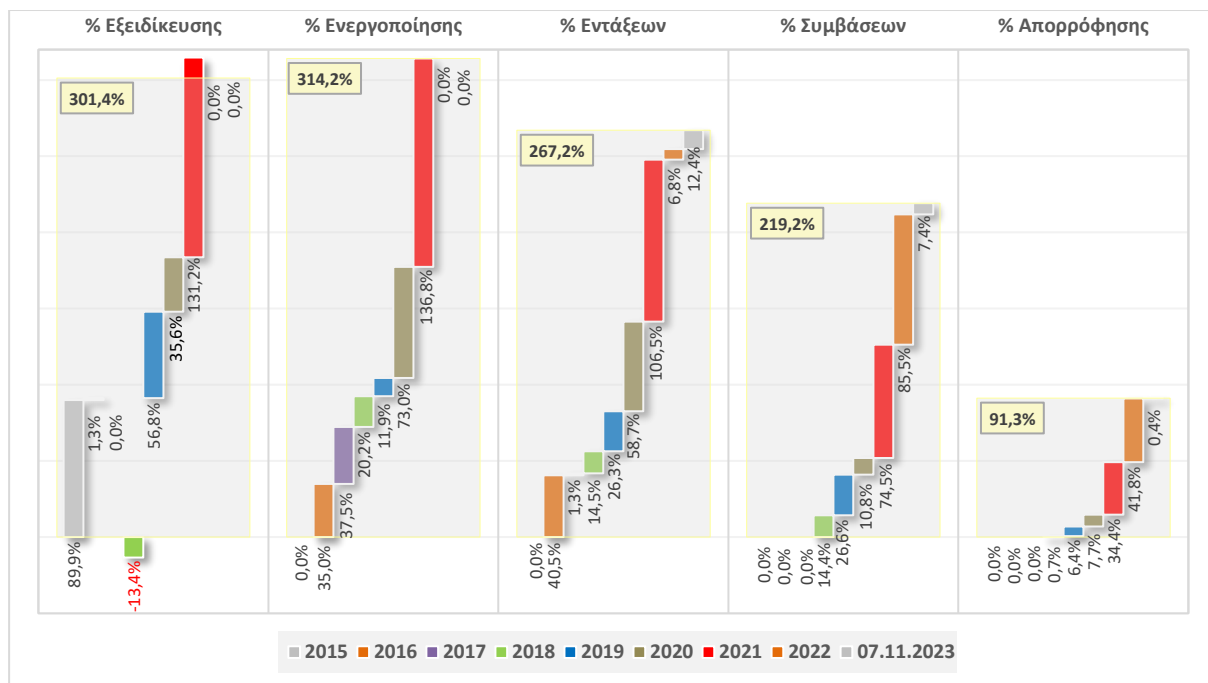

Ο ΘΣ 7 εμφανίζει υψηλότερους βαθμούς ενεργοποίησης, συμβασιοποίησης και εντάξεων (υπερδέσμευση), και σχετικά ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (91,3%).


Θεματικός Στόχος 8

Ο ΘΣ 8 έχει προϋπολογισμό 7,2 εκ. €. Στις 07.11.2023, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 8 έχει ως εξής:

- έχει εκδοθεί 1 Πρόσκληση συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 8,8 εκ. €, που αντιστοιχεί στο 122,4% του προϋπολογισμού του ΘΣ,
- έχουν ενταχθεί 261 έργα συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου 6,84 εκ. € που αντιστοιχεί στο 95,1% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 77,7% του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων,
- οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε περίπου 6,9 εκ. € που αντιστοιχεί στο 96% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 101% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι Πιστοποιημένες Δαπάνες ανέρχονται σε 5,02 εκ. € και έχουν απορροφήσει το 69,9% του προϋπολογισμού του ΘΣ, το 73,5% του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το 72,8% των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 8 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 41. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 8 (ως % του π/υ του)

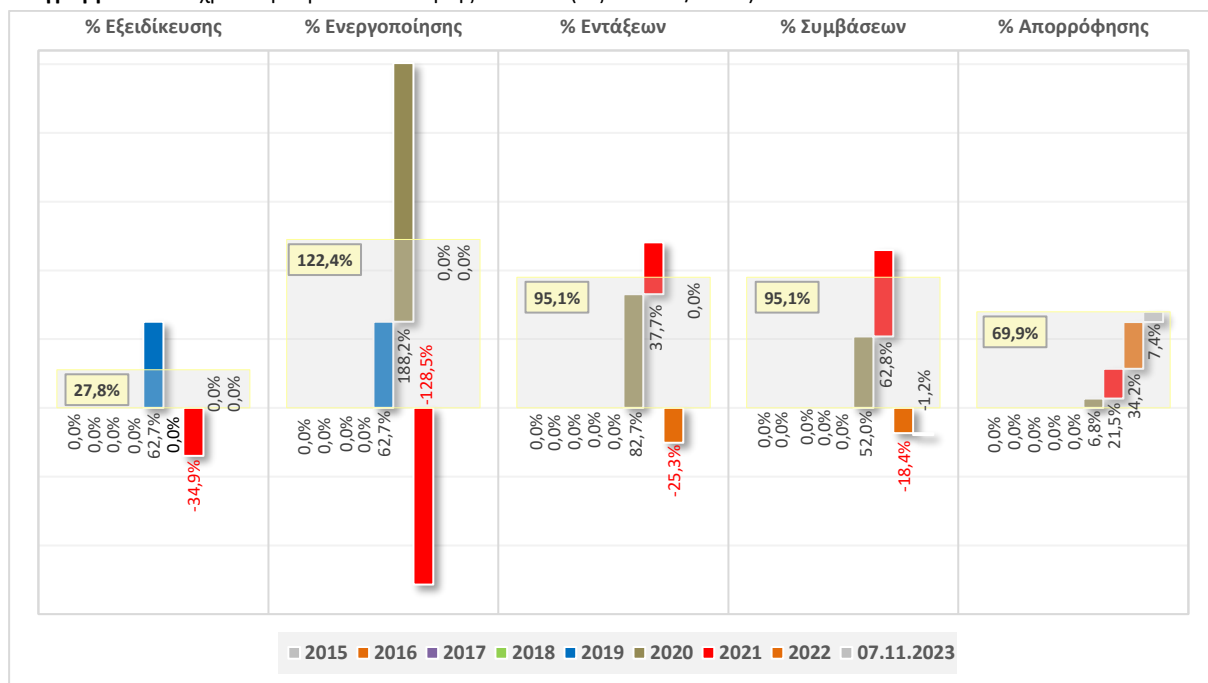

Ο ΘΣ 8 εμφανίζει υπερδέσμευση στην ενεργοποίηση, η οποία δεν έχει αποδώσει πλήρως σε εντάξεις και συμβάσεις (95,1%) και παράλληλα η απορρόφηση των διαθέσιμων πόρων είναι ιδιαίτερα χαμηλή (69,9%).


Θεματικός Στόχος 9 - ΕΤΠΑ

Ο **Θεματικός Στόχος 9 του ΕΤΠΑ** έχει προϋπολογισμό **18,6 εκ. €**. Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί **6 Προσκλήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **13,4 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **71,8%** του προϋπολογισμού του ΘΣ,
- έχουν **ενταχθεί 18 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης σχεδόν **21,63 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **116,2%** του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο **162%** του προϋπολογισμού των Προσκλήσεων,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε περίπου **20,8 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **111,7%** του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο **96,1%** του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **18,88 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **101,4%** του προϋπολογισμού του ΘΣ, το **87,3%** του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το **90,8%** των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 9 – ΕΤΠΑ παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 42. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 9- ΕΤΠΑ (ως % του π/υ του)

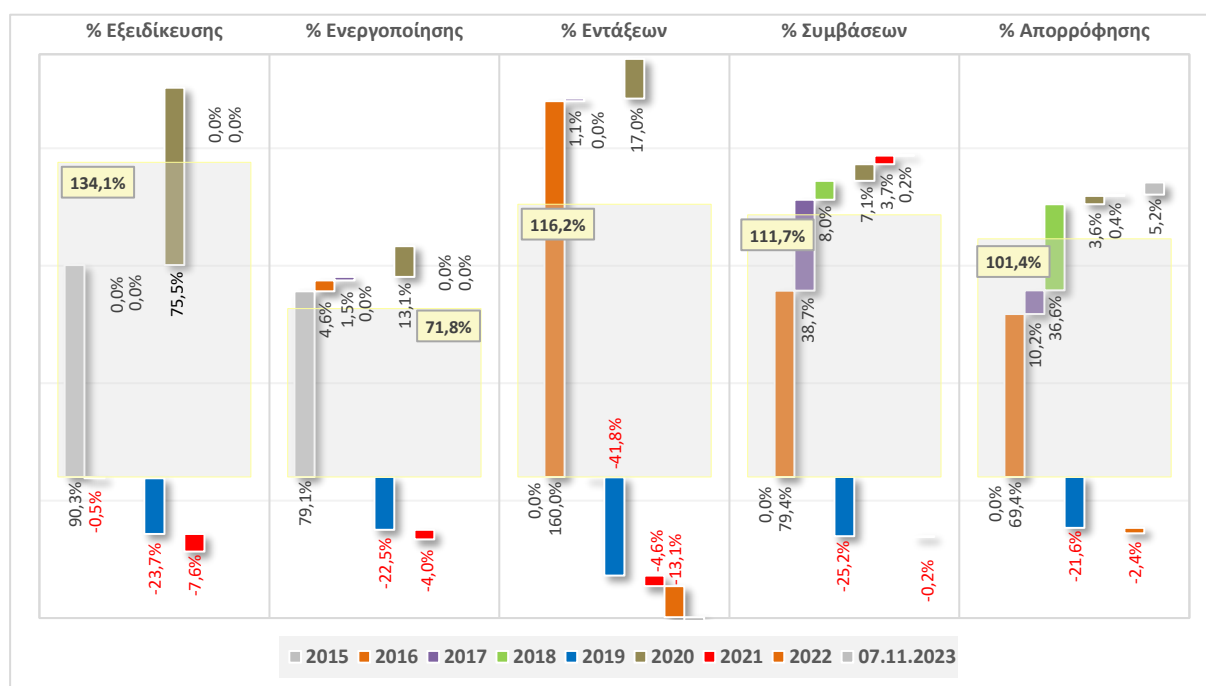

Ο ΘΣ 9 – ΕΤΠΑ εμφανίζει υψηλό βαθμό εντάξεων, συμβασιοποίησης (υπερδέσμευση) και έχει απορροφήσει πλήρως τους προγραμματικούς του πόρους (101,4%).


Θεματικός Στόχος 9- ΕΚΤ

Ο **Θεματικός Στόχος 9 του ΕΚΤ** έχει προϋπολογισμό **45,1 εκ. €**. Στις **07.11.2023**, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί **43 Προσκήσεις** συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους **49,9 εκ. €**, που αντιστοιχεί στο **110,8% του προϋπολογισμού του ΘΣ**,
- έχουν ενταχθεί **93 έργα** συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου **64,51 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **143% του προϋπολογισμού του ΘΣ** και στο **129,1% του προϋπολογισμού των Προσκήσεων**,
- οι **Νομικές Δεσμεύσεις** ανέρχονται σε περίπου **59,73 εκ. €** που αντιστοιχεί στο **132,4% του προϋπολογισμού του ΘΣ** και στο **92,6% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων**,
- οι **Πιστοποιημένες Δαπάνες** ανέρχονται σε **48,1 εκ. €** και έχουν απορροφήσει το **106,6% του προϋπολογισμού του ΘΣ**, το **74,6% του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων** και το **80,5% των Νομικών Δεσμεύσεων**.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 9 – ΕΚΤ παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 43. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 9- ΕΚΤ (ως % του π/υ του)

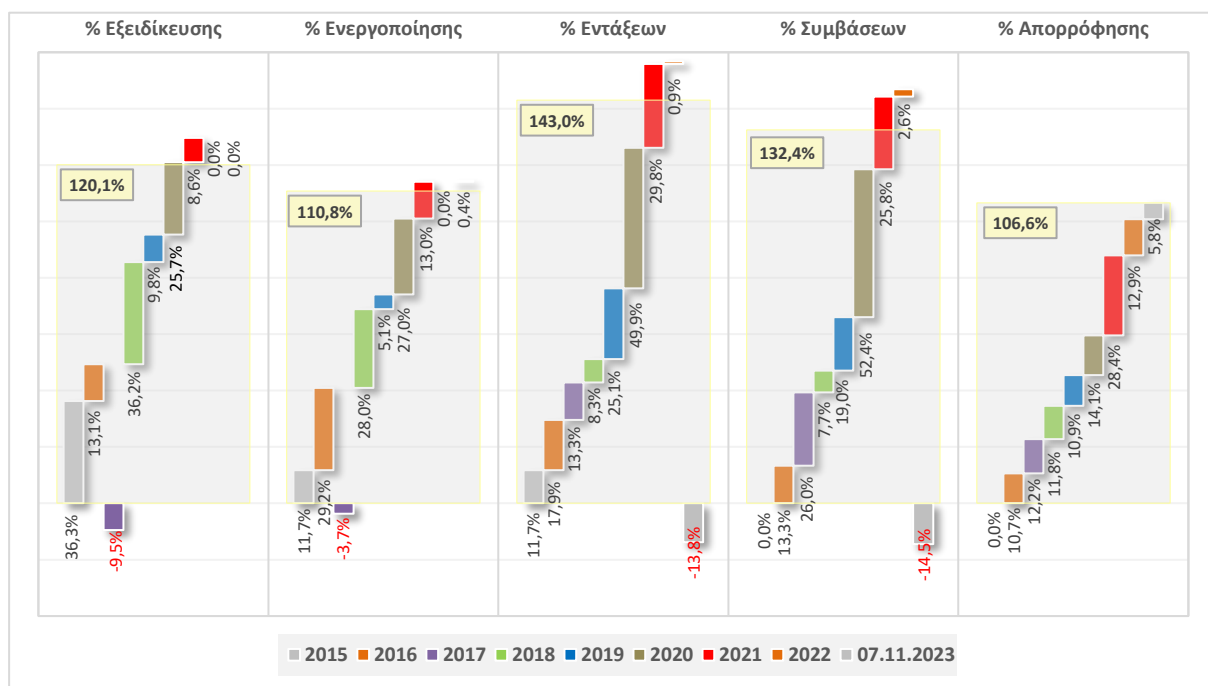

Ο ΘΣ 9 – ΕΚΤ εμφανίζει υπερδέσμευση σε όλα τα μεγέθη και έχει απορροφήσει πλήρως τους προγραμματικούς του πόρους (106,6%).


Θεματικός Στόχος 10

Ο ΘΣ 10 έχει προϋπολογισμό 12,97 εκ. €. Στις 07.11.2023, η πρόοδος υλοποίησης του ΘΣ 10 έχει ως εξής:

- έχουν εκδοθεί 5 Προσκήσεις συνολικής δημόσιας δαπάνης ύψους 15,98 εκ. €, που αντιστοιχεί στο 123,2% του προϋπολογισμού του ΘΣ,
- έχουν ενταχθεί 7 έργα συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου 16,8 εκ. € που αντιστοιχεί στο 129,5% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 105,1% του προϋπολογισμού των Προσκήσεων,
- οι Νομικές Δεσμεύσεις ανέρχονται σε περίπου 16,5 εκ. € που αντιστοιχεί στο 127,1% του προϋπολογισμού του ΘΣ και στο 98,2% του προϋπολογισμού των ενταγμένων έργων,
- οι Πιστοποιημένες Δαπάνες ανέρχονται σε 14,36 εκ. € και έχουν απορροφήσει το 110,7% του προϋπολογισμού του ΘΣ, το 85,5% του προϋπολογισμού των Ενταγμένων έργων και το 87,1% των Νομικών Δεσμεύσεων.

Η διαχρονική εξέλιξη υλοποίησης του ΘΣ 10 παρατίθεται στο Διάγραμμα που ακολουθεί:

Διάγραμμα 44. Διαχρονική πορεία υλοποίησης του ΘΣ 10 (ως % του π/υ του)

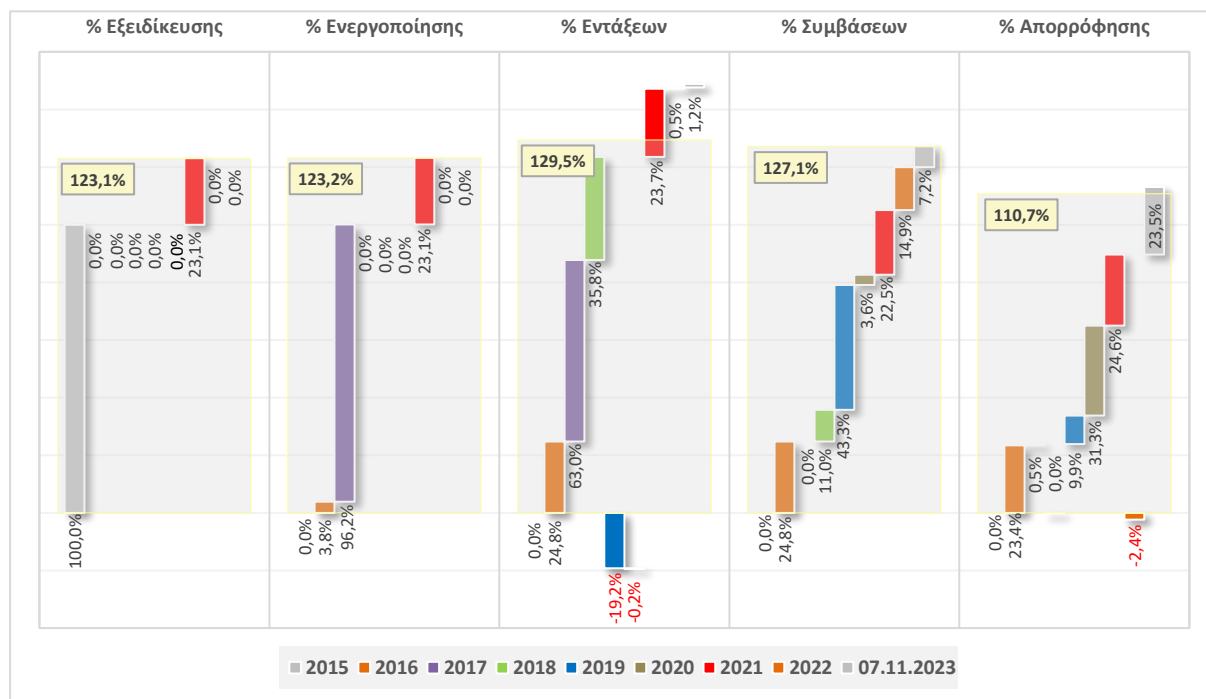

Ο ΘΣ 10 εμφανίζει υψηλό ποσοστό ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβάσεων και έχει απορροφήσει πλήρως τους προγραμματικούς του πόρους (110,7%).

2.1.5. Πρόοδος υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα

Στην παρούσα ενότητα γίνεται ανάλυση της πορείας υλοποίησης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων (Επ. Πρ.) ανά Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος. Όπου γίνεται αναφορά στον προϋπολογισμό ή τη δημόσια δαπάνη των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων νοούνται τα αντίστοιχα ποσά της ενδεικτικής κατανομής των πόρων του Προγράμματος στις Επ. Πρ. των επιμέρους Αξόνων Προτεραιότητας.

Πορεία υλοποίησης Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 1

Από το Πρόγραμμα στον ΑΠ 1 έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες **επτά (7) Επ. Πρ.** των ΘΣ 1, 2 και 3:


- ▶ **1α - Ενίσχυση υποδομών έρευνας και καινοτομίας και ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και προώθηση κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος,**
- ▶ **1b - Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην έρευνα και καινοτομία, ανάπτυξη δεσμών και συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας και ανάπτυξης και του τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,**
- ▶ **2b - Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ**
- ▶ **2c - Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ στον τομέα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, της ηλεκτρονικής μάθησης, της ηλεκτρονικής ένταξης, του ηλεκτρονικού πολιτισμού και της ηλεκτρονικής υγείας,**
- ▶ **3α - Προώθηση της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής εκμετάλλευσης νέων ιδεών και τη στήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων μέσω φυτωρίων επιχειρήσεων,**
- ▶ **3b - Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση,**
- ▶ **3c - Στήριξη της δημιουργίας και επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών.**

Η ενδεικτική χρηματοδοτική βαρύτητα, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης των Επ. Πρ. του ΑΠ 1, μέχρι την 07.11.2023 έχει ως εξής:

- την υψηλότερη **χρηματοδοτική βαρύτητα** διαθέτει η Επ. Πρ. 3c (68,24%), ακολουθούν οι Επ. Πρ. 1b (με 12,28%) και ακολουθούν οι 2b και 3a (8,92% και 7% αντίστοιχα), ενώ χαμηλή είναι η χρηματοδοτική βαρύτητα των Επ. Πρ. 2c, 1a και 3b (2,73%, 0,68% και 0,14% αντίστοιχα),
- συνολικά **σε μέτρια επίπεδα παραμένει ο βαθμός απορρόφησης των πόρων των Επ. Πρ.** του ΑΠ1 σε σχέση με τους υπόλοιπους άξονες και δεδομένης της χρονικής περιόδου που διανύει το πρόγραμμα, με **82,88%**,
- **υψηλότερη πρόοδο υλοποίησης παρουσιάζει η Επ. Πρ. 3a**, στην οποία έχουν ενταχθεί **54 έργα** συνολικής δημόσιας δαπάνης 13,8 εκ. € (269,8% των πόρων της), με την απορρόφηση να ανέρχεται στο 104,5% των διαθέσιμων πόρων της, **ενώ ακολουθεί η Επ. Πρ. 3c**, στην οποία έχουν ενταχθεί **4.101 έργα** συνολικής δημόσιας δαπάνης 58,11 εκ. € (116,21% των πόρων της), με την απορρόφηση να ανέρχεται στο 88,84% των διαθέσιμων πόρων της.
- στην **Επ. Πρ. 2b** έχουν ενταχθεί **674 έργα** συνολικής δημόσιας δαπάνης 7 εκ. € (107,43% των πόρων της), τα οποία έχουν συμβασιοποιηθεί στο σύνολό τους με την απορρόφηση όμως σε μέτρια επίπεδα (78,76%),
- παρά τον πολύ υψηλό βαθμό εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων της **Επ. Πρ. 1b** (130%), στην οποία έχουν ενταχθεί 45 έργα, χαμηλή παραμένει η απορρόφηση των πόρων της (54,87%),

- παρά τον πολύ υψηλό βαθμό εντάξεων της **Επ. Πρ. 2c** (193% περίπου των πόρων της), αλλά και των συμβασιοποιήσεων (158% περίπου), οι πιστοποιημένες δαπάνες τους παραμένουν πολύ χαμηλές (38,97%),
- μέχρι την 07.11.2023 δεν έχει συμβασιοποιηθεί το μοναδικό έργο της **Επ. Πρ. 1a** (0,6 εκ. €),
- τέλος, στην **Επ. Πρ. 3b** έχουν ενταχθεί και συμβασιοποιηθεί 2 έργα, δεσμεύοντας πλήρως τους διαθέσιμους πόρους της (116,7%), με την απορρόφηση όμως σε μέτρια επίπεδα (78,39%).

Διάγραμμα 45. Πορεία υλοποίησης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 1 (σε εκ. €)

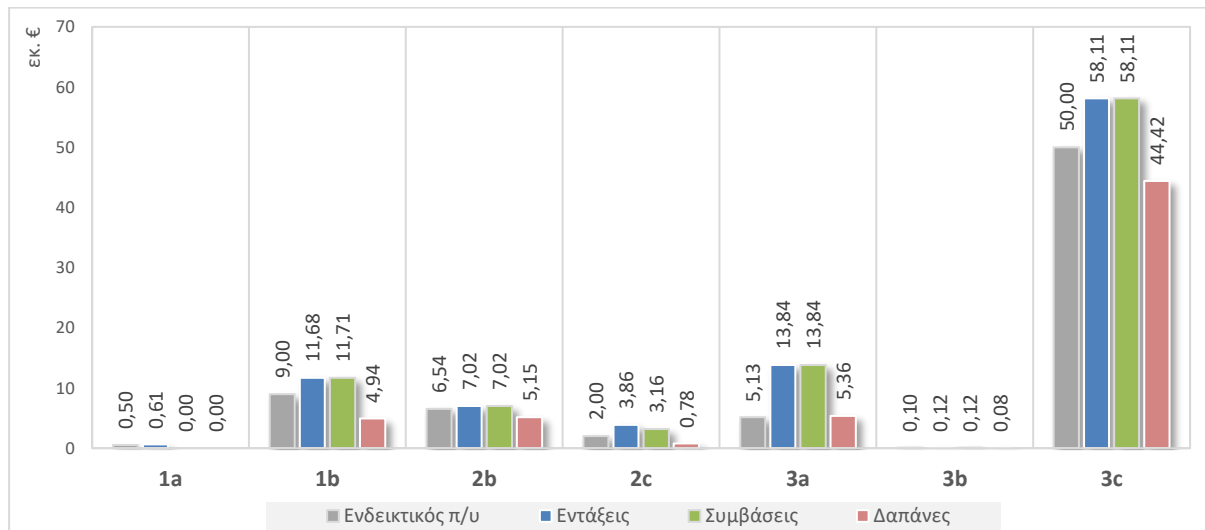

Πορεία υλοποίησης Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 2


Από το Πρόγραμμα στον ΑΠ 2 έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες επτά (7) Επ. Πρ. των ΘΣ 4, 5 και 6:

- 4c - Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης, της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτηρίων, και στον τομέα της στέγασης,
- 4e - Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων
- 5b - Προώθηση των επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφάλιση της ανθεκτικότητας στις καταστροφές και ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης των καταστροφών,
- 6b - Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του περιβαλλοντικού κεκτημένου της Ένωσης και να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις,
- 6c - Διατήρηση, προστασία, προώθηση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς,
- 6d - Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προώθηση των υπηρεσιών οικοσυστήματος, μεταξύ άλλων μέσω του δικτύου Natura 2000, και των πράσινων υποδομών
- 6e - Ανάλυση δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων (συμπεριλαμβανομένων των προς ανασυγκρότηση περιοχών), τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την προώθηση μέτρων για τον περιορισμό του θορύβου

Η ενδεικτική χρηματοδοτική βαρύτητα, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης των Επ.Πρ. του ΑΠ 2, μέχρι την 07.11.2023 έχει ως εξής:

- την υψηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα διαθέτει η Επ. Πρ. 6b (47,26%), ενώ ιδιαίτερα χαμηλή είναι η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επ. Πρ. 6d (0,39%),
- υψηλότερη πρόοδο υλοποίησης παρουσιάζουν οι Επ. Πρ. 4e, 5b και 6c στις οποίες, στη μεν πρώτη έχουν ενταχθεί 26 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 25,8 εκ. € (1150% των πόρων της) με τις δαπάνες της να υπερκαλύπτουν τους πόρους της πάνω από 2 φορές (απορρόφηση 211,65%), στη δεύτερη έχουν ενταχθεί 17 έργα συνολικής ΔΔ 25,93 εκ. € (350,6% των πόρων της) και την απορρόφηση να φτάνει στο 121,9% και στην τρίτη έχουν ενταχθεί 8 έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 15,3 εκ. € (152,85% των πόρων της), με την απορρόφηση να ανέρχεται αντίστοιχα στο 114,24%,
- υψηλό βαθμό εντάξεων και συμβασιοποιήσεων παρουσιάζει η Επ. Πρ. 4c (5 ενταγμένα έργα με 106,22% εντάξεις και 104,29% συμβασιοποιήσεις), αλλά μόλις 80,49% απορρόφηση,
- η Επ. Πρ. 6b με την υψηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα, παρουσιάζει υπερδέσμευση στις εντάξεις και νομικές δεσμεύσεις (135,56% και 113,07% αντίστοιχα) με σχετικά ικανοποιητική απορρόφηση (95,01%),
- στην Επ. Πρ. 6d έχουν ενταχθεί 5 έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί.
- Τέλος, η Επ. Πρ. 6e με 7 ενταγμένα έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 8,9 εκ. €, παρουσιάζει υψηλό βαθμό εντάξεων (173,2%), συμβάσεων (158,63%) και απορρόφησης (110,38%).

Διάγραμμα 46. Πορεία υλοποίησης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 2 (σε εκ. €)

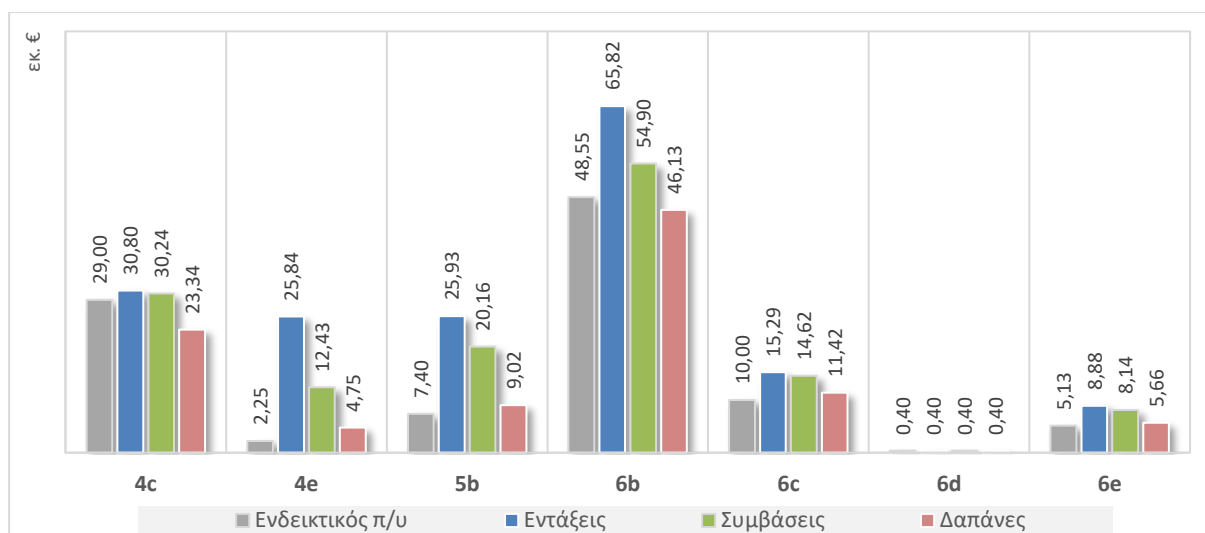


Πορεία υλοποίησης Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 3

Από το Πρόγραμμα στον ΑΠ 3 έχει επιλεγεί μόνο μια (1) Επ.Πρ. του ΘΣ 7:

- ▶ 7b - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων με τις υποδομές ΔΕΔ-Μ, περιλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων.

Στην εν λόγω Επ.Πρ. έχουν ενταχθεί πέντε (5) έργα συνολικής δημόσιας δαπάνης 83,2 εκ. € (267,2% των πόρων της Επ.Πρ.), που παρουσιάζουν και υψηλές νομικές δεσμεύσεις (219,24% των πόρων της) και σχετικά ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης (91,35%).

Διάγραμμα 47. Πορεία υλοποίησης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 3 (σε εκ. €)

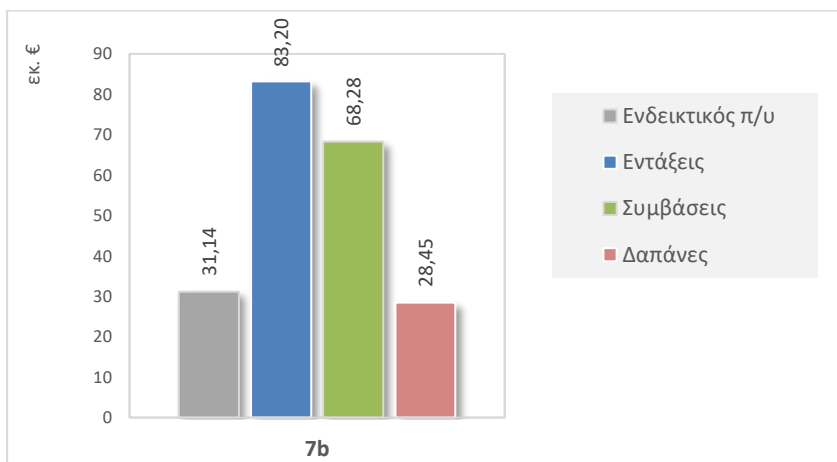

Πορεία υλοποίησης Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 4


Από το Πρόγραμμα στον ΑΠ 4 έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες τρεις (3) Επ.Πρ. των ΘΣ 9 και 10:

- ▶ **9a** - Επενδύσεις στις υποδομές υγείας και τις κοινωνικές υποδομές,
- ▶ **9b** - Παροχή στήριξης για φυσική, οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων κοινοτήτων εντός αστικών και αγροτικών περιοχών
- ▶ **10a** - Επενδύσεις στην εκπαίδευση την κατάρτιση, και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση με την ανάπτυξη υποδομών κατάρτισης και εκπαίδευσης

Η ενδεικτική χρηματοδοτική βαρύτητα, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης των Επ.Πρ. του ΑΠ 4, μέχρι την 07.11.2023 έχει ως εξής:

- **Ιδιαίτερα χαμηλή χρηματοδοτική βαρύτητα διαθέτει η Επ.Πρ. 9b** (0,63%), ενώ οι λοιποί πόροι του ΑΠ κατανέμονται στις Επ.Πρ. 9a και 10a με 58,30% και 41,07% αντίστοιχα,
- **μηδενική είναι η απορρόφηση της Επ.Πρ. 9b**, με 1 ενταγμένο έργο π/υ 500 χιλ. €, το οποίο έχει συμβασιοποιηθεί,
- **πολύ καλή πρόοδο υλοποίησης παρουσιάζουν οι άλλες δύο Επ.Πρ.**, με υπερδέσμευση στις εντάξεις και συμβασιοποιήσεις με συνολικά **24 έργα** και έχοντας απορροφήσει των σύνολο των διαθέσιμων πόρων τους (απορρόφηση στη μεν **Επ.Πρ. 9a** 102,54% και στην **Επ.Πρ. 10a** 110,72%).

Διάγραμμα 48. Πορεία υλοποίησης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 4 (σε εκ. €)

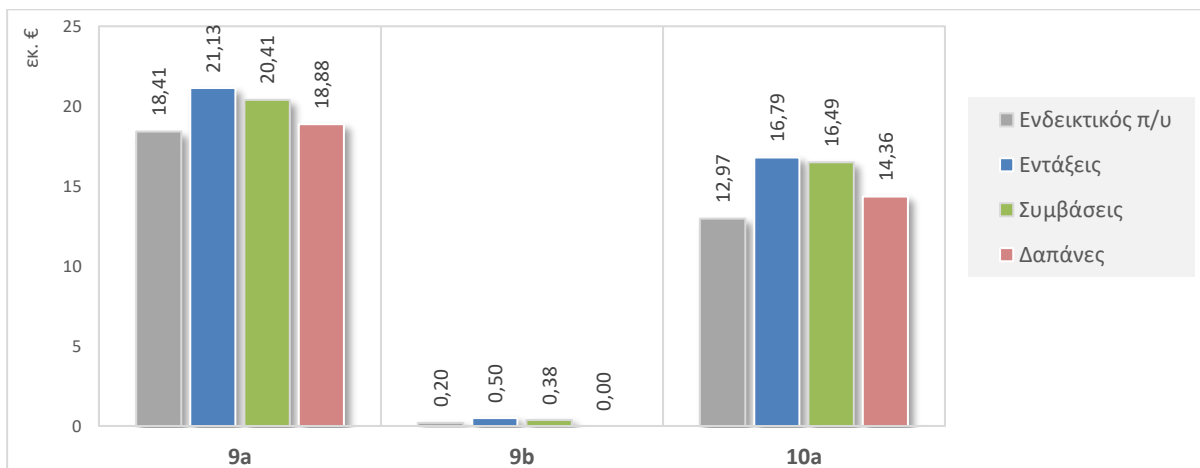

Πορεία υλοποίησης Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 5

Από το Πρόγραμμα στον ΑΠ 5 έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες επτά (7) Επ. Πρ. των ΘΣ του ΕΚΤ 8 και 9:


- ▶ 8i - Πρόσβαση των ατόμων που αναζητούν εργασία και των μη ενεργών οικονομικά ατόμων στην απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που βρίσκονται για μεγάλο χρονικό διάστημα εκτός της αγοράς εργασίας,
- ▶ 9i - Ενεργητική ένταξη, μεταξύ άλλων και με σκοπό την προώθηση των ίσων ευκαιριών και της δραστηριότητας συμμετοχής και τη βελτίωση των δυνατοτήτων απασχόλησης
- ▶ 9ii - Κοινωνικοοικονομική ένταξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά
- ▶ 9iii - Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και προώθηση των ίσων ευκαιριών
- ▶ 9iv - Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
- ▶ 9v - Προώθηση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ενσωμάτωσης σε κοινωνικές επιχειρήσεις και την κοινωνική και αλληλέγγυο οικονομία ώστε να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση
- ▶ 9vi - Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

Να σημειωθεί ότι μια όγδοη επενδυτική προτεραιότητα, η 8v (Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές), μηδενίσθηκε κατά την αναθεώρηση του 2021.

Η ενδεικτική χρηματοδοτική βαρύτητα, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης των Επ.Πρ. του ΑΠ 4, μέχρι την 07.11.2023 έχει ως εξής:

- την **υψηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα διαθέτουν οι Επ.Πρ. 9i και 9iv** (27,99% και 35,85%), ακολουθούν οι Επ.Πρ. 9iii και 8i (14,17% και 13,75%), ενώ χαμηλή είναι η χρηματοδοτική βαρύτητα των υπολοίπων Επ.Πρ. 9ii, 9vi και 9v (3,65%, 3,06% και 1,52%),
- **υπερκάλυψη των πόρων** εμφανίζουν ήδη οι **Επ.Πρ. 9i, 9ii, 9iii και 9iv** με 70 έργα να έχουν φέρει δαπάνες ύψους 18, 2, 8 & 19,5 εκ. € αντίστοιχα στις παραπάνω Επ.Πρ.,
- **σχετικά χαμηλή απορρόφηση** παρουσιάζουν τα 261 έργα της Επ.Πρ. 8i (69,89%),
- **πολύ χαμηλή απορρόφηση** παρουσιάζουν οι **Επ.Πρ. 9v και 9vi** (24,21% και 10,93%) με τη δεύτερη να υπολείπεται και στις εντάξεις με 71,76% και με μόνο 27,25% συμβασιοποίηση.

Διάγραμμα 49. Πορεία υλοποίησης των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του ΑΠ 5 (σε εκ. €)

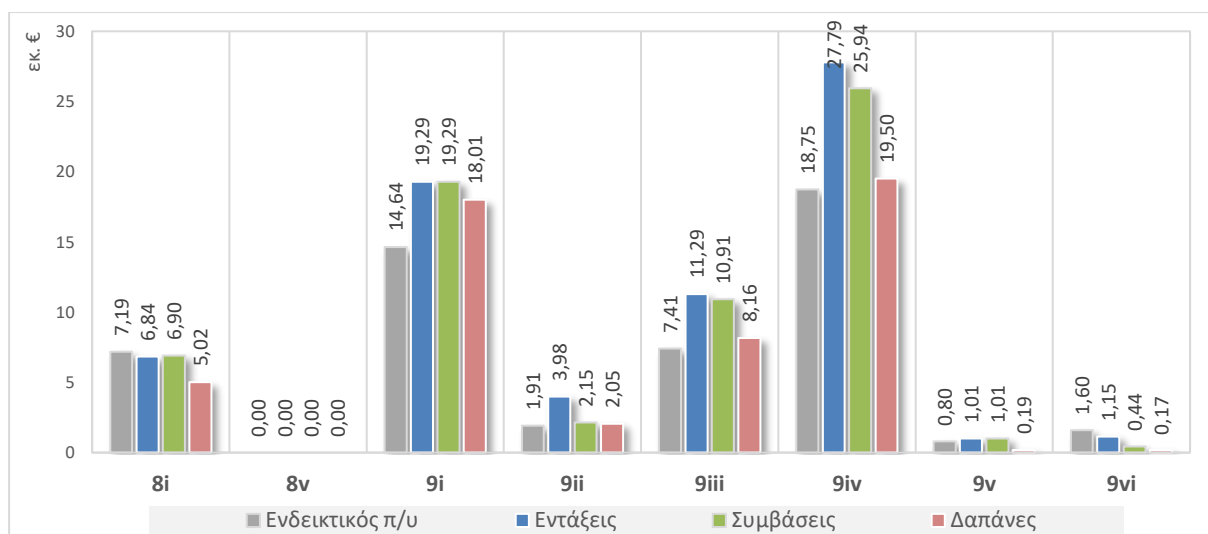

2.1.6. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ σε όρους αποτελεσματικότητας

Για τη **μέτρηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων** του Προγράμματος εφαρμόστηκε μια **προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω (bottom up)** αναγωγής του βαθμού υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, από το επίπεδο του Υποέργου στο επίπεδο του Έργου και στη συνέχεια στα υπερκείμενα προγραμματικά επίπεδα (Επενδυτική Προτεραιότητα, Θεματικός Στόχος, Άξονας Προτεραιότητας, Σύνολο Προγράμματος).

Ειδικότερα, η μεθοδολογία αυτή συνίσταται στην εκτίμηση του βαθμού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου κάθε Υποέργου και στην αναγωγή στο επίπεδο του Έργου και στη συνέχεια στα ανώτερα δομικά επίπεδα του Προγράμματος με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής στάθμισης, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη χρηματοδοτική βαρύτητα κάθε επιπέδου του Προγράμματος στο αμέσως υπερκείμενο επίπεδο (Επενδυτική Προτεραιότητα, Θεματικός Στόχος, Άξονας Προτεραιότητας, Σύνολο Προγράμματος).

Για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας αποτυπώνεται το σύνολο των ενταγμένων έργων, τα οποία αναμένεται να συνεισφέρουν με δαπάνες στο κλείσιμο του Προγράμματος (με βάση το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, Νοέμβριος 2023), ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα σε πρότυπο πίνακα υπολογισμού αποτελεσματικότητας & αποδοτικότητας, ο οποίος περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

- ▶ Άξονας Προτεραιότητας
- ▶ Θεματικός Στόχος
- ▶ Επενδυτική Προτεραιότητα
- ▶ Κωδικός & Τίτλος Έργου
- ▶ Προϋπολογισμός Ένταξης (Συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ)
- ▶ Βαρύτητα Έργου στην Επενδυτική Προτεραιότητα: προϋπολογισμός ενταγμένου έργου / συνολικός προϋπολογισμός ενταγμένων έργων της ΕπΠρ
- ▶ Δείκτης φυσικής ολοκλήρωσης ενταγμένου έργου, ο οποίος υπολογίζεται ως σταθμισμένο ποσοστό υλοποίησης των επιμέρους Υποέργων κάθε έργου. Η στάθμιση πραγματοποιείται με τη χρηματοδοτική βαρύτητα του Υποέργου στο Έργο (π/υ Υποέργου / π/υ Έργου).

Για την εκτίμηση του ποσοστού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των Υποέργων, ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης της ΕΥΔ, το προβλεπόμενο από τη σύμβαση ή το ΤΔΠ χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους Υποέργου, το είδος του Υποέργου, καθώς και η αντίστοιχη πρόοδος του οικονομικού αντικειμένου του.

Επισημαίνεται ότι, για τα τμηματοποιημένα έργα (κατάσταση 3 σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος), ο δείκτης φυσικής ολοκλήρωσης τους αναφέρεται στην α' φάση των έργων η οποία χρηματοδοτείται από το ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020.

- ▶ Σταθμισμένος Δείκτης φυσικής ολοκλήρωσης ενταγμένου έργου, ο οποίος προκύπτει από το γινόμενο του δείκτη φυσικής υλοποίησης του έργου με τη βαρύτητα του έργου, στην Επενδυτική Προτεραιότητα. Το άθροισμα των ανωτέρω σταθμισμένων δεικτών αποτελεί και το δείκτη αποτελεσματικότητας της Επενδυτικής Προτεραιότητας.

Με βάση την ανωτέρω μεθοδολογία υπολογίζεται η αποτελεσματικότητα από το επίπεδο του έργου έως το επίπεδο της Επενδυτικής Προτεραιότητας. Για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας στο επίπεδο του Θεματικού Στόχου καταρτίζεται ανάλογος πίνακας με βάση την Επενδυτική Προτεραιότητα (και όχι το έργο) ανά Θεματικό Στόχο. Στη συνέχεια με αναγωγή του δείκτη φυσικής υλοποίησης της Επενδυτικής Προτεραιότητας στο επίπεδο του Θεματικού Στόχου, με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής στάθμισης, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη χρηματοδοτική βαρύτητα της ΕπΠρ στον ΘΣ, υπολογίζονται ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Θεματικών Στόχων.

Για τον υπολογισμό της αποτελεσματικότητας στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας του Προγράμματος, καταρτίζεται ανάλογος πίνακας με βάση το Θεματικό Στόχο ανά Άξονα Προτεραιότητας. Στη συνέχεια με αναγωγή του δείκτη φυσικής υλοποίησης του ΘΣ στο επίπεδο του Άξονα Προτεραιότητας, με τη μέθοδο της χρηματοδοτικής στάθμισης, χρησιμοποιώντας δηλαδή τη χρηματοδοτική βαρύτητα του ΘΣ στον ΑΠ, υπολογίζονται ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Αξόνων Προτεραιότητας.

Αντίστοιχα, ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας του συνολικού Προγράμματος υπολογίζεται με βάση την αποτελεσματικότητα των Αξόνων Προτεραιότητας και τη σχετική χρηματοδοτική τους βαρύτητα.

Η στάθμιση της αποτελεσματικότητας στα επιμέρους δομικά επίπεδα του Προγράμματος υπολογίζεται με τους ακόλουθους τύπους:

Δομικό Επίπεδο ΕΠ	Δείκτης Αποτελεσματικότητας
Έργο	$(\Delta.Αλ.)_E = \Sigma (\Delta.Αλ.)_{YE} (\Sigma B)_{YE}$
Επενδυτική Προτεραιότητα	$(\Delta.Αλ.)_{ΕΠΠρ} = \Sigma (\Delta.Αλ.)_E (\Sigma B)_E$
Θεματικός Στόχος	$(\Delta.Αλ.)_{\Theta\Sigma} = \Sigma (\Delta.Αλ.)_{ΕΠΠρ} (\Sigma B)_{ΕΠΠρ}$
Άξονας Προτεραιότητας	$(\Delta.Αλ.)_{ΑΠ} = \Sigma (\Delta.Αλ.)_{\Theta\Sigma} (\Sigma B)_{\Theta\Sigma}$
Σύνολο ΕΠ	$(\Delta.Αλ.)_{ΕΠ} = \Sigma (\Delta.Αλ.)_{ΑΠ} (\Sigma B)_{ΑΠ}$

όπου:

- Δ.Αλ.= Δείκτης Αποτελεσματικότητας (Δείκτης φυσικής ολοκλήρωσης)
 - ΣΒ = Συντελεστής Βαρύτητας (υπολογίζεται στο αμέσως ανώτερο κατά περίπτωση δομικό επίπεδο του Προγράμματος)
- Ο συντελεστής χρηματοδοτικής βαρύτητας στα επιμέρους επίπεδα του Προγράμματος υπολογίστηκε με βάση τον προϋπολογισμό ένταξης των επιμέρους δομικών στοιχείων του Προγράμματος (Υποέργα, Έργα, Επενδυτικές Προτεραιότητες, Θεματικοί Στόχοι, Άξονες Προτεραιότητας).
- E = Έργο
 - YE = Υποέργο
 - ΕΠΠρ = Επενδυτική Προτεραιότητα
 - ΘΣ = Θεματικός Στόχος
 - ΑΠ = Άξονας Προτεραιότητας
 - ΕΠ = Επιχειρησιακό Πρόγραμμα

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί, ο συνολικός **Δείκτης αποτελεσματικότητας** του Προγράμματος ανέρχεται σε **0,9806**, τιμή η οποία εκτιμάται ως ιδιαίτερα ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη ότι αφορά το σύνολο των ενταγμένων έργων τα οποία θα συνεισφέρουν στο κλείσιμο του Προγράμματος με εκτιμώμενες δαπάνες που υπερκαλύπτουν τους διαθέσιμους πόρους (ποσοστό ολοκλήρωσης 116,3%).

Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή του Άξονα Προτεραιότητας 2, ο οποίος εμφανίζει δείκτη αποτελεσματικότητας 0,9718 και παράλληλα έχει σημαντική χρηματοδοτική βαρύτητα στο Πρόγραμμα (31,4%) και ακολουθεί ο Άξονας Προτεραιότητας 1 με δείκτη αποτελεσματικότητα 0,9865 και χρηματοδοτική βαρύτητα 22%. Υψηλή τιμή του δείκτη αποτελεσματικότητας παρουσιάζει ο ΑΠ 4 (0,9913), αλλά η επίδραση του στο συνολικό δείκτη αποτελεσματικότητας του ΕΠ είναι μειωμένη λόγω της χαμηλότερης χρηματοδοτικής του βαρύτητας (9%).


Αναλυτικότερα, ανά ΑΠ:

- ▶ Ο **ΑΠ 1** παρουσιάζει δείκτη αποτελεσματικότητας 0,9865, ο οποίος οφείλεται κυρίως στην πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικείμενου των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΘΣ 3 (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9840), τα οποία έχουν υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα σε σύνολο των εντάξεων του Άξονα (76,7%).
- ▶ Ο Δείκτης Αποτελεσματικότητας του **ΑΠ 2** ανέρχεται σε 0,9718 και οφείλεται κατά κύριο λόγο στο υψηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΘΣ 6 (0,9873), ο οποίος δεσμεύει το 57,25% του π/υ των ενταγμένων έργων του Άξονα.
- ▶ Αντίστοιχη είναι η πρόοδος υλοποίησης των έργων του **ΑΠ 3** (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9829), με τα ενταγμένα έργα του να καλύπτουν το 19,4% του π/υ των ενταγμένων έργων του Προγράμματος τα οποία θα συνεισφέρουν με δαπάνες στο κλείσιμο.
- ▶ Ο **ΑΠ 4** παρουσιάζει τον υψηλότερο δείκτη αποτελεσματικότητας (0,9913), που οφείλεται κυρίως στην σημαντική πρόοδο υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΘΣ 9 (0,9898), οι οποίες αποτελούν και το 56,3% του συνολικού π/υ των ενταγμένων έργων στον Άξονα. Αντίστοιχα υψηλή πρόοδο υλοποίησης παρουσιάζουν και οι παρεμβάσεις του ΘΣ 10 (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9938) με χρηματοδοτική βαρύτητα 43,7%.
- ▶ Ο **ΑΠ 5** παρουσιάζει τον 3^ο υψηλότερο δείκτη αποτελεσματικότητας στο Πρόγραμμα (0,9840), τιμή η οποία οφείλεται κυρίως στην πρόοδο υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΘΣ 9 που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9840), οι οποίες έχουν υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα (90,42%).
- ▶ Οι **ΑΠ 6 και 7** που αφορούν στην Τεχνική Βοήθεια, έχουν **περιορισμένη χρηματοδοτική βαρύτητα**, με αποτέλεσμα η συγκριτικά χαμηλότερη αποτελεσματικότητα του ΑΠ 7 (0,9575) και η ακόμα χαμηλότερη αποτελεσματικότητα του ΑΠ 6 (0,8247) **να μην επηρεάζουν σημαντικά την συνολική πορεία του Προγράμματος.**

Πίνακας 10. Αποτελεσματικότητα ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ανά ΑΠ

ΑΠ	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές Δικαιούχου	Πληρωμές (Συγχρ. ΔΔ)	Βαρύτητα ΑΠ	Δείκτης Αποτελεσμ. ΑΠ	Σταθμισμένος Δείκτης Αποτελεσμ. ΑΠ / ΕΠ
ΑΠ 1	93.962.464	93.955.791	77.895.909	60.727.743	22,0%	0,9865	0,2167
ΑΠ 2	134.281.084	129.378.471	101.565.502	100.722.295	31,4%	0,9718	0,3051
ΑΠ 3	83.197.061	68.275.349	28.825.902	28.447.472	19,4%	0,9829	0,1912
ΑΠ 4	38.420.994	37.275.761	33.348.899	33.240.481	9,0%	0,9913	0,0890
ΑΠ 5	71.346.902	66.631.595	56.062.787	53.120.369	16,7%	0,9840	0,1641
ΑΠ 6	322.962	125.380	93.976	93.976	0,1%	0,8247	0,0006
ΑΠ 7	6.224.912	4.541.041	3.848.200	3.848.200	1,5%	0,9575	0,0139
ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ	427.756.379	400.183.389	301.641.176	280.200.537	100,0%		0,9806

Διάγραμμα 50. Δείκτης Αποτελεσματικότητας ΑΠ / ΕΠ

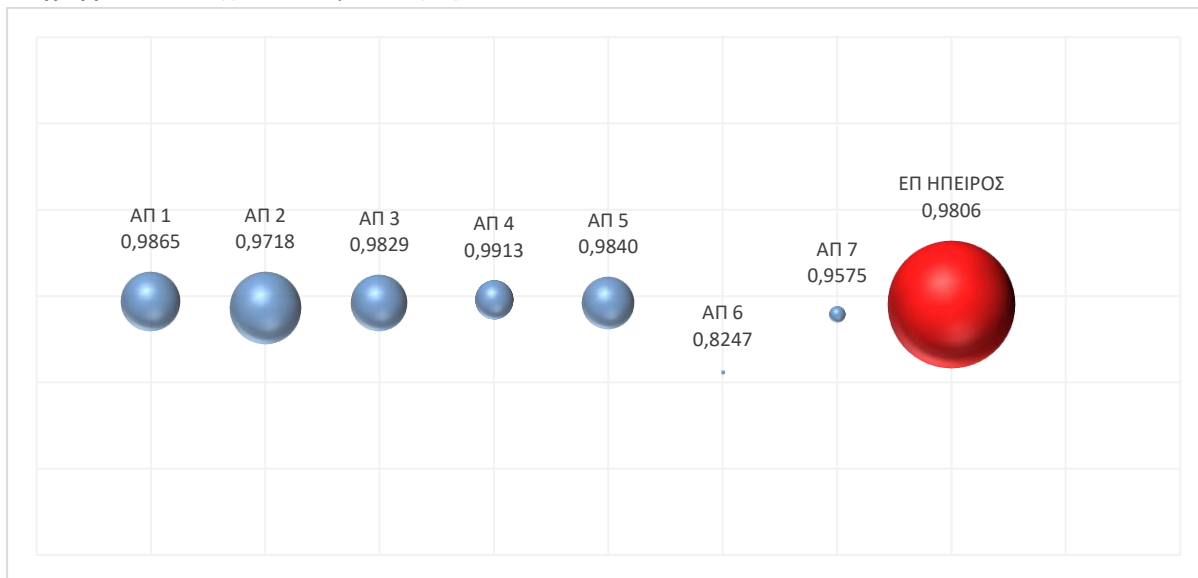

Εξετάζοντας το Δείκτη Αποτελεσματικότητας στο επίπεδο των Θεματικών Στόχων προκύπτουν τα ακόλουθα:


- Την υψηλότερη συγκριτικά πρόοδο υλοποίησης φυσικού αντικείμενου παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις του ΘΣ 2 (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9963) και ακολουθούν οι παρεμβάσεις του ΘΣ 10 (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9975) και του ΘΣ 1 (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9929). Η υψηλή αποτελεσματικότητα του ΘΣ 2 δεν επηρεάζει σημαντικά την συνολική πορεία του Προγράμματος, δεδομένης της χαμηλής χρηματοδοτικής βαρύτητας του στο συνολικό π/υ των ενταγμένων έργων (2,4%), ενώ αντίστοιχα μικρή είναι σημαντικότερη και η συμβολή των ΘΣ 10 & 1, με χρηματοδοτική βαρύτητα 3,9% & 2,7% αντίστοιχα.
- Η αποτελεσματικότητα του ΕΠ επηρεάζεται σε σημαντικό βαθμό από την πρόοδο υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΘΣ 7 (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9829), λόγω της υψηλής χρηματοδοτικής βαρύτητας τους στο συνολικό π/υ των ενταγμένων έργων (19,4%) και ακολουθεί η επίδραση του ΘΣ 6 με υψηλότερο δείκτη αποτελεσματικότητας (0,9873), αλλά λίγο χαμηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα στο συνολικό π/υ των ενταγμένων έργων (18%).
- Το χαμηλότερο δείκτη αποτελεσματικότητας σε επίπεδο ΘΣ, με εξαίρεση την Τεχνική Βοήθεια, παρουσιάζουν ο ΘΣ 5, με δείκτη αποτελεσματικότητας 0,9345 και ο ΘΣ 4, με δείκτη αποτελεσματικότητας 0,9560.
- Τρίτο χαμηλότερο δείκτη αποτελεσματικότητας παρουσιάζει ο ΘΣ 7 (0,9829) και ακολουθεί ο ΘΣ 8 (0,9839).

Πίνακας 11. Αποτελεσματικότητα ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ανά ΘΣ

ΑΠ	ΘΣ	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές Δικαιούχου	Πληρωμές (Συγχρ. ΔΔ)	Βαρύτητα ΘΣ στον ΑΠ	Δείκτης Αποτελ. ΘΣ	Σταθμισμένος Δείκτης Αποτελ. ΘΣ / ΑΠ
ΑΠ 1	ΘΣ1	11.675.239	11.706.467	6.841.180	4.938.678	12,43%	0,9929	0,1234
	ΘΣ2	10.221.607	10.183.707	7.653.513	5.929.768	10,88%	0,9963	0,1084
	ΘΣ3	72.065.617	72.065.617	63.401.217	49.859.296	76,70%	0,9840	0,7547
ΑΠ 1 Σύνολο		93.962.464	93.955.791	77.895.909	60.727.743	100,00%		0,9865
ΑΠ 2	ΘΣ4	44.184.343	42.577.119	28.212.981	28.094.970	32,90%	0,9560	0,3146
	ΘΣ5	13.214.730	11.729.169	9.028.332	9.016.944	9,84%	0,9345	0,0920
	ΘΣ6	76.882.011	75.072.183	64.324.189	63.610.381	57,25%	0,9873	0,5653
ΑΠ 2 Σύνολο		134.281.084	129.378.471	101.565.502	100.722.295	100,00%		0,9718
ΑΠ 3	ΘΣ7	83.197.061	68.275.349	28.825.902	28.447.472	100,00%	0,9829	0,9829

ΑΠ	ΘΣ	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές Δικαιούχου	Πληρωμές (Συγχρ. ΔΔ)	Βαρύτητα ΘΣ στον ΑΠ	Δείκτης Αποτελ. ΘΣ	Σταθμισμένος Δείκτης Αποτελ. ΘΣ / ΑΠ
ΑΠ 3 Σύνολο		83.197.061	68.275.349	28.825.902	28.447.472	100,00%		0,9829
ΑΠ 4	ΘΣ10	16.790.169	16.489.938	14.135.039	14.360.293	43,70%	0,9938	0,4343
	ΘΣ9_ΕΤΠΑ	21.630.824	20.785.823	19.213.861	18.880.188	56,30%	0,9893	0,5570
ΑΠ 4 Σύνολο		38.420.994	37.275.761	33.348.899	33.240.481	100,00%		0,9913
ΑΠ 5	ΘΣ8	6.836.724	6.903.360	6.696.836	5.023.807	9,58%	0,9839	0,0943
	ΘΣ9_ΕΚΤ	64.510.178	59.728.235	49.365.951	48.096.562	90,42%	0,9840	0,8897
ΑΠ 5 Σύνολο		71.346.902	66.631.595	56.062.787	53.120.369	100,00%		0,9840
ΑΠ 6	TB - ΕΚΤ	322.962	125.380	93.976	93.976	100,00%	0,8247	0,8247
	ΑΠ 6 Σύνολο	322.962	125.380	93.976	93.976	100,00%		0,8247
ΑΠ 7	TB - ΕΤΠΑ	6.224.912	4.541.041	3.848.200	3.848.200	100,00%	0,9575	0,9575
	ΑΠ 7 Σύνολο	6.224.912	4.541.041	3.848.200	3.848.200	100,00%		0,9575

Διάγραμμα 51. Δείκτης Αποτελεσματικότητας ΘΣ/ΕΠ

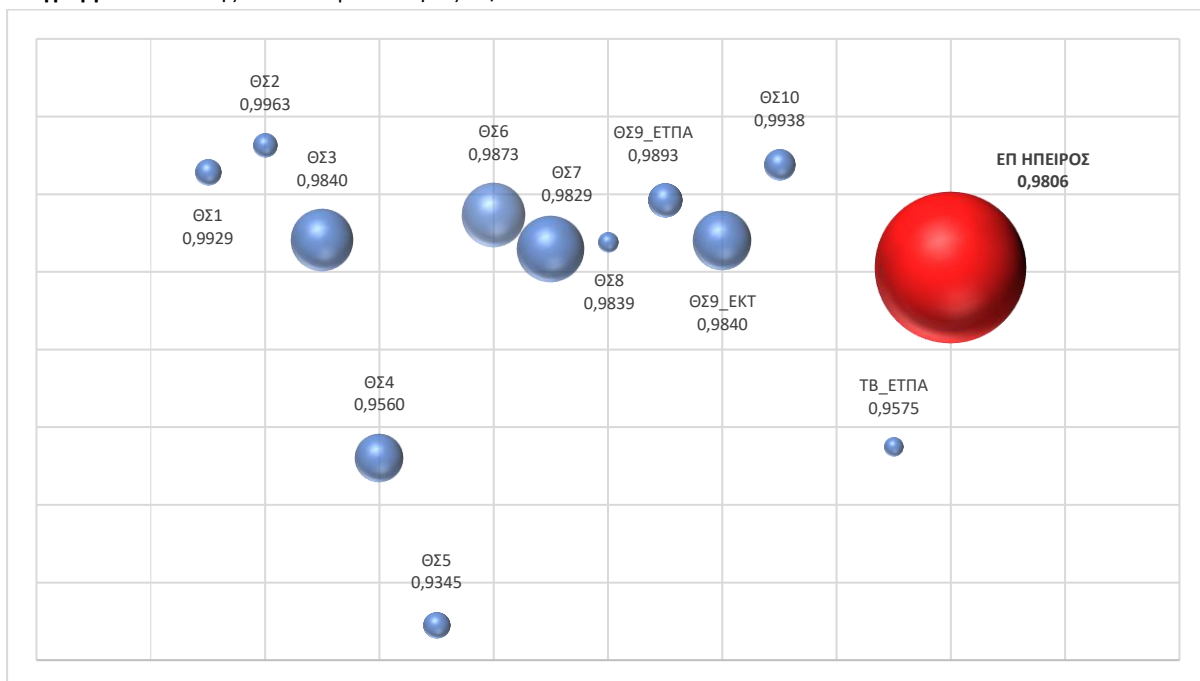

Αναλύοντας το Δείκτη Αποτελεσματικότητας σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας προκύπτουν τα εξής:

- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 1b παρουσιάζει ιδιαίτερα ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9929), δεδομένου ότι από τα 45 σχέδια ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση ερευνητικών έργων στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 44/2017 το Σεπτέμβριο του 2018, τα 39 επενδυτικά σχέδια έχουν ολοκληρωθεί και τα υπόλοιπα 6 είναι σε φάση ολοκλήρωσης.
- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 2b παρουσιάζει δείκτη αποτελεσματικότητας ίσο με 1, δεδομένου ότι τόσο τα 102 επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ στις τοπικές επιχειρήσεις, τα οποία εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 58/2018 (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ebusiness), όσο και τα 572 επενδυτικά σχέδια στο πλαίσιο της πρόσκλησης 80/2019 (Ηλεκτρονικό Επιχειρείν ebusiness II) έχουν ολοκληρωθεί.
- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 2c παρουσιάζει ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9881), δεδομένου ότι από τις 19 πράξεις που εντάχθηκαν στο πλαίσιο των προσκλήσεων 56/2018, 57/2018 και 64/2018, έχουν ολοκληρωθεί 16 έργα που αφορούν στην ανάπτυξη

και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους ΟΤΑ, 1 έργο είναι σε φάση ολοκλήρωσης, ενώ 2 έργα στα οποία παρουσιάστηκαν νομικές εμπλοκές έχουν χαρακτηριστεί με βάση το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, ως έργα κατάστασης 5 «προς απένταξη» και δεν θα συμμετέχουν στο κλείσιμο του ΕΠ.

- Σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης παρουσιάζει η Επενδυτική Προτεραιότητα 3a (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9301), δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί τα 11 από τα 18 επενδυτικά σχέδια ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 60/2018, καθώς και 3 επενδυτικά σχέδια της πρόσκλησης 82/2019 που εντάχθηκαν στο τέλος του 2021, ενώ τα υπόλοιπα έργα είναι σε φάση ολοκλήρωσης.
- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 3b παρουσιάζει υψηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9857) με βάση την αντίστοιχη πρόοδο υλοποίησης των 2 επενδυτικών σχεδίων που αφορούν στην εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και εντάχθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 77/2019 τον Μάρτιο του 2020.
- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 3c παρουσιάζει υψηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9969), το οποίο οφείλεται κατά κύριο λόγο στην πρόοδο της δράσης ενίσχυσης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19, με υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα στο σύνολο του π/υ των ενταγμένων έργων της ΕπΠρ (78,81%), ενώ σημαντική είναι και η συμβολή της δράσης χρηματοδότησης επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ηπείρου μέσω του ΤΕΠΙΧ II, με χρηματοδοτική βαρύτητα στο σύνολο του π/υ των ενταγμένων έργων 12,56%.
- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 4c παρουσιάζει ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9593). Στη διαμόρφωση του δείκτη συμβάλει η πρόοδος υλοποίησης των δράσεων αναβάθμισης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα που ενεργοποιήθηκαν με την πρόσκληση 53/2018 (το φυσικό αντικείμενο έχει ολοκληρωθεί), οι οποίες όμως έχουν χαμηλή χρηματοδοτική βαρύτητα (14,49%), καθώς και η πρόοδος υλοποίησης της δράσης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα – Γ' Κύκλος», η οποία παρουσιάζει ικανοποιητική υλοποίηση (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,95) και έχει υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα (81,16%). Από τα υπόλοιπα 3 ενταγμένα έργα ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια που εντάχθηκαν στο πλαίσιο της πρόσκλησης 72/2018, τα 2 έχουν ολοκληρωθεί και 1 είναι σε φάση ολοκλήρωσης (δείκτης αποτελεσματικότητας από 0,9932).
- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 4e παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9485), το οποίο διαμορφώνεται από τη συμβολή 18 ολοκληρωμένων έργων (ως προς το φυσικό αντικείμενο) των προσκλήσεων 14/2016, 15/2016, 35/2016, 81/2019 και 102/2020, με αθροιστική χρηματοδοτική βαρύτητα στον π/υ εντάξεων 48,87% καθώς και την πρόοδο υλοποίησης των υπόλοιπων έργων η οποία κυμαίνεται μεταξύ 75% - 98%.
- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 5b παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9345). Στη διαμόρφωση του δείκτη συμβάλει κυρίως η ολοκλήρωση της πράξης «Έργα διευθέτησης ρέματος Λάκκας» με χρηματοδοτική βαρύτητα 14,09%, καθώς και η πρόοδος υλοποίησης της πράξης «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,8452) με χρηματοδοτική βαρύτητα 16%.
- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 6b παρουσιάζει ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9965). Στη διαμόρφωση του δείκτη συμβάλουν κυρίως 8 ολοκληρωμένες πράξεις που αφορούν σε δράσεις επενδύσεων στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό), καθώς και 4 ολοκληρωμένα έργα διαχείρισης λυμάτων, ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της πράξης «Έργα συλλογής μεταφοράς επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων για την εξυπηρέτηση των οικισμών Συβότων Πλαταριάς Πέρδικας και Αρίλλα Δήμου Ηγουμενίτσας», με δείκτη αποτελεσματικότητας 0,9973 και χρηματοδοτική βαρύτητα 24,67%, καθώς και της πράξης «Έργα συλλογής μεταφοράς επεξεργασίας και

διάθεσης λυμάτων του πρώην Δήμου Ζαλόγγου νυν Δήμος Πρέβεζας και οικισμών Λούτσας και παραλίας Λούτσας Δήμου Πάργας Περιφέρειας Ηπείρου», με δείκτη αποτελεσματικότητας 0,9966 και χρηματοδοτική βαρύτητα 28,02%.


- ο Η Επενδυτική Προτεραιότητα 6c παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9693). Στη διαμόρφωση του δείκτη συμβάλει κυρίως η πρόοδος υλοποίησης 4 ενταγμένων έργων ανάδειξης της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος, που έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 13/2015, με υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα (73,95%).
- ο Η Επενδυτική Προτεραιότητα 6d παρουσιάζει δείκτη αποτελεσματικότητας 1, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί και οι 5 ενταγμένες πράξεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης 48/2017 «Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου».
- ο Η Επενδυτική Προτεραιότητα 6e παρουσιάζει σχετικά ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9636). Στη διαμόρφωση του δείκτη συμβάλει με την υψηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα (27%) η πράξη «Διασύνδεση ανάπλαση αναβάθμιση και ανάδειξη κοινόχρηστων χώρων υφιστάμενου δικτύου πεζόδρομων κοινόχρηστων οδών και πλατειών στο Κάστρο Ιωαννίνων», το φυσικό αντικείμενο της οποίας έχει ολοκληρωθεί, ενώ σημαντική στη διαμόρφωση του δείκτη είναι και η συμβολή της ολοκληρωμένης πράξης «Αναπλάσεις στο ιστορικό κέντρο της πόλης των Ιωαννίνων».
- ο Η Επενδυτική Προτεραιότητα 7b παρουσιάζει ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9829). Στη διαμόρφωση του δείκτη συμβάλει κυρίως η πρόοδος υλοποίησης των πράξεων «ΟΔΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ ΝΙΑΡΧΟΥ» & «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΔΑΚΤΥΛΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΚΟΜΒΟΣ ΠΑΝΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΟΜΒΟΣ ΒΟΓΙΑΝΟΥ».
- ο Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9a παρουσιάζει υψηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9914), δεδομένου ότι 15 από τα 17 ενταγμένα έργα έχουν ολοκληρωθεί, μεταξύ των οποίων και το έργο «ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΕΝΤΑΟΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» με υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα (60,09%).
- ο Η Επενδυτική Προτεραιότητα 10a παρουσιάζει υψηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9938). Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται κυρίως από 4 ολοκληρωμένα έργα, με υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα στο σύνολο των ενταγμένων έργων (52,21%), καθώς και από το υψηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης του έργου «Εξοπλισμός Εργαστηρίων Πανεπιστημίου Ιωαννίνων» (0,9931), το οποίο έχει υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα (18,64%).
- ο Η Επενδυτική Προτεραιότητα 8i παρουσιάζει ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9839), λόγω της προόδου υλοποίησης των 261 πράξεων που αφορούν στην απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 79/2019.
- ο Οι Επενδυτικές Προτεραιότητες 9i, 9ii & 9iii παρουσιάζουν δείκτη αποτελεσματικότητας 1, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά ενταγμένα έργα τους.
- ο Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv παρουσιάζει ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9876). Η τιμή του δείκτη διαμορφώνεται από τις 32 ολοκληρωμένες πράξεις (από σύνολο 34).
- ο Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9v παρουσιάζει ικανοποιητικό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,9757). Στη διαμόρφωση του δείκτη συμβάλλουν κυρίως 10 ολοκληρωμένες πράξεις με υψηλή χρηματοδοτική βαρύτητα (75,67%)

- Η Επενδυτική Προτεραιότητα 9νι παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλό ποσοστό φυσικής υλοποίησης (δείκτης αποτελεσματικότητας 0,42). Στη διαμόρφωση του δείκτη συμβάλλουν κυρίως 5 ολοκληρωμένες πράξεις με χρηματοδοτική βαρύτητα 35,71%.

Πίνακας 12. Αποτελεσματικότητα ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ανά ΕπΠρ/ΟΣ

ΑΠ	ΘΣ	ΕπΠρ	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές Δικαιούχου	Πληρωμές (Συγχρ. ΔΔ)	Βαρύτητα ΕπΠρ	Δείκτης Αποτελεσμ. ΕπΠρ	Σταθμ. Δείκτης Αποτελ. ΕπΠρ / ΘΣ
1	1	1b	11.675.239,03	11.706.466,65	6.841.180,16	4.938.678,11	100,00%	0,9929	0,9929
	ΘΣ 1 Σύνολο		11.675.239,03	11.706.466,65	6.841.180,16	4.938.678,11	100,00%		0,9929
	2	2b	7.024.501,02	7.024.501,02	6.874.084,94	5.150.340,77	68,72%	1,0000	0,6872
	2	2c	3.197.106,36	3.159.206,36	779.427,70	779.427,70	31,28%	0,9881	0,3091
	ΘΣ 2 Σύνολο		10.221.607,38	10.183.707,38	7.653.512,64	5.929.768,47	100,00%		0,9963
	3	3a	13.843.283,00	13.843.283,00	6.630.952,31	5.361.178,11	19,21%	0,9301	0,1787
	3	3b	116.700,00	116.700,00	78.394,63	78.394,63	0,16%	0,9857	0,0016
	3	3c	58.105.634,19	58.105.634,19	56.691.869,62	44.419.723,71	80,63%	0,9969	0,8038
ΘΣ 3 Σύνολο			72.065.617,19	72.065.617,19	63.401.216,56	49.859.296,45	100,00%		0,9840
2	4	4c	30.803.091,94	30.244.458,82	23.458.752,83	23.340.741,32	69,71%	0,9593	0,6688
	4	4e	13.381.250,87	12.332.660,29	4.754.228,40	4.754.228,40	30,29%	0,9485	0,2872
	ΘΣ 4 Σύνολο		44.184.342,81	42.577.119,11	28.212.981,23	28.094.969,72	100,00%		0,9560
	5	5b	13.214.730,09	11.729.168,76	9.028.331,75	9.016.944,31	100,00%	0,9345	0,9345
	ΘΣ 5 Σύνολο		13.214.730,09	11.729.168,76	9.028.331,75	9.016.944,31	100,00%		0,9345
	6	6b	52.317.287,84	51.917.257,48	46.765.380,56	46.129.198,33	68,05%	0,9965	0,6781
	6	6c	15.285.099,41	14.623.271,67	11.501.003,32	11.424.335,50	19,88%	0,9693	0,1927
	6	6d	395.702,44	395.441,52	396.086,32	395.441,52	0,51%	1,0000	0,0051
ΘΣ 6 Σύνολο			76.882.010,88	75.072.183,23	64.324.189,30	63.610.381,19	100,00%		0,9873
3	7	7b	83.197.061,41	68.275.349,20	28.825.901,75	28.447.472,19	100,00%	0,9829	0,9829
	ΘΣ 7 Σύνολο		83.197.061,41	68.275.349,20	28.825.901,75	28.447.472,19	100,00%		0,9829
4	9	9a	21.130.824,41	20.406.791,85	19.213.860,53	18.880.187,85	97,69%	0,9914	0,9685
	9	9b	500.000,00	379.031,26	0,00	0,00	2,31%	0,9000	0,0208
	ΘΣ 9 Σύνολο		21.630.824,41	20.785.823,11	19.213.860,53	18.880.187,85	100,00%		0,9893
	10	10a	16.790.169,27	16.489.938,25	14.135.038,50	14.360.292,83	100,00%	0,9938	0,9938
ΘΣ 10 Σύνολο			16.790.169,27	16.489.938,25	14.135.038,50	14.360.292,83	100,00%		0,9938
5	8	8i	6.836.724,00	6.903.360,00	6.696.836,05	5.023.806,81	100,00%	0,9839	0,9839
	ΘΣ 8 Σύνολο		6.836.724,00	6.903.360,00	6.696.836,05	5.023.806,81	100,00%		0,9839
	9	9i	19.287.864,64	19.287.864,64	19.255.763,14	18.014.403,05	29,90%	1,0000	0,2990
	9	9ii	3.981.407,70	2.147.326,28	2.068.278,45	2.052.437,13	6,17%	1,0000	0,0617
	9	9iii	11.292.261,91	10.912.504,28	8.164.170,31	8.157.770,31	17,50%	1,0000	0,1750
	9	9iv	27.791.903,86	25.935.911,91	19.510.088,27	19.504.301,04	43,08%	0,9876	0,4255
	9	9v	1.008.623,98	1.008.623,98	192.707,75	192.707,75	1,56%	0,9757	0,0153
	9	9vi	1.148.116,00	436.004,00	174.943,19	174.943,19	1,78%	0,4200	0,0075
ΘΣ 9 Σύνολο			64.510.178,09	59.728.235,09	49.365.951,11	48.096.562,47	100,00%		0,9840
6	TB	TB-EKT	322.962,00	125.379,89	93.976,13	93.976,13	100,00%	0,8247	0,8247
	TB EKT Σύνολο		322.962,00	125.379,89	93.976,13	93.976,13	100,00%		0,8247
7	TB	TB-ΕΤΠΑ	6.224.912,32	4.541.040,82	3.848.200,19	3.848.200,19	100,00%	0,9575	0,9575
	TB ΕΤΠΑ Σύνολο		6.224.912,32	4.541.040,82	3.848.200,19	3.848.200,19	100,00%		0,9575

Διάγραμμα 52. Δείκτης Αποτελεσματικότητας ΕπΠρ/ΕΠ

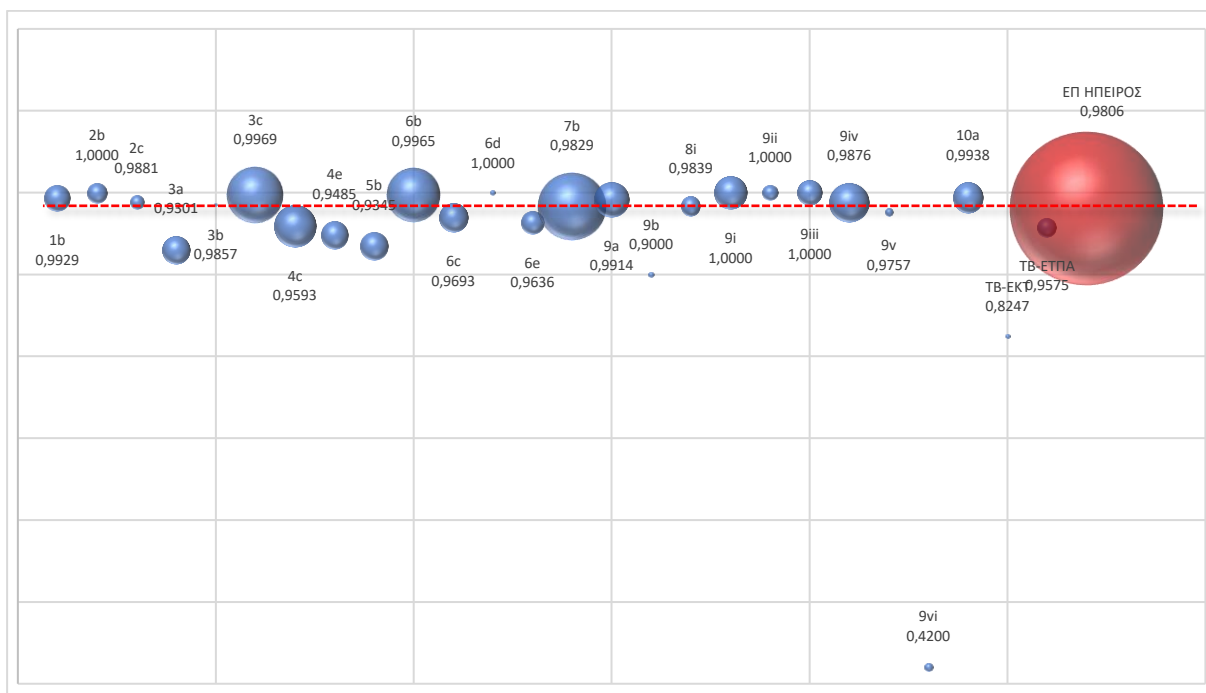

2.2. Αξιολόγηση της προόδου και της δυνατότητας επίτευξης των στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΤΠΑ

2.2.1. Αποτίμηση της προόδου επίτευξης των στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΤΠΑ (ανά Επενδυτική Προτεραιότητα)

2.2.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΤΠΑ του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2021), τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης για το 2022 και στοιχεία από το ΟΠΣ έως τον Νοέμβριο του 2023, που αφορούν στις εντάξεις πράξεων και τους αντίστοιχους δείκτες.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 1 παρουσιάζει υλοποίηση στην πλειοψηφία των δεικτών του, σε συνέχεια της ένταξης και ολοκλήρωσης έργων που τροφοδοτούν την τιμή τους. Εξάιρεση αποτελούν οι δείκτες των επενδυτικών προτεραιοτήτων 1a και 3b, οι οποίοι αν και έχουν ενεργοποιηθεί με την ένταξη σχετικών πράξεων, σημειώνουν μηδενική υλοποίηση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια από τις πράξεις αυτές.

Θεματικός Στόχος 1

Επενδυτική Προτεραιότητα 1a

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται	SO033	Αριθμός	1	0

SO033: Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας για την ανάπτυξη της αριστείας και τη βελτίωση της δικτύωσής τους με τον ελληνικό και διεθνή χώρο. Η τιμή στόχος του δείκτη είναι 1 και ενεργοποιήθηκε με την Πρόσκληση 106/2020. Στον δείκτη συμβάλλει 1 ενταγμένη πράξη με στόχο 1 υποδομή. Ο δείκτης παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση, καθώς η ανωτέρω πράξη δεν έχει ολοκληρωθεί και σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης της ΕΥΔ θα μεταφερθεί στην ΠΠ 2021-2027.

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα	CO26	Επιχειρήσεις	60	12

CO26: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση ερευνητικών έργων στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 44/2017. Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης πρόσκλησης εντάχθηκαν 45 επενδυτικά σχέδια, στα οποία συμμετέχουν 70 επιχειρήσεις. Η τιμή στόχου του δείκτη είναι 60 και παρουσιάζει υλοποίηση 12 επιχειρήσεις, η οποία προέρχεται από 9 πράξεις.

Σημειώνεται ότι σε ένα επενδυτικό σχέδιο (mis 5033107) δεν έχει καταχωρηθεί ο δείκτης στο ΟΠΣ, με αποτέλεσμα οι ενταγμένες πράξεις που συμβάλλουν στο δείκτη να εμφανίζονται 44 αντί 45.

Πρόσθετος Δείκτης εκροών CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο δείκτης CO02 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 1b και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 44/2017, με στόχο της πρόσκλησης 30 επιχειρήσεις. Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση ερευνητικών έργων στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας,

ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας και σε αυτό συμβάλλουν 45 επενδυτικά σχέδια, στα οποία συμμετέχουν 70 επιχειρήσεις. Δηλαδή, ο στόχος των ενταγμένων έργων υπερκαλύπτει τον στόχο της πρόσκλησης. Η υλοποίηση του δείκτη είναι 12 επιχειρήσεις και προέρχεται από 9 ολοκληρωμένες πράξεις.

Θεματικός Στόχος 2

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	CO01	Επιχειρήσεις	654	674
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	CO02	Επιχειρήσεις	654	674

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ στις τοπικές επιχειρήσεις και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 58/2018 και 80/2019. Η τιμή στόχος του δείκτη είναι 654. Στο δείκτη συμβάλλουν 674 ενταγμένες πράξεις με τιμή στόχο 674 επιχειρήσεις. Από τις ανωτέρω πράξεις ολοκληρώθηκαν 102 επενδυτικά σχέδια της πρόσκλησης "ηλεκτρονικό επιχειρείν" και 550 επενδυτικά σχέδια, σε συνέχεια της πρόσκλησης "ηλεκτρονικό επιχειρείν II" έως το τέλος του 2022. Τον Νοέμβριο του 2023 η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 674 επιχειρήσεις, με την ολοκλήρωση του συνόλου των πράξεων που συμβάλλουν σε αυτόν.

CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ στις τοπικές επιχειρήσεις και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 58/2018 και 80/2019. Η τιμή στόχος του δείκτη είναι 654. Στο δείκτη συμβάλλουν 674 ενταγμένες πράξεις με τιμή στόχο 674 επιχειρήσεις. Από τις ανωτέρω πράξεις ολοκληρώθηκαν 102 επενδυτικά σχέδια της πρόσκλησης "ηλεκτρονικό επιχειρείν" και 550 επενδυτικά σχέδια, σε συνέχεια της πρόσκλησης "ηλεκτρονικό επιχειρείν II" έως το τέλος του 2022. Τον Νοέμβριο του 2023 η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 674 επιχειρήσεις, με την ολοκλήρωση του συνόλου των πράξεων που συμβάλλουν σε αυτόν.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2c

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται	SO007	Αριθμός	28	38

SO007: Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους ΟΤΑ, την ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities) και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα μνημεία της Περιφέρειας. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 56/2018, 57/2018 και 64/2018 και την ένταξη 19 πράξεων, μέσω των οποίων θα υλοποιηθούν 45 ψηφιακές υπηρεσίες/συστήματα. Ο δείκτης έχει τιμή στόχο 28 και η υλοποίησή του ανέρχεται σε 38, με την ολοκλήρωση 13 σχετικών πράξεων.

Σημειώνεται ότι σε δύο πράξεις (mis 5038178 και 5041527) δεν έχει καταχωρηθεί ο δείκτης στο ΟΠΣ, με αποτέλεσμα οι ενταγμένες πράξεις που συμβάλλουν στο δείκτη να εμφανίζονται 17 αντί 19 και η τιμή υλοποίησης 32 αντί 38.

Πρόσθετος δείκτης εκροών T1603: Εφαρμογές για τη διαχείριση δικτύων και υποδομών (αριθμός)

Ο δείκτης T1603 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 2c και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 56/2018, 57/2018 και 64/2018, με συνολικό στόχο των προσκλήσεων 12 εφαρμογές. Αφορά σε δράσεις για την ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους ΟΤΑ, την ανάπτυξη Έξυπνης Πλατφόρμας Τοπικής Αυτοδιοίκησης (smart cities) και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών στα μνημεία της Περιφέρειας. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 19 ενταγμένες πράξεις, των οποίων ο συνολικός στόχος ανέρχεται σε 45 εφαρμογές και υπερκαλύπτει τον στόχο των προσκλήσεων. Η υλοποίηση του δείκτη έως τον Νοέμβριο του 2023 είναι 34 εφαρμογές.

Θεματικός Στόχος 3

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	CO01	Επιχειρήσεις	18	11
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται	CO08	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	18	17,46
Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά	CO28	Επιχειρήσεις	18	11

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη δημιουργική βιομηχανία, την υγεία – ευεξία, τις ΤΠΕ και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 60/2018, 61/2018 και 82/2019. Στον δείκτη συμβάλουν 54 επενδυτικά σχέδια. Ο δείκτης έχει προγραμματική τιμή στόχου 18 επιχειρήσεις και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 11 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 7 ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2023.

Σημειώνεται ότι σε ένα επενδυτικό σχέδιο (mis 5049456) έχει καταχωρηθεί εκ παραδρομής στο ΟΠΣ λανθασμένη τιμή στόχου του δείκτη (15 αντί 1), με αποτέλεσμα ο συνολικός στόχος των ενταγμένων να προκύπτει πολύ μεγαλύτερος από τον πραγματικό, ενώ σε άλλα δύο επενδυτικά (mis 5049452 και 5158580) έχει καταχωρηθεί τιμή στόχου 0 αντί 1.

CO08: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη δημιουργική βιομηχανία, την υγεία – ευεξία, τις ΤΠΕ και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 60/2018, 61/2018 και 82/2019. Στον δείκτη συμβάλουν 54 επενδυτικά σχέδια, από τα οποία προκύπτει συνολικός στόχος αύξησης της απασχόλησης ίσος με 96,55 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Ο δείκτης έχει προγραμματική τιμή στόχου 18 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 17,46, που προέρχεται από 8 επενδυτικά σχέδια που έχουν ολοκληρωθεί έως τον Νοέμβριο του 2023.

CO28: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις υποστήριξης νέων και υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, κυρίως στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση, τον τουρισμό, τον πολιτισμό, τη δημιουργική βιομηχανία, την υγεία – ευεξία, τις ΤΠΕ και τη νεανική επιχειρηματικότητα. Στον δείκτη συμβάλουν 54 επενδυτικά σχέδια. Ο δείκτης έχει προγραμματική τιμή στόχου 18 επιχειρήσεις και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 11 επιχειρήσεις, εκ των οποίων οι 7 ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2023.

Σημειώνεται ότι σε ένα επενδυτικό σχέδιο (mis 5049456) έχει καταχωρηθεί εκ παραδρομής στο ΟΠΣ λανθασμένη τιμή στόχου του δείκτη (15 αντί 1), με αποτέλεσμα ο συνολικός στόχος των ενταγμένων να προκύπτει πολύ μεγαλύτερος από τον πραγματικό, ενώ σε άλλα τρία επενδυτικά (mis 5049452, 5158579 και 5158580) έχει καταχωρηθεί τιμή στόχου 0 αντί 1.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3b

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	CO01	Επιχειρήσεις	1	0
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	CO02	Επιχειρήσεις	1	0
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	CO08	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	1	0

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 77/2019. Στην επίτευξη του δείκτη συμβάλλουν 2 επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάχθηκαν το 2020 και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 1 και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση.

CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 77/2019. Στην επίτευξη του δείκτη συμβάλλουν 2 επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάχθηκαν το 2020 και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 1 και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση.

CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 77/2019. Στην επίτευξη του δείκτη συμβάλλουν 2 επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάχθηκαν το 2020 και δεν έχουν ολοκληρωθεί και από τα οποία προκύπτει συνολικός στόχος αύξησης της απασχόλησης ίσος με 3,20 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 1 και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	CO01	Επιχειρήσεις	3.550	4.223
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	CO02	Επιχειρήσεις	3.400	4.076
Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	CO03	Επιχειρήσεις	150	147
Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	CO08	Ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης	50	7,64
Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19	CV20	Ευρώ	37.700.000,00	45.778.155,89

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19	CV21	Ευρώ	4.350.000,00	5.025.117,12
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19	CV22	Επιχειρήσεις	3.350	4.050
Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19	CV23	Επιχειρήσεις	120	118

CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και στη δράση συμμετοχής του ΠΕΠ στη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 097, 74/2018 και 105/2020, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν 4.101 πράξεις με συνολική τιμή στόχου 4.250 επιχειρήσεις. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 3.550 επιχειρήσεις και η τιμή υλοποίησής του ανέρχεται σε 4.223, η οποία οφείλεται στην χρηματοδότηση 147 επιχειρήσεων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (mis 5027213), 25 επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 74/2018 και 4.051 επιχειρήσεων από την πρόσκληση 105/2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».

Σημειώνεται ότι σε ένα επενδυτικό σχέδιο (mis 5060743) έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ λανθασμένη τιμή στόχου του δείκτη (0 αντί 1), με αποτέλεσμα ο συνολικός στόχος των ενταγμένων να προκύπτει μικρότερος από τον πραγματικό.

CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ο δείκτης έχει τιμή στόχο 3.400 και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 74/2018 και 105/2020, στο πλαίσιο των οποίων εντάχθηκαν 4.100 πράξεις με συνολική τιμή στόχου 4.100 επιχειρήσεις. Η τιμή υλοποίησής του δείκτη είναι 4.076 και προέρχεται από την ολοκλήρωση 25 επιχειρήσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης 74/2018 και 4.051 επιχειρήσεων της πρόσκλησης 105/2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ».

CO03: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων

Ο δείκτης συνδέεται με τη δράση συμμετοχής του ΠΕΠ στη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 097. Έχει προγραμματική τιμή στόχου 150 και η τιμή υλοποίησής του ανέρχεται σε 147, η οποία οφείλεται στην χρηματοδότηση 147 επιχειρήσεων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (mis 5027213).

CO08 : Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 74/2018, έχει προγραμματική τιμή στόχο 50 και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 7,64, καθώς έχουν ολοκληρωθεί 8 από τις 20 ενταγμένες πράξεις που συμβάλλουν στο δείκτη. Ο στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 11,23 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης.

CV20: Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 105/2020 και έχει προγραμματική τιμή στόχου

37.700.000,00 Ευρώ. Στον δείκτη συμβάλλουν 4.056 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 45.709.012,76 Ευρώ. Έως σήμερα η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 45.778.155,89 Ευρώ (που αντιστοιχεί στην ενίσχυση 4.050 ΜΜΕ), υπερκαλύπτοντας τον προγραμματικό στόχο.

CV21: Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης (πλην επιχορηγήσεων) επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 097 και έχει προγραμματική τιμή στόχου 4.350.000,00 Ευρώ. Στον δείκτη συμβάλλει 1 ενταγμένη πράξη με τιμή στόχου 5.500.000,00 Ευρώ. Η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 5.025.117,12 Ευρώ και προκύπτει από την ολοκλήρωση της ενίσχυσης 118 επιχειρήσεων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (mis 5027213).

CV22: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 105/2020 και έχει προγραμματική τιμή στόχου 3.350 επιχειρήσεις. Στον δείκτη συμβάλλουν 4.056 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 4.056 επιχειρήσεις. Έως σήμερα η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 4.050 επιχειρήσεις, υπερκαλύπτοντας τον προγραμματικό στόχο.

CV23: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης (πλην επιχορηγήσεων) επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Ηπείρου. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 097 και έχει προγραμματική τιμή στόχου 120 επιχειρήσεις. Στον δείκτη συμβάλλει 1 ενταγμένη πράξη με τιμή στόχου 120 επιχειρήσεις. Η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 118 επιχειρήσεις και προκύπτει από την ολοκλήρωση της ενίσχυσης 118 επιχειρήσεων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (mis 5027213).

Πρόσθετος Δείκτης εκροών CO05: Παραγωγικές επενδύσεις Αριθμός νέων επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Ο δείκτης CO05 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 3c και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 097, με στόχο της πρόσκλησης 14 επιχειρήσεις. Ο δείκτης συνδέεται με τη δράση συμμετοχής του ΠΕΠ στη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και σε αυτόν συμβάλλει μία ενταγμένη πράξη με τιμή στόχου 14 επιχειρήσεις. Η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 16 επιχειρήσεις και υπερκαλύπτει τον στόχο της πρόσκλησης.

Πρόσθετος Δείκτης εκροών CO07: Ιδιωτικές επενδύσεις που αντιστοιχούν σε δημόσια στήριξη επιχειρήσεων μη επιχορηγήσεις (ευρώ)

Ο δείκτης CO07 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 3c και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 097, με στόχο της πρόσκλησης 8.500.000 ευρώ. Ο δείκτης συνδέεται με τη δράση συμμετοχής του ΠΕΠ στη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και σε αυτόν συμβάλλει μία ενταγμένη πράξη με τιμή στόχου 8.500.000 ευρώ. Η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 8.906.049 ευρώ και προέρχεται από τη χρηματοδότηση 147 επιχειρήσεων από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας II. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη υπερκαλύπτει τον στόχο της πρόσκλησης.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO34: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου (Τόνοι Ισοδύναμου CO₂)

Ο δείκτης CO34 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 3c και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 74/2018, με στόχο της πρόσκλησης 2 τόνους ισοδύναμου CO₂. Αφορά σε δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 44 ενταγμένες πράξεις, των οποίων ο συνολικός στόχος ανέρχεται σε 957,23 τόνους και υπερκαλύπτει τον στόχο της πρόσκλησης. Η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 586,47 τόνους ισοδύναμου CO₂.

2.2.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΤΠΑ του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2021), τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης για το 2022 και στοιχεία από το ΟΠΣ έως τον Ιούνιο του 2023, που αφορούν στις εντάξεις πράξεων και τους αντίστοιχους δείκτες.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 2 παρουσιάζει υλοποίηση στην πλειοψηφία των δεικτών του, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα καλύπτοντας σε μεγάλο βαθμό τον προγραμματικό στόχο, ως συνέχεια της ένταξης και ολοκλήρωσης έργων που τροφοδοτούν την τιμή τους. Εξαιρέση αποτελούν οι δείκτες CO32 της επενδυτικής προτεραιότητας 4c, 08706 της επενδυτικής προτεραιότητας 5b και SO006 της επενδυτικής προτεραιότητας 6c, οι οποίοι αν και έχουν ενεργοποιηθεί με την ένταξη σχετικών πράξεων, σημειώνουν μηδενική υλοποίηση διότι δεν έχει ολοκληρωθεί κάποια από τις πράξεις αυτές.

Θεματικός Στόχος 4

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	CO31	Νοικοκυριά	2.247	1.007
Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων	CO32	KWh/έτος	1.000.000	0
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	CO34	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	3.926,00	8.806,65

CO31: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις αναβάθμισης και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 53/2018 και 85/2019. Στον δείκτη συμβάλουν 2 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου τα 2.526 νοικοκυριά. Έως σήμερα έχει ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση 1.007 νοικοκυριών, με το ποσοστό επίτευξης του δείκτη να ανέρχεται στο 44,8%.

CO32: Ενεργειακή απόδοση: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων

Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις αναβάθμισης κτιρίων και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 72/2018, έχει τιμή στόχο 1.000.000 KWh/έτος και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση. Στον δείκτη συμβάλουν 3 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 1.631.444,20 KWh/έτος, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

CO34: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Ο δείκτης αφορά στη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου ως αποτέλεσμα της αναβάθμισης κτιρίων και της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα και στα δημόσια κτίρια. Ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 53/2018, 72/2018, 73/2018 και 85/2019. Η τιμή στόχος του δείκτη είναι 3.926 τόνοι ισοδυνάμου CO₂ και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 8.806,65, που προέρχεται από την ολοκλήρωση των ενεργειακών παρεμβάσεων σε 1.007 νοικοκυριά. Στον δείκτη συμβάλουν 5 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχο 8.559,20 τόνους ισοδυνάμου CO₂.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4e

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	CO34	Τόνοι ισοδυνάμου CO ₂	617,00	16,96

CO34: Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων, την εκπόνηση σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας και σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 81/2019 και 102/2020 και παρουσιάζει υλοποίηση ίση με 16,96. Στον δείκτη συμβάλουν 13 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχο 2.185,68 τόνους ισοδυνάμου CO₂, εκ των οποίων μόλις 1 πράξη εμφανίζεται ως ολοκληρωμένη.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO38: Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές (Τετραγωνικά μέτρα)

Ο δείκτης CO38 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4e και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 81/2019 και στην 102/2020 με στόχο της πρόσκλησης 72.460 και 100.000 τετραγωνικά μέτρα αντίστοιχα. Αφορά σε δράσεις δημιουργίας ή ανάπλασης υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές και παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών και κέντρων. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 4 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 95.766 τ.μ. και μηδενική υλοποίηση.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 02301: Σχέδια δράσης για βιώσιμη ενέργεια (Αριθμός)

Ο δείκτης 02301 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4e και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 15/2016, με στόχο της πρόσκλησης 4 σχέδια δράσης. Σχετίζεται με τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα, μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής σχεδίων δράσης. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 4 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 4 σχέδια δράσης τα οποία έχουν ολοκληρωθεί (τιμή υλοποίησης ίση με 4).

Πρόσθετος δείκτης εκροών 02302: Μετρήσεις συγκέντρωσης αιωρούμενων σωματιδίων (Αριθμός)

Ο δείκτης 02302 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4e και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 35/2016, με στόχο της πρόσκλησης 2.555 μετρήσεις. Σχετίζεται με δράσεις ανάπτυξης συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 1 ενταγμένη πράξη, με τιμή στόχου 1.788 μετρήσεις, ενώ η υλοποίηση ανέρχεται σε 1.423. Τόσο η τιμή στόχου της ενταγμένης πράξης όσο και η τιμή υλοποίησης υπολείπονται του στόχου της πρόσκλησης.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 04301: Σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας (Αριθμός)

Ο δείκτης 04301 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 4e και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 14/2016, με στόχο της πρόσκλησης 4 σχέδια. Σχετίζεται με επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές, μέσω της εκπόνησης και εφαρμογής σχεδίων βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 4 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 4 σχέδια, οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί καλύπτοντας πλήρως τον στόχο της πρόσκλησης.

Θεματικός Στόχος 5

Επενδυτική Προτεραιότητα 5b

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	CO20	Άτομα	19.488	6.750
Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή	08704	Αριθμός	4	4
Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα	08705	Αριθμός	1	1
Ενέργειες αναβάθμισης δομών πολιτικής προστασίας	08706	Αριθμός	1	0
Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας	08711	Στρέμματα	21.680,00	2.869,00

CO20: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές μη δασικές περιοχές και κατασκευής, αντικατάστασης βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 55/2018, 59/2018 και 86/2019. Η τιμή στόχος του δείκτη είναι 19.488 άτομα και υλοποίηση ίση με 6.750 άτομα που προέρχεται από την ολοκλήρωση 4 σχετικών πράξεων. Στον δείκτη συμβάλλουν 10 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 19.030 άτομα.

08704 : Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ανάπτυξης συστημάτων για την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εξέλιξης των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επιμέρους υψηλής σημαντικότητας περιοχές και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 34/2016. Στον δείκτη συμβάλλουν οι 4 πράξεις που εντάχθηκαν το 2017 και έχουν ήδη ολοκληρωθεί, με συνολική τιμή στόχου 4 συστήματα. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 4 και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 4 συστήματα.

08705 : Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα

Ο δείκτης αφορά στην ανάπτυξη σχεδιασμού και ανάληψη δράσεων για πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 36/2016. Στον δείκτη συμβάλει μία πράξη, με τιμή στόχου 1 δράση, η οποία εντάχθηκε το 2017 και έχει ολοκληρωθεί. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 1, όπως και η τιμή υλοποίησης.

08706: Ενέργειες αναβάθμισης δομών πολιτικής προστασίας

Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 65_2018 με προγραμματικό στόχο 1 ενέργεια. Σχετίζεται με δράσεις ενίσχυσης των δομών πολιτικής προστασίας και των δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών. Στο δείκτη συμβάλλουν 2 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 2 ενέργειες, ενώ η υλοποίηση είναι μηδενική, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες πράξεις.

08711: Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις κατασκευής έργων αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές μη δασικές περιοχές και κατασκευής, αντικατάστασης βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 55/2018, 59/2018 και 86/2019. Στον δείκτη συμβάλλουν 10 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 22.332 στρέμματα. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 21.680 στρέμματα και παρουσιάζει υλοποίηση 2.869 στρέμματα, που προέρχεται από την ολοκλήρωση 4 σχετικών πράξεων.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 12201: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις (Αριθμός)

Ο δείκτης 12201 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 5b και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 39/2017, με στόχο της πρόσκλησης 1 μελέτη. Σχετίζεται με το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Σχέδιο για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Ο δείκτης δεν έχει καταχωρηθεί σε καμία ενταγμένη πράξη και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση.

Θεματικός Στόχος 6

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	CO18	Άτομα	14.130	14.292
Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	CO19	Ισοδύναμο πληθυσμού	44.443	1.312

CO18: Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις επενδύσεων στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό) και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 5/2015. Ο δείκτης έχει προγραμματική τιμή στόχου 14.130 άτομα. Καθώς έχουν ολοκληρωθεί και οι 4 πράξεις της πρόσκλησης που συμβάλουν στο δείκτη, με συνολική τιμή υλοποίησης 14.292 άτομα, το ποσοστό υλοποίησης του δείκτη υπερβαίνει το 100%.

CO19: Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις επενδύσεων για τη διαχείριση λυμάτων. Ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 6/2015, 70/2018 και 90/2019. Στον δείκτη συμβάλουν 13 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 58.016 ισοδύναμο πληθυσμού, εκ των οποίων οι 5 εντάχθηκαν το 2020. Ο δείκτης έχει προγραμματική τιμή στόχου 44.443 και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 1.312, καθώς έχει ολοκληρωθεί μία μόνο από τις 13 ενταγμένες πράξεις.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 08703: Προγράμματα που υλοποιούνται για την κάλυψη των απαιτήσεων των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών απορροής (Αριθμός)

Ο δείκτης 08703 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 6b και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 16/2016 και 19/2016, με συνολικό στόχο των προσκλήσεων 5 προγράμματα. Σχετίζεται με την υλοποίηση του Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης), καθώς και δράσεις υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού και οριοθέτησης ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 4 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 4 προγράμματα, ενώ και η υλοποίηση του δείκτη είναι 4 προγράμματα, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι ανωτέρω πράξεις.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	CO09	Επισκέψεις / έτος	6.665	2.500
Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς	SO006	Αριθμός	9	0

CO09: Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Ο δείκτης αφορά σε επενδύσεις για την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 13/2015 και 91/2019. Στο δείκτη συμβάλουν 6 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 11.550 επισκέψεις/έτος. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 6.665 και παρουσιάζει υλοποίηση 2.500 επισκέψεις/έτος, που προέρχεται από την ολοκλήρωση μίας πράξης.

SO06: Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις δικτύωσης και προβολής της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 40/2017 και 92/2020. Στο δείκτη συμβάλουν 2 ενταγμένες πράξεις, με τιμή στόχου 12 ενέργειες προβολής, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η προγραμματική τιμή στόχος του δείκτη είναι 9 και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 09410: Ενέργειες στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης τουριστικής προβολής της Περιφέρειας (Αριθμός)

Ο δείκτης 09410 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 6c και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 40/2017, με στόχο της πρόσκλησης 9 ενέργειες. Σχετίζεται με δράσεις δικτύωσης και προβολής του τουρισμού της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 1 ενταγμένη πράξη, με τιμή στόχου 9 ενέργειες, ενώ η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη πράξη.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6d

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	CO23	Εκτάρια	92.000,00	56.987,50

CO23: Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 48/2017. Στον δείκτη συμβάλουν 5 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 102.883,50 εκτάρια. Ο δείκτης παρουσιάζει υλοποίηση 56.987,50 εκτάρια έναντι της προγραμματικής τιμής στόχου, που είναι 92.000,00 εκτάρια.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6e

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	CO38	Τετραγωνικά μέτρα	85.000,00	49.057,30

CO38: Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

Ο δείκτης αφορά σε επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 12/2015, 47/2017 και 52/2017. Στο δείκτη συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου των ενταγμένων πράξεων ίση με 99.047,30 τ.μ.. Η προγραμματική τιμή στόχος του δείκτη είναι 85.000,00 τ.μ. και το ποσοστό υλοποίησής του ανέρχεται σε 57,7% (49.057,30 τ.μ.).

2.2.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 3

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των στόχων των Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2021), τα στοιχεία της Ετήσιας

Έκθεσης υλοποίησης για το 2022 και στοιχεία από το ΟΠΣ έως τον Νοέμβριο του 2023, που αφορούν τις εντάξεις πράξεων και τους αντίστοιχους δείκτες.

Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση σε δύο από τους τρεις δείκτες εκροής. Η υστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των δεικτών του άξονα οφείλεται στο γεγονός ότι τα ενταγμένα έργα αφορούν κυρίως την κατασκευή νέου οδικού δικτύου και την ανακατασκευή ή αναβάθμιση βασικών οδικών αξόνων της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

Θεματικός Στόχος 7

Επενδυτική Προτεραιότητα 7b

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	CO13	χιλιόμετρα	5,40	0
Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	CO14	χιλιόμετρα	5,80	0
Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	SO022	αριθμός	1	1

CO13: Συνολικό μήκος νέων δρόμων

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις έργων υποστήριξης ΔΕΔ-Μ - υποδομών και ειδικότερα έργα σύνδεσης ΔΕΔ-Μ με μεγάλα αστικά κέντρα και με περιοχές φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 93/2020, 22/2016, 51/2017, 50/2017 και 71/2018. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενική έναντι της προγραμματικής τιμής στόχου που είναι 5,40 χιλιόμετρα. Στον δείκτη συμβάλουν 3 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 11,56 χιλιόμετρα, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

CO14: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις υλοποίησης υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 93/2020, 22/2016, 51/2017, 50/2017 και 71/2018. Στο δείκτη συμβάλουν 3 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 12,8 χιλιόμετρα, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 5,80 χιλιόμετρα και η τιμή υλοποίησής του είναι μηδενική.

SO022: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις επενδύσεων για τη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο και συστημάτων παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 38/2017 και 78/2019. Στο δείκτη συμβάλει μία ενταγμένη πράξη με τιμή στόχου 1 παρέμβαση, η οποία έχει ολοκληρωθεί. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 1, όπως και η τιμή υλοποίησης.

Πρόσθετος δείκτης εκροών T1621: Ενέργειες οδικής ασφάλειας (Αριθμός)

Ο δείκτης T1621 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 7b και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 38/2017, με στόχο της πρόσκλησης 4 ενέργειες. Σχετίζεται με δράσεις προμήθειας συστημάτων παροχής πληροφόρησης και εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας. Ο δείκτης δεν έχει καταχωρηθεί σε καμία πράξη, αν και υπάρχει μία ενταγμένη πράξη στη συγκεκριμένη πρόσκληση που θα μπορούσε να συνδεθεί με τον δείκτη.

2.2.1.4. Άξονας Προτεραιότητας 4

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των στόχων των Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2021), τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης για το 2022 και στοιχεία από το ΟΠΣ έως τον Νοέμβριο του 2023, που αφορούν τις εντάξεις πράξεων και τους αντίστοιχους δείκτες.

Οι δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας 4 έχουν ενεργοποιηθεί στο σύνολό τους και παρουσιάζουν υλοποίηση, με εξαίρεση τον δείκτη T1628 που αφορά στον αριθμό των Ρομά με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης, ο οποίος εμφανίζει μηδενική υλοποίηση. Η ικανοποιητική πορεία υλοποίησης των δεικτών οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν πραγματοποιηθεί εντάξεις σχετικών έργων από το 2016, με αποτέλεσμα να έχουν ήδη ολοκληρωθεί αρκετά από τα έργα που συμβάλλουν στους δείκτες.

Θεματικός Στόχος 9

Επενδυτική Προτεραιότητα 9α

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Μονάδες υγείας που βελτιώνονται	T1626	Αριθμός	5	3
Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται	SO031	Φυσικά πρόσωπα	89	82
Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	T1664	Αριθμός	13	12

T1626: Μονάδες υγείας που βελτιώνονται

Ο δείκτης αφορά σε παρεμβάσεις υποδομών και προμήθειας εξοπλισμού των Μονάδων Υγείας της Περιφέρειας (κυρίως δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας φροντίδας) και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 11/2015. Η προγραμματική τιμή στόχος είναι 5 Μονάδες Υγείας και έχουν ολοκληρωθεί οι 3 από τις 4 ενταγμένες πράξεις που συμβάλλουν στο δείκτη. Το ποσοστό υλοποίησης του δείκτη είναι 60%.

SO031: Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις δημιουργίας υποδομών και προμήθειας εξοπλισμού κοινωνικών δομών για την κάλυψη αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την φτώχεια και σε ειδικές ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 7/2015, 49/2017 και 94/2020, με προγραμματική τιμή στόχου 89. Στον δείκτη συμβάλλουν 3 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 172 φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων οι 2 έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα το ποσοστό επίτευξης του δείκτη να ανέρχεται στο 92% (82 φυσικά πρόσωπα).

T1664: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις δημιουργίας υποδομών και προμήθειας εξοπλισμού κοινωνικών δομών για την κάλυψη αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την φτώχεια και σε ειδικές ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 32/2016 και έχει προγραμματική τιμή στόχου 13 δομές. Στο δείκτη συμβάλλουν 10 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 13 δομές, εκ των οποίων οι 9 έχουν ολοκληρωθεί με συνολική τιμή υλοποίησης 12 δομές.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 12101: Υποστηρικτικές δομές που ενισχύονται (Αριθμός)

Ο δείκτης 12101 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9α και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 32/2016 και 49/2017, με συνολικό στόχο των προσκλήσεων 22 δομές. Σχετίζεται με δράσεις ανάπτυξης/ βελτίωσης υποδομών στέγασης και σίτισης και λοιπών υποδομών αντιμετώπισης της φτώχειας και δράσεις προμήθειας εξοπλισμού Κέντρων Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 8 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 11 δομές. Η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 11 δομές, καθώς ολοκληρώθηκαν οι ανωτέρω πράξεις.

Πρόσθετος δείκτης εκροών T1627: Δυναμικότητα των υποδομών φροντίδας που ενισχύονται (Αριθμός)

Ο δείκτης T1627 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9α και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 7/2015, 32/2016 και 49/2017, με συνολικό στόχο των προσκλήσεων 126 άτομα. Σχετίζεται με δράσεις δημιουργίας υποδομών και προμήθειας εξοπλισμού κοινωνικών δομών για την κάλυψη αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την φτώχεια και σε ειδικές ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 9 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 1.117 άτομα. Η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 1.073 άτομα και υπερκαλύπτει τον στόχο των προσκλήσεων.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9b

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης	T1628	Φυσικά πρόσωπα	90	0

T1628: Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις κατασκευής υποδομών για περιθωριοποιημένες κοινότητες και ειδικότερα, μικρής κλίμακας υποδομές που θα διευκολύνουν τις συνθήκες διαβίωσης των Ρομά. Ο δείκτης έχει τιμή στόχο 90 και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 104/2020. Στο δείκτη συμβάλλει 1 ενταγμένη πράξη με στόχο 250 φυσικά πρόσωπα, ενώ η τιμή υλοποίησης είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη πράξη.

Θεματικός Στόχος 10

Επενδυτική Προτεραιότητα 10α

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	CO35	Άτομα	60.000	51.113

CO35: Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις κατασκευής ή αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 18/2016, 37/2017, 41/2017, 45/2017 και 46/2017. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 60.000 άτομα και σε αυτόν συμβάλλουν 7 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 60.410 άτομα. Καθώς έχουν ολοκληρωθεί 3 από τις ανωτέρω πράξεις, η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 51.113 άτομα.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 00101: Εργαστηριακές υποδομές που ενισχύονται (Αριθμός)

Ο δείκτης 00101 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 10α και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 37/2017, 45/2017 και 46/2017, με συνολικό στόχο των προσκλήσεων 1.070 εργαστηριακές υποδομές. Σχετίζεται με δράσεις προμήθειας εξοπλισμού ΤΠΕ σχολικών μονάδων προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξοπλισμού εργαστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και εργαστηριακού εξοπλισμού επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 4 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 598 υποδομές. Η υλοποίηση του δείκτη είναι 476 και προέρχεται από 1 ολοκληρωμένη πράξη.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 04901: Αριθμός Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενισχύονται (Αριθμός)

Ο δείκτης 04901 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 10α και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 37/2017, με στόχο της πρόσκλησης 3 υποδομές. Σχετίζεται με δράσεις προμήθειας εξοπλισμού εργαστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 2 ενταγμένες πράξεις, με συνολική

τιμή στόχου 2 υποδομές. Η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές πράξεις.

2.2.1.5. Άξονας Προτεραιότητας 7

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των στόχων των Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 7, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2021), τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης για το 2022 και στοιχεία από το ΟΠΣ έως τον Νοέμβριο του 2023, που αφορούν τις εντάξεις πράξεων και τους αντίστοιχους δείκτες.

Οι δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας 7 έχουν ενεργοποιηθεί στο σύνολό τους και παρουσιάζουν ικανοποιητικό βαθμό υλοποίησης, αφού αρκετά από τα έργα που συμβάλλουν σε αυτούς έχουν ολοκληρωθεί.

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	T1650	Αριθμός	8	5
Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης.	T1651	Αριθμός	1	0
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις.	T1652	Αριθμός	15	13
Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται	12105	Αριθμός	10	5

T1650: Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται.

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ανάπτυξης, προμήθειας ή αναβάθμισης συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης, που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 4/2015 και έχει προγραμματική τιμή στόχου 8 εργαλεία. Στον δείκτη συμβάλλουν 7 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 8 εργαλεία, εκ των οποίων τα 5 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

T1651: Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις εκπόνησης, εξειδίκευσης και εφαρμογής Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 4/2015 και η προγραμματική τιμή στόχου είναι 1 σχέδιο δράσης. Στον δείκτη συμβάλλουν 2 ενταγμένες πράξεις οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί και ως εκ τούτου ο δείκτης παρουσιάζει μηδενική τιμή υλοποίησης.

T1652: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση αξιολογήσεων, εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΤΠΑ του ΠΕΠ, καθώς και σε δράσεις εκπόνησης στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλισης εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΤΠΑ. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 4/2015 και η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 15. Στον δείκτη συμβάλλουν 2 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 22, εκ των οποίων έχουν ολοκληρωθεί οι 13 μελέτες/ εμπειρογνωμοσύνες/ έρευνες/ αξιολογήσεις. Επομένως, το ποσοστό επίτευξης του στόχου του δείκτη ανέρχεται σε 87% περίπου.

12105: Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ και έχει ενεργοποιηθεί με την πρόσκληση 4/2015. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 10 φορείς και έχει

επιτευχθεί κατά 50%, καθώς έχουν ολοκληρωθεί 5 σχετικές συμβάσεις των πράξεων που συμβάλλουν στον δείκτη. *Σημειώνεται ότι στο ΟΠΣ δεν έχει καταχωρηθεί ο δείκτης στις πράξεις που συμβάλλουν σε αυτόν και θα πρέπει να διορθωθεί.*

Πρόσθετος δείκτης εκροών T1653: Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται (Αριθμός)

Ο δείκτης T1653 αποτελεί πρόσθετο δείκτη του Άξονα Προτεραιότητας 7 και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 04/2015, με στόχο της πρόσκλησης 12 δικαιούχους. Σχετίζεται με δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 2 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 10 δικαιούχους, ενώ η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 5 δικαιούχους.

2.2.2. Εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης των τελικών τιμών στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΤΠΑ

2.2.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, το προγραμματισμένο και κατ' ακολουθία το υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 1, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής υλοποίησης των δεικτών, έχει στηριχθεί στα στοιχεία των σχετικών δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ (07.11.2023), στο σχέδιο δράσης του προγράμματος, στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος (2021) και στα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του 2022.

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 1 εκφράζεται με τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 13. Πρόοδος υλοποίησης Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 1 (07.11.2023)

Επ. Πρωτ.	ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
1a	Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται	SO033	Αριθμός	1	1	100,0%	0	0,0%
1b	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα	CO26	Επιχειρήσεις	60	70	116,7%	12	20,0%
2b	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	CO01	Επιχειρήσεις	654	674	103,1%	674	103,1%
2b	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	CO02	Επιχειρήσεις	654	674	103,1%	674	103,1%
2c	Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται	SO007	Αριθμός	28	45	160,7%	38	135,7%
3a	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	CO01	Επιχειρήσεις	18	54	300,0%	11	61,1%
3a	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται	CO08	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	18	96,55	536,4%	17,46	97,0%
3a	Έρευνα, καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά	CO28	Επιχειρήσεις	18	54	300,0%	11	61,1%
3b	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	CO01	Επιχειρήσεις	1	2	200,0%	0	0,0%

Επ. Πρωτ.	ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
3b	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	CO02	Επιχειρήσεις	1	2	200,0%	0	0,0%
3b	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	CO08	Ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης	1	3,20	320,0%	0	0,0%
3c	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη	CO01	Επιχειρήσεις	3.550	4.250	119,7%	4.223	119,0%
3c	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	CO02	Επιχειρήσεις	3.400	4.100	120,6%	4.076	119,9%
3c	Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων	CO03	Επιχειρήσεις	150	150	100,0%	147	98,0%
3c	Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση	CO08	Ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης	50	11,23	22,5%	7,64	15,3%
3c	Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19	CV20	Ευρώ	37.700.000	45.709.012,76	121,2%	45.778.155,89	121,4%
3c	Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19	CV21	Ευρώ	4.350.000	5.500.000	126,4%	5.025.117,12	115,5%
3c	Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19	CV22	Επιχειρήσεις	3.350	4.056	121,1%	4.050	120,9%
3c	Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19	CV23	Επιχειρήσεις	120	120	100,0%	118	98,3%

Επενδυτική Προτεραιότητα 1α

Δείκτης Εκρώων SO033:Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται

Έχει ενταχθεί μία πράξη που τροφοδοτεί το δείκτη με τιμή στόχου 1 και μηδενική υλοποίηση, και ως εκ τούτου ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου ανέρχεται στο 0%. Σε προγραμματικό επίπεδο έχει τεθεί ως στόχος του δείκτη η τιμή 1, που καλύπτεται πλήρως από την ενταγμένη πράξη. Καθώς η συγκεκριμένη πράξη έχει χαρακτηριστεί ως 6 «Έργα με δυνατότητα μεταφοράς στην ΠΠ 21-27» στο πρόσφατο Σχέδιο Δράσης του προγράμματος, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη δεν θα επιτευχθεί.

Επενδυτική Προτεραιότητα 1b

Δείκτης Εκροών CO26: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη (70), υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (60) κατά 116,7%, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι χαμηλός (20%), δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι σχετικές πράξεις. Ο στόχος του δείκτη θα υπερκαλυφθεί με την ολοκλήρωση των ανωτέρω πράξεων.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2b

Δείκτης Εκροών CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 674 και καλύπτουν τον προγραμματικό στόχο (654) κατά 103,1%. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου ανέρχεται στο 103,1% και έχει ήδη υπερκαλυφθεί, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια.

Δείκτης Εκροών CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 674 και καλύπτουν τον προγραμματικό στόχο (654) κατά 103,1%. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου ανέρχεται στο 103,1% και έχει ήδη υπερκαλυφθεί, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί όλα τα ενταγμένα επενδυτικά σχέδια.

Επενδυτική Προτεραιότητα 2c

Δείκτης Εκροών SO07: Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/αναβαθμίζονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 45 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (28) κατά 160,7%. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 135,7%, και προέρχεται από την ολοκλήρωση 13 σχετικών πράξεων με τιμή υλοποίησης 38 ψηφιακές υπηρεσίες / συστήματα. Ο στόχος του δείκτη έχει ήδη υπερκαλυφθεί.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3a

Δείκτης Εκροών CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 54 και καλύπτει τον προγραμματικό στόχο (18) κατά 300%, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι σχετικά χαμηλός (61,1%) δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις στο σύνολό τους. Ο δείκτης κρίνεται ότι θα υπερκαλυφθεί, καθώς το σύνολο των πράξεων που συμβάλλουν σε αυτών εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα εντός της ΠΠ, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος.

Δείκτης Εκροών CO08: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 96,55 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (18) κατά 536,4%, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 97% δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις στο σύνολό τους. Ο στόχος του δείκτη για το 2023 εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί σε υψηλό ποσοστό, με την ολοκλήρωση όλων των σχετικών πράξεων που συμβάλλουν σε αυτόν.

Δείκτης Εκροών CO28: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 54 και καλύπτει τον προγραμματικό στόχο (18) κατά 300%, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι σχετικά χαμηλός (61,1%) δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις στο σύνολό τους. Ο δείκτης κρίνεται ότι θα υπερκαλυφθεί, καθώς το σύνολο των πράξεων που συμβάλλουν σε αυτών εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα εντός της ΠΠ, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3b

Δείκτης Εκροών CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 2 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (1), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι μηδενικός, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν οι 2 ενταγμένες πράξεις στα πλαίσια της πρόσκλησης «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια», οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος. Επομένως, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη θα επιτευχθεί και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υπερκάλυψης.

Δείκτης Εκροών CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 2 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (1), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι μηδενικός, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν οι 2 ενταγμένες πράξεις στα πλαίσια της πρόσκλησης «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια», οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος. Επομένως, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη θα επιτευχθεί και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υπερκάλυψης.

Δείκτης Εκροών CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 3,2 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (1), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι μηδενικός, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν οι 2 ενταγμένες πράξεις στα πλαίσια της πρόσκλησης «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια», οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος. Επομένως, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη θα επιτευχθεί και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υπερκάλυψης.

Επενδυτική Προτεραιότητα 3c

Δείκτης Εκροών CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 4.250 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (3.550), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 119% (4.223 επιχειρήσεις). Στην υλοποίηση του δείκτη στην παρούσα φάση συνεισφέρει η πράξη «Συμμετοχή ΠΕΠ Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (Β' κύκλος)» με την ολοκλήρωση της ενίσχυσης 147 επιχειρήσεων. Στον δείκτη συνεισφέρει επίσης και η πρόσκληση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας», με την ολοκλήρωση 25 επενδυτικών σχεδίων, καθώς και η πρόσκληση 105/2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» (4.051 επιχειρήσεις). Η ολοκλήρωση όλων των ενταγμένων έργων αναμένεται εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Επομένως ο δείκτης εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.

Δείκτης Εκροών CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη (4.100), υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (3.400), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι επίσης υψηλός (119,9%), δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί 4.076 επενδυτικά σχέδια. Στην υλοποίηση του δείκτη συνεισφέρει η πρόσκληση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας», με την ολοκλήρωση 25 επενδυτικών σχεδίων, καθώς και η πρόσκληση 105/2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» (4.051 επιχειρήσεις). Η ολοκλήρωση όλων των ενταγμένων έργων αναμένεται εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Επομένως ο δείκτης εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.

Δείκτης Εκροών CO03: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 150 και καλύπτει κατά 100% τον προγραμματικό στόχο, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 98%. Στην υλοποίηση του δείκτη στην παρούσα φάση συνεισφέρει η πράξη «Συμμετοχή ΠΕΠ Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (Β' κύκλος)», με την ολοκλήρωση της ενίσχυσης 147 επιχειρήσεων. Ο δείκτης έχει ήδη καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό και δεν αναμένονται νέες εντάξεις σχετικών έργων.

Δείκτης Εκροών CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 11,23 και υπολείπεται αρκετά του προγραμματικού στόχου (50), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι χαμηλός (15,3%), δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρει η πρόσκληση «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας», με την ένταξη των επενδυτικών σχεδίων μέσα στο 2020. Επίσης, με τον δείκτη συνδέεται και η πράξη «Συμμετοχή ΠΕΠ Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (Β' κύκλος)», στην οποία όμως δεν έχει καταχωρηθεί τιμή υλοποίησης έως σήμερα, αν και έχει ολοκληρωθεί η ενίσχυση ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων. Αν η συγκεκριμένη πράξη δεν συνεισφέρει τελικά στην υλοποίηση του δείκτη, υπάρχει κίνδυνος να μην επιτευχθεί ο στόχος για το 2023, καθώς οι υπόλοιπες ενταγμένες πράξεις που αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου έχουν συνολική τιμή στόχου 11,23 (πολύ μικρότερη από τον προγραμματικό).

Δείκτης Εκροών CV20: Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη (45.709.012,76), υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (37.700.000,00), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι επίσης υψηλός (121,4%), δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί 4.050 επενδυτικά σχέδια με συνολική τιμή υλοποίησης 45.778.155,89 ευρώ. Στον δείκτη συνεισφέρει η πρόσκληση 105/2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» με 4.056 πράξεις. Η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω έργων αναμένεται εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Ο δείκτης έχει ήδη υπερκαλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.

Δείκτης Εκροών CV21: Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη (5.500.000,00), υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (4.350.000,00), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι επίσης υψηλός (115,5%), δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί 118 επενδυτικά σχέδια με συνολική τιμή υλοποίησης 5.025.117,12 ευρώ. Στον δείκτη συνεισφέρει η πράξη «Συμμετοχή ΠΕΠ Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (Β' κύκλος)» με τιμή στόχου 5.500.000,00 ευρώ. Η ολοκλήρωση όλων των σχετικών επενδυτικών σχεδίων αναμένεται εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Ο δείκτης έχει ήδη υπερκαλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.

Δείκτης Εκροών CV22: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη (4.056), υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (3.350), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι επίσης υψηλός (120,9%), δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί 4.050 επενδυτικά σχέδια. Στον δείκτη συνεισφέρει η πρόσκληση 105/2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» με 4.056 πράξεις. Η ολοκλήρωση όλων των παραπάνω έργων αναμένεται εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Ο δείκτης έχει ήδη υπερκαλυφθεί σε μεγάλο βαθμό.

Δείκτης Εκροών CV23: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη (120), καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό στόχο, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 98,3%, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί 118 επενδυτικά σχέδια. Στον δείκτη συνεισφέρει η πράξη «Συμμετοχή ΠΕΠ Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II (Β' κύκλος)» με τιμή στόχου 120 επιχειρήσεις. Η ολοκλήρωση όλων των σχετικών επενδυτικών σχεδίων αναμένεται εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Ο δείκτης έχει ήδη καλυφθεί σε πολύ υψηλό βαθμό και αναμένεται να υπάρξει πλήρης επίτευξη του στόχου.

Από τα παραπάνω στοιχεία και τις αντίστοιχες αναφορές, είναι εμφανές ότι το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 καλύπτει σε πολύ υψηλό βαθμό τους προγραμματικούς στόχους και στην πλειοψηφία εμφανίζεται υπερκάλυψη των προγραμματικών στόχων από τα ενταγμένα έργα. Εξαιρέση αποτελεί μόνο ο δείκτης CO08 της επενδυτικής προτεραιότητας 3c, του οποίου ο στόχος για το 2023 κρίνεται ότι δεν είναι εφικτό να επιτευχθεί, καθώς οι εντάξεις που συνεισφέρουν σε αυτόν το δείκτη είναι περιορισμένες και επιπλέον, δεν προβλέπονται νέες εντάξεις που θα συνεισφέρουν στην επίτευξή του.

Με βάση τα ολοκληρωμένα έργα, η υλοποίηση του φυσικού αντικείμενου των ενταγμένων έργων στις επενδυτικές προτεραιότητες 2b, 2c και 3c καλύπτει και στην πλειοψηφία των δεικτών υπερκαλύπτει τους προγραμματικούς στόχους.

Αντίθετα, η υλοποίηση υστερεί σημαντικά, τόσο σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους, όσο και ως προς τους στόχους των ενταγμένων έργων στις επενδυτικές προτεραιότητες 1a, 1b, 3a και 3b, καθώς και στον δείκτη CO08 της επενδυτικής προτεραιότητας 3c. Λαμβάνοντας, όμως, υπόψη το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, εκτιμάται ότι η πλειοψηφία των ενταγμένων έργων αυτών των επενδυτικών προτεραιοτήτων θα ολοκληρωθούν εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της ΠΠ, συνεισφέροντας έτσι στην επίτευξη των στόχων των δεικτών τους για το 2023 (με εξαίρεση τον δείκτη SO033 της 1a και τον δείκτη CO08 της 3c).

2.2.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, το προγραμματισμένο και κατ' ακολουθία το υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής υλοποίησης των δεικτών, έχει στηριχθεί στα στοιχεία των σχετικών δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ (07.11.2023), στο σχέδιο δράσης του προγράμματος, στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος (2021) και στα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του 2022.

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 2 εκφράζεται με τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 14. Πρόσδος υλοποίησης Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 2 (07.11.2023)

Επ. Προτ.	ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
4c	Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης	CO31	Νοικοκυριά	2.247	2.526	112,4%	1.007	44,8%
4c	Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων	CO32	kWh/έτος	1.000.000	1.631.444,20	163,1%	0	0,0%
4c	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	CO34	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	3.926	8.559,20	218,0%	8.806,65	224,3%

Επ. Προτ.	ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
4e	Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου	CO34	Τόνοι ισοδυνάμου CO2	617	2.185,68	354,2%	16,96	2,7%
5b	Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα	CO20	Άτομα	19.488	19.030	97,6%	6.750	34,6%
5b	Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή	08704	Αριθμός	4	4	100,0%	4	100,0%
5b	Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα	08705	Αριθμός	1	1	100,0%	1	100,0%
5b	Ενέργειες αναβάθμισης δομών πολιτικής προστασίας	08706	Αριθμός	1	2	200,0%	0	0,0%
5b	Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας	08711	Στρέμματα	21.680	22.332	103,0%	2.869	13,2%
6b	Υδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης	CO18	Άτομα	14.130	14.292	101,1%	14.292	101,1%
6b	Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	CO19	Ισοδύναμο πληθυσμού	44.443	58.016	130,5%	1.312	3,0%
6c	Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	CO09	Επισκέψεις / έτος	6.665	11.550	173,3%	2.500	37,5%
6c	Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς	SO006	Αριθμός	9	12	133,3%	0	0,0%
6d	Φύση και βιοποικιλότητα: Επιφάνεια οικοτόπων που λαμβάνουν ενίσχυση για να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης	CO23	Εκτάρια	92.000	102.883,5	111,8%	56.987,50	61,9%
6e	Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές	CO38	Τετραγωνικά μέτρα	85.000	99.047,3	116,5%	49.057,30	57,7%

Επενδυτική Προτεραιότητα 4c

Δείκτης Εκρώων CO31:Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 2.526 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (2.247), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 44,8%, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενεργειακές αναβαθμίσεις που προβλέπονται στις ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν 2 ενταγμένες πράξεις που αφορούν την δράση «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της

ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα α' και β' κύκλος». Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα καλυφθεί πλήρως, με μεγάλη πιθανότητα υπερκάλυψής του με την ολοκλήρωση όλων των σχετικών δράσεων.

Δείκτης Εκροών CO32: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 1.631.444,20 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (1.000.000), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι μηδενικός, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν οι ενταγμένες πράξεις που αφορούν την πρόσκληση «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια». Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα καλυφθεί πλήρως ή και θα υπερκαλυφθεί με την ολοκλήρωση των ήδη ενταγμένων πράξεων, καθώς και οι 3 σχετικές πράξεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας ΠΠ.

Δείκτης Εκροών CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 8.559,20 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (3.926), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 224,3%, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί οι ενεργειακές παρεμβάσεις σε 1.007 νοικοκυριά. Στον δείκτη συνεισφέρουν οι ενταγμένες πράξεις που αφορούν την δράση «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα α' και β' κύκλος» και οι εντάξεις της πρόσκλησης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια». Επομένως, η υλοποίηση του δείκτη θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αύξηση με την ολοκλήρωση όλων των σχετικών δράσεων και αύξηση του ποσοστού επίτευξης του στόχου, ο οποίος έχει ήδη υπερκαλυφθεί.

Επενδυτική Προτεραιότητα 4e

Δείκτης Εκροών CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 2.185,68 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (617), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι πολύ χαμηλός (2,7%) δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν 13 ενταγμένες πράξεις, εκ των οποίων η μία έχει χαρακτηριστεί στο πρόσφατο Σχέδιο Δράσης ως phasing, επομένως θεωρείται ότι δεν θα συμβάλει στην επίτευξη του στόχου του δείκτη για το 2023. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των υπόλοιπων πράξεων, εκτιμάται ότι η τιμή υλοποίησης του δείκτη θα κυμανθεί γύρω στους 2.000 τόνους ισοδύναμου CO₂ και θα υπερκαλύψει το στόχο του για το 2023.

Επενδυτική Προτεραιότητα 5b

Δείκτης Εκροών CO20: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 19.030 και καλύπτει κατά 97,6% τον προγραμματικό στόχο (19.488), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι σχετικά χαμηλός (34,6%) δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν 10 ενταγμένες πράξεις, εκ των οποίων οι 3 έχουν χαρακτηριστεί στο πρόσφατο Σχέδιο Δράσης ως 6 «Έργα με δυνατότητα μεταφοράς στην ΠΠ 21-27», επομένως θεωρείται ότι δεν θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του δείκτη για το 2023. Με την ολοκλήρωση του συνόλου των υπόλοιπων πράξεων, εκτιμάται ότι η τιμή υλοποίησης του δείκτη θα ανέρχεται σε 13.418 άτομα και κρίνεται ότι δεν θα επιτευχθεί πλήρως ο στόχος για το 2023.

Δείκτης Εκροών 08704: Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 4 όσο και ο προγραμματικός στόχος του δείκτη, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 100%, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν 4 πράξεις οι οποίες εντάθηκαν το 2017 και δεν αναμένονται νέες εντάξεις. Έτσι, το ποσοστό υλοποίησης του δείκτη εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 100%.

Δείκτης Εκροών 08705: Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 1 όσο και ο προγραμματικός στόχος του δείκτη. Στον δείκτη συνεισφέρει μία πράξη η οποία εντάχθηκε το 2017 και έχει ήδη ολοκληρωθεί, επομένως έχει επιτευχθεί ο στόχος κατά 100%.

Δείκτης Εκροών 08706: Ενέργειες αναβάθμισης δομών πολιτικής προστασίας

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 2 και υπερκαλύπτουν τον προγραμματικό στόχο του δείκτη (1). Στο δείκτη συμβάλλουν 2 ενταγμένες πράξεις και η υλοποίηση είναι μηδενική, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη θα υπερκαλυφθεί, καθώς σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσεις του Προγράμματος, οι ανωτέρω πράξεις αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός της ΠΠ.

Δείκτης Εκροών 08711 «Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 22.332 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (21.680), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι πολύ χαμηλός (13,2%), δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν 7 ενταγμένες πράξεις από την πρόσκληση «Έργα κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων» και την πρόσκληση «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές μη δασικές περιοχές». Επίσης, στον δείκτη συνεισφέρουν και 3 πράξεις της πρόσκλησης «Έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές - μη δασικές περιοχές II». Ωστόσο, τα έργα της συγκεκριμένης δράσης έχουν χαρακτηριστεί στο πρόσφατο Σχέδιο Δράσης ως 6 «Έργα με δυνατότητα μεταφοράς στην ΠΠ 21-27», επομένως θεωρείται ότι δεν θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου του δείκτη για το 2023. Έτσι, εκτιμάται θα παρουσιαστεί υλοποίηση 5.330 στρεμμάτων από την ολοκλήρωση των 7 μόνο πράξεων στο τέλος της ΠΠ και κρίνεται ότι δεν θα επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη για το 2023.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

Δείκτης Εκροών CO18: Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 14.292 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (14.130), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 101,1% (14.292 άτομα), αφού έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Επομένως, ο δείκτης έχει επιτευχθεί.

Δείκτης Εκροών CO19: Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 58.016 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (44.443). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι πολύ χαμηλός (3%), δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν συνολικά 13 πράξεις που αφορούν επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων, εκ των οποίων οι 5 έχουν χαρακτηριστεί ως κατηγορία 3 - phasing στο πρόσφατο σχέδιο δράσης του προγράμματος, 2 έχουν χαρακτηριστεί κατηγορία 5 – προς απένταξη και 1 πράξη στην κατηγορία 4α - ημιτελής. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, ο δείκτης μετράει άτομα σε νοικοκυριά με πραγματική (όχι εν δυνάμει) σύνδεση με το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία δεν εξυπηρετούνταν από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και για το λόγο αυτό η επίτευξη του δείκτη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων του προγράμματος, αλλά και από άλλους παράγοντες. Επομένως, ο δείκτης παρουσιάζει μεγάλη επισφάλεια και το πιθανότερο είναι να καλυφθεί σε ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό (24,6% από την ολοκλήρωση 5 σχετικών πράξεων) και να μην επιτευχθεί πλήρως ο στόχος για το 2023.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c

Δείκτης Εκροών CO09: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 11.550 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (6.665) κατά 173,3%, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι σχετικά χαμηλός (37,5%), δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενταγμένες πράξεις. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα

επιτευχθεί, παρόλο που υπάρχει κάποια επισφάλεια εξαιτίας του γεγονότος ότι ο δείκτης υπολογίζει στην ουσία αποτέλεσμα και όχι εκροή του προγράμματος και η επίτευξη του στόχου επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, πέρα από την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων. Ωστόσο, βάσει του υψηλού ποσοστού υπερκάλυψης του στόχου από τα ενταγμένα έργα, θεωρείται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη, πιθανώς και υπερκάλυψη, του στόχου για το 2023, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα όλες οι σχετικές πράξεις πλην μίας (που έχει χαρακτηριστεί ως κατηγορία 4α στο Σχέδιο Δράσης).

Δείκτης Εκροών SO006: Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 12 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (9), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι μηδενικός, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη θα καλυφθεί πλήρως και πιθανώς να υπερκαλυφθεί με την ολοκλήρωση των 2 πράξεων που συμβάλλουν στον δείκτη.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6d

Δείκτης Εκροών CO23 «Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 102.883,5 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (92.000) με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 61,9%, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενταγμένες πράξεις. Κάθε πράξη αφορά διαφορετική περιοχή με δικαιούχο τον αντίστοιχο Φορέα Διαχείρισης ως εκ τούτου κάθε περιοχή προσμετράται μόνο μία φορά. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί και υπάρχει μεγάλη πιθανότητα υπερκάλυψης, με την ολοκλήρωση όλων των ενταγμένων έργων.

Επενδυτική Προτεραιότητα 6e

Δείκτης Εκροών CO38 «Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 99.047,30 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (85.000), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 57,7%, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συμβάλλουν 7 ενταγμένες πράξεις, εκ των οποίων οι 6 προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, με συνολική τιμή στόχου 92.199,30 τ.μ.. Επομένως, ο δείκτης εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί, εξαιτίας της υπερκάλυψης από τον στόχο των ενταγμένων έργων που αναμένεται να ολοκληρωθούν.

Από τα παραπάνω στοιχεία και τις αντίστοιχες αναφορές, είναι εμφανές ότι το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 καλύπτει το σύνολο των δεικτών εκροής του άξονα, καθώς έχουν ενταχθεί έργα που συμβάλλουν στην επίτευξη των δεικτών. Οι δείκτες όλων σχεδόν των επενδυτικών προτεραιοτήτων εμφανίζουν υψηλή τιμή κάλυψης ή και υπερκάλυψης του προγραμματικού στόχου από τα ενταγμένα έργα, με εξαίρεση 1 δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 5b.

Ωστόσο, με βάση τα ολοκληρωμένα έργα, η υλοποίηση φυσικού αντικείμενου των ενταγμένων έργων υστερεί σημαντικά σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους, στην πλειοψηφία των δεικτών. Θα πρέπει όμως να σημειωθεί ότι, ο άξονας 2 ενεργοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό και σε αρκετές περιπτώσεις δεικτών ο στόχος εντάξεων υπερβαίνει τον αρχικό προγραμματικό στόχο, που εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί για την πλειοψηφία των δεικτών βάσει και των προβλέψεων του Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος. Οι δείκτες που κρίνεται ότι εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα μη επίτευξης του στόχου του δείκτη είναι οι CO20 και 08711 της επενδυτικής προτεραιότητας 5b και ο CO19 της 6b.

2.2.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, το προγραμματισμένο και κατ' ακολουθία το υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής υλοποίησης των δεικτών, έχει στηριχθεί στα στοιχεία των σχετικών δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ (07.11.2023), στο σχέδιο δράσης του προγράμματος, στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος (2021) και στα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του 2022.

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 3 εκφράζεται με τους δείκτες εκρών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 15. Πρόσδος υλοποίησης Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 3 (07.11.2023)

Επ. Προτ.	ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
7b	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος νέων οδών	CO13	χιλιόμετρα	5,4	11,6	214,1%	0	0,0%
7b	Οδικό δίκτυο: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών	CO14	χιλιόμετρα	5,8	12,8	220,7%	0	0,0%
7b	Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών	SO022	αριθμός	1	1	100,0%	1	100,0%

Επενδυτική Προτεραιότητα 7b

Δείκτης Εκρών CO13: Συνολικό μήκος νέων δρόμων

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 11,56 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (5,4) κατά 214,1%, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι μηδενικός, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν 3 ενταγμένες πράξεις που σχετίζονται με έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ - υποδομών και ειδικότερα έργα σύνδεσης ΔΕΔ-Μ με μεγάλα αστικά κέντρα και με περιοχές φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και υποδομές μεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί, αφού σύμφωνα με το πρόσφατο σχέδιο δράσης του Προγράμματος μία από τις σχετικές πράξεις με τιμή στόχου 9,8 προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ, ενώ οι άλλες 2 έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας 3-phasing.

Δείκτης Εκρών CO14: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 12,8 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (5,8) κατά 220,7%, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι μηδενικός, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν 3 ενταγμένες πράξεις που σχετίζονται με έργα υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό (77,6%) όχι όμως πλήρως, αφού σύμφωνα με το πρόσφατο σχέδιο δράσης του Προγράμματος μία από τις σχετικές πράξεις με τιμή στόχου 4,5 προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ, ενώ οι άλλες 2 έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας 3-phasing.

Δείκτης Εκρών SO022: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 1 και καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό στόχο (1), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι 100%, δεδομένου ότι έχει ολοκληρωθεί η σχετική ενταγμένη πράξη. Στον δείκτη συμβάλει μία πράξη που εντάχθηκε το 2017 και δεν προβλέπονται νέες εντάξεις. Επομένως, το ποσοστό επίτευξης του δείκτη αναμένεται να παραμείνει στο 100%.

Από τα παραπάνω στοιχεία και τις αντίστοιχες αναφορές, είναι εμφανές ότι το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 3 καλύπτει σε πολύ υψηλό βαθμό τους δείκτες εκροής του άξονα, καθώς έχει ενταχθεί επαρκής αριθμός έργων που συμβάλουν στην επίτευξη των δεικτών.

Ωστόσο οι 2 από τους 3 δείκτες εμφανίζουν μηδενική τιμή υλοποίησης, γεγονός που αποδίδεται στις δυσκολίες υλοποίησης και στο μεγάλο χρονοδιάγραμμα των έργων που ποσοτικοποιούν το συνολικό μήκος νέων δρόμων και το συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, 3 από τα ενταγμένα έργα του άξονα θα ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου, ενώ 2 από αυτά έχουν χαρακτηριστεί έργα phasing. Ο προγραμματικός στόχος του δείκτη CO14 κρίνεται ότι θα παρουσιάσει μικρή υστέρηση στην επίτευξή του.

2.2.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, το προγραμματισμένο και κατ' ακολουθία το υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής υλοποίησης των δεικτών, έχει στηριχθεί στα στοιχεία των σχετικών δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ (07.11.2023), στο σχέδιο δράσης του προγράμματος, στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος (2021) και στα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του 2022.

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 4 εκφράζεται με τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 16. Πρόοδος υλοποίησης Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 4 (07.11.2023)

Επ. Πρωτ.	ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
9a	Μονάδες υγείας που βελτιώνονται	T1626	Αριθμός	5	4	80,0%	3	60,0%
9a	Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται	SO031	Φυσικά πρόσωπα	89	172	193,3%	82	92,1%
9a	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	T1664	Αριθμός	13	13	100,0%	12	92,3%
9b	Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης	T1628	Φυσικά πρόσωπα	90	250	277,8%	0	0,0%
10a	Παιδική μέριμνα και εκπαίδευση: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	CO35	Άτομα	60.000	60.410	100,7%	51.113	85,2%

Επενδυτική Προτεραιότητα 9a

Δείκτης Εκροών T1626: Μονάδες υγείας που βελτιώνονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 4 και υπολείπεται του προγραμματικού στόχου (5), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 60% καθώς έχουν ολοκληρωθεί 3 από τις 4 ενταγμένες πράξεις. Στο σχέδιο δράσης δεν προβλέπεται η ένταξη νέων πράξεων που θα συμβάλουν στον δείκτη, επομένως κρίνεται ότι ο στόχος για το 2023 δεν θα καλυφθεί πλήρως, αλλά σε μεγάλο βαθμό (80%).

Δείκτης Εκροών SO031: Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 172 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (89), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 92,1% καθώς έχουν

ολοκληρωθεί 2 από τις 3 ενταγμένες πράξεις. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη δεν θα καλυφθεί πλήρως, αλλά σε μεγάλο βαθμό (92,1%), αφού στο σχέδιο δράσης δεν προβλέπεται η ολοκλήρωση της τρίτης πράξης που συμβάλλει στο δείκτη (έχει χαρακτηριστεί κατηγορίας 4α- ημιτελής).

Δείκτης Εκροών T1664: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 13 και ισούται με τον προγραμματικό στόχο. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 92,3% καθώς έχουν ολοκληρωθεί 12 από τις 13 δομές. Στο δείκτη συμβάλλουν 10 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 13 δομές, εκ των οποίων οι 9 έχουν ολοκληρωθεί με συνολική τιμή υλοποίησης 12 δομές. Ο στόχος του δείκτη αναμένεται να επιτευχθεί πλήρως.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9b

Δείκτης Εκροών T1628: Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 250 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (90), ενώ ο βαθμός υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενικός. Στο σχέδιο δράσης προβλέπεται ότι η πράξη που συμβάλλει στο δείκτη θα ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ, επομένως θα υπερκαλυφθεί ο στόχος του δείκτη για το 2023.

Επενδυτική Προτεραιότητα 10α

Δείκτης Εκροών CO35: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 60.410 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (60.000), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 85,2%, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί 3 από τις 7 ενταγμένες πράξεις. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί αφού όλες οι ενταγμένες πράξεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου.

Από τα παραπάνω στοιχεία και τις αντίστοιχες αναφορές, είναι εμφανές ότι το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 4 καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τους δείκτες εκροής του άξονα, καθώς έχει ενταχθεί επαρκής αριθμός έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των δεικτών, με εξαίρεση τον δείκτη T1626 της επενδυτικής προτεραιότητας 9α, του οποίου ο στόχος δεν καλύπτεται πλήρως από τις εντάξεις.

Με βάση τα ολοκληρωμένα έργα, η υλοποίηση φυσικού αντικείμενου των ενταγμένων έργων υστερεί σε μικρό βαθμό σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους, με εξαίρεση τον δείκτη T1628 της επενδυτικής προτεραιότητας 9b που εμφανίζει μηδενική υλοποίηση. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης η πλειοψηφία των ενταγμένων έργων του ΑΠ 4 θα ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου και αναμένεται πλήρης επίτευξη ή και υπερκάλυψη των στόχων των δεικτών. Οι δείκτες που κρίνεται ότι εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα μη επίτευξης του στόχου του δείκτη είναι οι T1626 και SO031 της επενδυτικής προτεραιότητας 9α, οι οποίοι ωστόσο αναμένεται να έχουν υψηλό ποσοστό επίτευξης του προγραμματικού στόχου (80% και 92% αντίστοιχα).

2.2.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 7

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, το προγραμματισμένο και κατ' ακολουθία το υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 7, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής υλοποίησης των δεικτών, έχει στηριχθεί στα στοιχεία των σχετικών δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ (07.11.2023), στο σχέδιο δράσης του προγράμματος, στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος (2021) και στα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του 2022.

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 7 εκφράζεται με τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 7 εκφράζεται από τέσσερεις (4) ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκροών.

Πίνακας 17. Πρόοδος υλοποίησης Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 7 (07.11.2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	T1650	Αριθμός	8	8	100,0%	5	62,5%
Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης.	T1651	Αριθμός	1	2	200,0%	0	0,0%
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις.	T1652	Αριθμός	15	22	146,7%	13	86,7%
Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται	12105	Αριθμός	10	10	100,0%	5	50,0%

Δείκτης Εκροών T1650: Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 8 και καλύπτουν πλήρως τον προγραμματικό στόχο. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 62,5%. Στον δείκτη συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 8 εργαλεία, εκ των οποίων τα 5 έχουν ολοκληρωθεί. Εκτιμάται ότι ο προγραμματικός στόχος του δείκτη θα καλυφθεί κατά 88% με την ολοκλήρωση 6 πράξεων με τιμή στόχου 7 εργαλεία, εντός της ΠΠ (μία πράξη έχει χαρακτηριστεί κατηγορίας 5 – προς απένταξη στο πρόσφατο Σχέδιο Δράσης).

Δείκτης Εκροών T1651: Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 2 και ο προγραμματικός στόχος 1. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι μηδενικός, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ενταγμένα έργα «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση» και το «Οργάνωση Εκδηλώσεων Συνεδριάσεων Συσκέψεων», τα οποία συνεισφέρουν στον δείκτη. Ο στόχος του δείκτη για το 2023 εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί, με μεγάλη πιθανότητα υπερκάλυψης.

Δείκτης Εκροών T1652: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 22 και ο προγραμματικός στόχος 15. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 86,7%. Στον δείκτη συμβάλουν 2 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 22, εκ των οποίων έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι 13 μελέτες/ εμπειρογνωμοσύνες/ έρευνες/ αξιολογήσεις. Επομένως, ο στόχος του δείκτη για το 2023 εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί έως το τέλος της ΠΠ.

Δείκτης Εκροών 12105: Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 10 όσο και ο προγραμματικός στόχος. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 50% καθώς έχουν ολοκληρωθεί 5 υποέργα/συμβάσεις που συνεισφέρουν στον δείκτη. Εκτιμάται ότι θα εμφανιστεί πλήρης επίτευξη του στόχου του δείκτη για το 2023.

Από τα παραπάνω στοιχεία και τις αντίστοιχες αναφορές, είναι εμφανές ότι το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 7 καλύπτει πλήρως ή υπερκαλύπτει τον προγραμματισμένο στόχο των δεικτών.

Σε επίπεδο τιμής υλοποίησης, μηδενικό ποσοστό υλοποίησης εμφανίζει ο δείκτης που αφορά τα επικοινωνιακά σχέδια δράσης. Οι υπόλοιποι 3 δείκτες του άξονα 7 εμφανίζουν ποσοστό υλοποίησης από 50% έως 87% περίπου. Εκτιμάται ότι όλοι οι δείκτες, πλην του T1650, θα παρουσιάσουν πλήρη επίτευξη ή και υπερκάλυψη των προγραμματικών τους στόχων για το 2023, με την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων εντός της ΠΠ.

2.3. Αξιολόγηση της προόδου και της δυνατότητας επίτευξης των στόχων των Δεικτών Εκροής και Άμεσου Αποτελέσματος ΕΚΤ

2.3.1. Αποτίμηση της προόδου επίτευξης των στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΚΤ (ανά Επενδυτική Προτεραιότητα)

2.3.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 5

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των στόχων των Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα, λαμβάνοντας υπόψη την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος (2021), τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης για το 2022 και στοιχεία από το ΟΠΣ έως τον Νοέμβριο του 2023, που αφορούν τις εντάξεις πράξεων και τους αντίστοιχους δείκτες.

Οι δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας 5 έχουν ενεργοποιηθεί στο σύνολό τους, με την ένταξη σχετικών πράξεων που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων τους. Οι περισσότεροι δείκτες εκροής παρουσιάζουν αρκετά υψηλό βαθμό υλοποίησης και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις έχει ήδη υπερκαλυφθεί ο στόχος. Μηδενική υλοποίηση σημειώνεται μόνο στους δείκτες των επενδυτικών προτεραιοτήτων 9ν και 9νι. Η ικανοποιητική πορεία υλοποίησης των δεικτών οφείλεται στο γεγονός ότι είχαν ενεργοποιηθεί προσκλήσεις από το 2016 και ενεργοποιούνταν και νέες κάθε χρόνο.

Θεματικός Στόχος 8

Επενδυτική Προτεραιότητα 8i

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	CO01	αριθμός	290	355

CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Ο δείκτης αφορά σε προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 79/2019. Στον δείκτη συμβάλουν 261 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 284 ανέργους. Ο δείκτης έχει προγραμματική τιμή στόχου 290 και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 355.

Θεματικός Στόχος 9

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	10501	αριθμός	11.100	14.264

10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής καθώς και δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 01/2015, 29/2016, 42/2017, 66/2018, 83/2019, 95/2020 και 109/2021 και έχει προγραμματική τιμή στόχου 11.100 άτομα. Στο δείκτη συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις, από τις οποίες προκύπτει σωρευτική τιμή υλοποίησης 14.264 άτομα έως τον Νοέμβριο του 2023, που σημαίνει ότι έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO21: Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση (Αριθμός)

Ο δείκτης CO21 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9i και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 01/2015, 29/2016 και 42/2017, με στόχο των προσκλήσεων 8 έργα. Σχετίζεται με δράσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 3 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 3 έργα και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 3 έργα, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες πράξεις. Παρατηρείται ότι η υλοποίηση υπολείπεται του στόχου των προσκλήσεων.

Πρόσθετος δείκτης εκροών T1633: Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση όπως μακροχρόνια άνεργοι, άνεργες γυναίκες αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών, άτομα με εξαρτώμενα μέλη κλπ (Αριθμός)

Ο δείκτης T1633 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9i και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 01/2015, 29/2016 και 42/2017, με στόχο των προσκλήσεων 8.148 συμμετέχοντες. Σχετίζεται με δράσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 3 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 5.187 συμμετέχοντες και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 5.195 συμμετέχοντες, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες πράξεις. Παρατηρείται ότι η υλοποίηση υπολείπεται του στόχου των προσκλήσεων.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	05502	Αριθμός	10	11
Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	05503	Αριθμός	26.250	25.205
Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (POMA ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδετοι ανήλικοι)	T1634	Φυσικά πρόσωπα	10	0

05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 25/2016 και 54/2018 (Κέντρα Κοινότητας). Η προγραμματική τιμή στόχος του δείκτη είναι 10 και το ποσοστό επίτευξης του στόχου είναι 110%, στο οποίο συμβάλουν 10 ενταγμένες πράξεις με 11 υποστηριζόμενες δομές.

05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 25/2016 και 54/2018 (Κέντρα Κοινότητας). Η προγραμματική τιμή στόχος του δείκτη είναι 26.250, η οποία έχει καλυφθεί κατά 96% περίπου, καθώς από τις 10 ενταγμένες πράξεις που συμβάλουν στον δείκτη προκύπτουν 25.205 ωφελούμενοι έως τον Νοέμβριο του 2023.

T1634: Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (POMA ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδετοι ανήλικοι)

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις υποστήριξης ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδετοι ανήλικοι) για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση και ΔΥΠΑ_14. Επίσης, έχει συσχετιστεί και με τις προσκλήσεις 25/2016 και 54/2018, οι οποίες αφορούν Κέντρα Κοινότητας και θεωρείται ότι δεν συνεισφέρουν άμεσα στον δείκτη. Η προγραμματική τιμή στόχος του δείκτη είναι 10 και η υλοποίησή του είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη στη σχετική Πρόσκληση.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ σε 10 πράξεις που αφορούν Κέντρα Κοινότητας και θεωρείται ότι δεν συνεισφέρουν άμεσα στον δείκτη και πρέπει να διαγραφεί. Ως αποτέλεσμα, ο συνολικός στόχος των ενταγμένων που προκύπτει είναι πολύ μεγαλύτερος από τον πραγματικό, όπως και η τιμή υλοποίησης.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 11108: Αριθμός Διαπολιτισμικών Μεσολαβητών που επιμορφώνονται (Αριθμός)

Ο δείκτης 11108 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 89/2019, με στόχο της πρόσκλησης 6 μεσολαβητές. Σχετίζεται με δράσεις προώθησης των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 1 ενταγμένη πράξη, με τιμή στόχου 2 μεσολαβητές, όσο και η υλοποίηση του δείκτη, καθώς έχει ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη πράξη. Παρατηρείται ότι η υλοποίηση υπολείπεται του στόχου των προσκλήσεων.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Αριθμός)

Ο δείκτης CO22 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 25/2016, 54/2018 και 89/2019, με στόχο των προσκλήσεων 16 έργα. Σχετίζεται με δράσεις υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση (Κέντρα Κοινότητας) και δράσεις προώθησης των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 11 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 11 έργα και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 12 έργα, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι συγκεκριμένες πράξεις. Παρατηρείται ότι η υλοποίηση υπολείπεται του στόχου των προσκλήσεων.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	10501	Αριθμός	334	406
Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	05502	Αριθμός	7	11
Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	05503	Αριθμός	1.882	1.961
Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	11501	Αριθμός	105	125

10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 2/2015, 30/2016, 43/2017, 67/2018, 84/2019, 100/2020 και 110/2021 και η προγραμματική τιμή στόχου είναι 334 άτομα. Στο δείκτη συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 442 άτομα και η σωρευτική τιμή υλοποίησης έως τον Νοέμβριο του 2023 ανέρχεται σε 406 άτομα.

05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις σχετικές με τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Κέντρων Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 20/2016, 21/2016, 33/2016 και 87/2019 και η προγραμματική τιμή στόχου είναι 7 δομές. Στο δείκτη συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 13 δομές και η σωρευτική τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 11 δομές.

05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις σχετικές με τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Κέντρων Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης). Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 20/2016, 21/2016, 33/2016 και 87/2019 και η προγραμματική τιμή στόχου είναι 1.882 ωφελούμενοι. Στο δείκτη συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 2.112

ωφελομένους και η σωρευτική τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 1.961 ωφελομένους, που σημαίνει ότι έχει ήδη υπερκαλυφθεί ο στόχος του δείκτη.

11501: Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την στήριξη και την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 3/2015, 31/2016, 68/2018 και 108/2021 και η προγραμματική τιμή στόχου είναι 105 σχολικές μονάδες. Στο δείκτη συμβάλλουν 4 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 108 και η σωρευτική τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 125 σχολικές μονάδες, που σημαίνει ότι έχει ήδη υπερκαλυφθεί ο στόχος του δείκτη.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 11502: Αριθμός μαθητών που επωφελούνται (Άτομα)

Ο δείκτης 11502 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 3/2015, 31/2016, 68/2018 και 108/2021, με στόχο των προσκλήσεων 72 άτομα. Σχετίζεται με δράσεις για την στήριξη και την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 4 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 108 άτομα και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 138 άτομα.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO16: Συμμετέχοντες με Αναπηρία (Αριθμός)

Ο δείκτης CO16 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 02/2015, 3/2015, 30/2016, 31/2016, 33/2016 και 43/2017, με στόχο των προσκλήσεων 748 συμμετέχοντες. Σχετίζεται με δράσεις για την στήριξη και την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δράσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ και Κέντρα Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 7 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 214 συμμετέχοντες και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 32 συμμετέχοντες. Παρατηρείται ότι ο στόχος των ενταγμένων έργων και η υλοποίηση του δείκτη υπολείπονται του στόχου των προσκλήσεων.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO17: Άλλα μειονεκτούντα άτομα (Αριθμός)

Ο δείκτης CO17 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 20/2016 και 21/2016, με στόχο των προσκλήσεων 118 συμμετέχοντες. Σχετίζεται με δράσεις σχετικές με τη λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης και ξενώνων φιλοξενίας). Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 4 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 236 άτομα. Η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 29 συμμετέχοντες.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO20: Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις (Αριθμός)

Ο δείκτης CO20 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 33/2016 και 87/2019, με στόχο των προσκλήσεων 3 έργα. Σχετίζεται με δράσεις για τη λειτουργία Κέντρων Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία και Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 3 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 3 έργα και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 3 έργα, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι ανωτέρω πράξεις.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO21: Αριθμός έργων αφιερωμένων στη βιώσιμη συμμετοχή και την πρόοδο των γυναικών στην απασχόληση (Αριθμός)

Ο δείκτης CO21 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 02/2015, 20/2016, 21/2016, 30/2016 και 43/2017, με συνολικό στόχο των προσκλήσεων 10 έργα. Σχετίζεται με δράσεις σχετικές με τη λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης και ξενώνων φιλοξενίας) και δράσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 7 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή

στόχου 7 έργα και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 8 έργα (μεγαλύτερη από τον στόχο που είχε προβλεφθεί κατά την ένταξη).

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Αριθμός)

Ο δείκτης CO22 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 3/2015, 20/2016 και 31/2016, με συνολικό στόχο των προσκλήσεων 3 έργα. Σχετίζεται με δράσεις σχετικές με τη λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης) και δράσεις για την στήριξη και την παροχή εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε παιδιά με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 5 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 5 έργα και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 8 έργα (μεγαλύτερη από τον στόχο που είχε προβλεφθεί κατά την ένταξη).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης	11201	Αριθμός	1	1
Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)	11202	Αριθμός	39.270	5.405
Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν	11203	Αριθμός	9	9
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας	11204	Αριθμός	600	644
Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις	11205	Αριθμός	200	675
Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	05502	Αριθμός	25	26
Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	05503	Αριθμός	8.254	7.427
Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19	CV30	ευρώ	6.000.000,00	5.359.381,34
Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19	CV33	Οντότητες	12	12

11201: Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. Σχετίζεται με την Πρόσκληση 69/2018, αν και δεν έχει καταχωρηθεί σε αυτή και ο προγραμματικός στόχος του είναι 1 δράση. Στον δείκτη συμβάλλει μία ενταγμένη πράξη, με τιμή υλοποίησης 1 δράση.

Σημειώνεται ότι ο δείκτης δεν έχει καταχωρηθεί στο ΟΠΣ σε 1 πράξη που συμβάλλει σε αυτόν (mis 5033060), με αποτέλεσμα ο συνολικός στόχος των ενταγμένων που προκύπτει και η τιμή υλοποίησης του δείκτη να εμφανίζονται μηδενικοί.

11202: Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 76/2018. Ο δείκτης παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 5.405 άτομα, έναντι της τιμής στόχου που είναι 39.270 άτομα. Στο δείκτη συμβάλλει μία ενταγμένη πράξη με τιμή στόχου 39.270 άτομα.

11203: Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας από τις Τοπικές Ομάδες Υγείας και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 76/2018. Ο δείκτης παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 9 TOMY, ίση με τον προγραμματικό του στόχο. Στο δείκτη συμβάλει μία ενταγμένη πράξη με τιμή στόχου 11 TOMY.

11204: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 63/2018. Ο δείκτης παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 644 άτομα έναντι της προγραμματικής τιμής στόχου που είναι 600 άτομα. Στο δείκτη συμβάλουν 6 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 390 άτομα.

11205: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 62/2018. Ο δείκτης παρουσιάζει σωρευτική τιμή υλοποίησης 675 άτομα, έναντι της προγραμματικής τιμής στόχου που είναι 200 άτομα. Στο δείκτη συμβάλουν 5 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 913 άτομα.

05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για δομές αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο) και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 26/2016, 27/2016 και 28/2016. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 25 δομές και έχει υπερκαλυφθεί, καθώς η σωρευτική τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 26 δομές. Στο δείκτη συμβάλουν 19 ενταγμένες πράξεις.

05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για δομές αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο) και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 26/2016, 27/2016 και 28/2016. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 8.254 ωφελούμενοι και έχει καλυφθεί σε υψηλό ποσοστό, καθώς η σωρευτική τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 7.427 ωφελούμενους. Στο δείκτη συμβάλουν 19 ενταγμένες πράξεις.

CV30: Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID 19 και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 96/2020. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 6.000.000,00 ευρώ και έχει καλυφθεί σε υψηλό ποσοστό, καθώς η σωρευτική τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 5.359.381,34 ευρώ. Στο δείκτη συμβάλουν 2 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 7.159.770,44 ευρώ.

CV33: Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID 19 και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 96/2020. Η προγραμματική τιμή στόχου του δείκτη είναι 12 οντότητες και έχει καλυφθεί πλήρως, καθώς η σωρευτική τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 12. Στο δείκτη συμβάλουν 2 ενταγμένες πράξεις.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο

Ο δείκτης αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9ιν και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 26/2016, 27/2016, 28/2016, 62/2018, 63/2018, 69/2018 και 96/2020. Αφορά σε δράσεις για δομές αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, σε δράσεις αντιμετώπισης των εξαρτήσεων, δράσεις για την παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα και δράσεις για τη δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης. Επίσης, σχετίζεται με τις πρόσφατες δράσεις ενίσχυσης των Μονάδων και Φορέων Υγείας του Υπουργείου Υγείας με επικουρικό προσωπικό για την ανταπόκριση στις ανάγκες λόγω της επιδημίας COVID 19. Στο δείκτη συμβάλουν 25 ενταγμένες πράξεις, με

συνολική τιμή στόχου 29 έργα και συνολική τιμή υλοποίησης 34 έργα. Ο στόχος των προσκλήσεων είναι 33 έργα και έχει υπερκαλυφθεί.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO20: Αριθμός έργων πλήρως ή μερικώς εκτελεσθέντων από κοινωνικούς εταίρους ή μη κυβερνητικές οργανώσεις (Αριθμός)

Ο δείκτης CO20 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9ιν και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 27/2016, 28/2016 και 63/2018, με στόχο των προσκλήσεων 4 έργα. Σχετίζεται με δράσεις για τη λειτουργία δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο), τη λειτουργία δομών αστέγων και δράσεις παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας στην Κοινότητα. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 8 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 8 έργα και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 10 έργα.

Πρόσθετος δείκτης εκροών T1636: Αριθμός ωφελούμενων από δράσεις αγωγής και προαγωγής υγείας (Άτομα)

Ο δείκτης T1636 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9ιν και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 26/2016, 27/2016 και 28/2016, με στόχο των προσκλήσεων 531 άτομα. Σχετίζεται με δράσεις για τη λειτουργία δομών Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο), τη λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και τη λειτουργία δομών αστέγων. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 19 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 3.083 άτομα και η υλοποίηση του δείκτη ανέρχεται σε 6.557 άτομα.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 11217: Πληθυσμός ευπαθών ομάδων που καλύπτεται από υπηρεσίες πρόνοιας (Αριθμός)

Ο δείκτης 11217 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9ιν και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 62/2018, με στόχο της πρόσκλησης 1.000 άτομα. Σχετίζεται με δράσεις αντιμετώπισης των εξαρτήσεων και έχει καταχωρηθεί σε 2 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή υλοποίησης 6.398 άτομα.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ν

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	11301	Αριθμός	11	0

11301: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 97/2020. Η τιμή στόχου του δείκτη είναι 11 φορείς και συμβάλλουν σε αυτόν 13 ενταγμένες πράξεις με συνολικό στόχο 13 φορείς. Η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί καμία σχετική πράξη.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9νι

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	CO01	Αριθμός	272	0
Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	CO05	Αριθμός	30	0

CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων.

Ο δείκτης αφορά σε Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης ευπαθών ομάδων. Ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 98/2020, 101/2020 και 107/2021. Η τιμή στόχος του δείκτη είναι 272 άνεργοι. Στο δείκτη συμβάλλουν 4 ενταγμένες πράξεις με συνολικό στόχο 147 ανέργους. Η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί καμία σχετική πράξη.

CO05: Απασχολούμενοι συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων

Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 99/2020, σχετίζεται με δράσεις ολοκληρωμένων τοπικών προγραμμάτων για την προώθηση της απασχόλησης. Η τιμή στόχος του δείκτη είναι 30 απασχολούμενοι. Στο δείκτη συμβάλλει 1 ενταγμένη πράξη με στόχο 30 απασχολούμενους. Η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική πράξη.

Πρόσθετος δείκτης εκροών CO22: Αριθμός έργων που αφορούν δημόσιες διοικήσεις ή δημόσιες υπηρεσίες σε εθνικό περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο (Αριθμός)

Ο δείκτης CO22 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9νι και χρησιμοποιήθηκε στις προσκλήσεις 75/2018, 103/2020 και 111/2021, με στόχο προσκλήσεων 5 έργα. Σχετίζεται με δράσεις ολοκληρωμένων τοπικών προγραμμάτων για την προώθηση της απασχόλησης. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 5 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 5 έργα και η υλοποίηση του δείκτη είναι 2, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι πράξεις.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 10402: Αριθμός επωφελούμενων από Δομές Στήριξης Επιχειρηματικότητας που εφάρμοσαν την επιχειρηματική τους ιδέα (Αριθμός)

Ο δείκτης 10402 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9νι και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 107/2021, με στόχο της πρόσκλησης 20 ωφελούμενους. Σχετίζεται με Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης ευπαθών ομάδων και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση, καθώς δεν έχει ενταχθεί καμία σχετική πράξη.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 10403: Αριθμός επωφελούμενων από Δομές Στήριξης Επιχειρηματικότητας (Αριθμός)

Ο δείκτης 10403 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9νι και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 107/2021, με στόχο της πρόσκλησης 100 ωφελούμενους. Σχετίζεται με Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης ευπαθών ομάδων και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση, καθώς δεν έχει ενταχθεί καμία σχετική πράξη.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 11209: Αριθμός ωφελούμενων που λαμβάνουν κοινωνικές υπηρεσίες από δράσεις ΟΧΕ (Αριθμός)

Ο δείκτης 11209 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9νι και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 107/2021, με στόχο της πρόσκλησης 20 ωφελούμενους. Σχετίζεται με Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης ευπαθών ομάδων και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση, καθώς δεν έχει ενταχθεί καμία σχετική πράξη.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 11211: Αριθμός ωφελούμενων από κοινωνικές δράσεις ΟΧΕ (Αριθμός)

Ο δείκτης 11211 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9νι και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 107/2021, με στόχο της πρόσκλησης 25 ωφελούμενους. Σχετίζεται με Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης ευπαθών ομάδων και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση, καθώς δεν έχει ενταχθεί καμία σχετική πράξη.

Πρόσθετος δείκτης εκροών 11313: Αριθμός Δράσεων για την ανάπτυξη εργαλείων και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης καθοδήγησης επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο υλοποίησης στρατηγικών ΟΧΕΒΑΑ (Αριθμός)

Ο δείκτης 11313 αποτελεί πρόσθετο δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9νι και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 103/2020, με στόχο της πρόσκλησης 1 δράση. Σχετίζεται με τη δράση «Μηχανισμός Διαρκούς Πληροφόρησης και Υποστήριξης περιοχής εφαρμογής της Στρατηγικής ΤΑΠΤΟΚ ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤΟΚ Leader της ΗΠΕΙΡΟΣ ΑΕ» και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί καμία σχετική πράξη. Στο δείκτη συμβάλλει μία ενταγμένη με συνολική τιμή στόχου 1 έργο.

2.3.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 6

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος υλοποίησης των στόχων των Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 6, όπως αυτή ποσοτικοποιείται μέσω του συστήματος δεικτών του Άξονα, λαμβάνοντας υπόψη την αναθεώρηση του Προγράμματος (2021), τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης για το 2022 και

στοιχεία από το ΟΠΣ έως τον Νοέμβριο του 2023, που αφορούν τις εντάξεις πράξεων και τους αντίστοιχους δείκτες.

Οι δείκτες του Άξονα Προτεραιότητας 6 έχουν ενεργοποιηθεί στο σύνολό τους, με εξαίρεση τον δείκτη 12105 - Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται. Οι 3 από τους 4 δείκτες του Άξονα 6 εμφανίζουν μηδενική υλοποίηση, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί τα σχετικά έργα τεχνικής βοήθειας που συμβάλουν σε αυτούς.

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Υλοποίηση
Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	T1645	Αριθμός	1	0
Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης	T1646	Αριθμός	1	0
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις.	T1647	Αριθμός	3	3
Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται	12105	Αριθμός	3	0

T1645: Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ανάπτυξης, προμήθειας ή αναβάθμισης συστημάτων και εργαλείων οργάνωσης της διαχείρισης, που είναι απαραίτητα για την εξυπηρέτηση ειδικών αναγκών αποτελεσματικής υλοποίησης, παρακολούθησης και διαχείρισης των παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 24/2016 και παρουσιάζει μηδενική τιμή υλοποίησης έναντι της προγραμματικής τιμής στόχου, που είναι 1 εργαλείο. Στο δείκτη συμβάλει 1 ενταγμένη πράξη με τιμή στόχου 1 υποστηρικτικό εργαλείο.

T1646: Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις εκπόνησης, εξειδίκευσης και εφαρμογής Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση του ρόλου και των επιτευγμάτων του ΠΕΠ ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία και κοινωνία. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 24/2016 και παρουσιάζει μηδενική τιμή υλοποίησης έναντι της τιμής στόχου που είναι 1. Στο δείκτη συμβάλει μία ενταγμένη πράξη που περιλαμβάνει 1 επικοινωνιακό σχέδιο δράσης.

T1647: Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις για την βελτίωση της αποτελεσματικότητας και ποιότητας υλοποίησης, με την εκπόνηση εξειδικευμένων μελετών και εμπειρογνωμοσυνών προετοιμασίας / ωρίμανσης / εξειδίκευσης / βελτιστοποίησης της εφαρμογής / αποτίμησης των παρεμβάσεων ΕΚΤ του ΠΕΠ, καθώς και σε δράσεις εκπόνησης στρατηγικών και προπαρασκευαστικών μελετών και εμπειρογνωμοσυνών και εξασφάλισης εξωτερικών συμβουλευτικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα θέματα που αφορούν παρεμβάσεις του ΕΚΤ. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 24/2016 και εμφανίζει τιμή υλοποίησης 3, ίση με την προγραμματική τιμή στόχου. Στο δείκτη συμβάλουν 2 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 3.

12105: Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται

Ο δείκτης αφορά σε δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ και δεν έχει ενεργοποιηθεί. Επομένως, παρουσιάζει μηδενική τιμή υλοποίησης, ενώ η τιμή στόχος του δείκτη είναι 3 φορείς.

Πρόσθετος δείκτης εκροών T1648: Τελικοί δικαιούχοι που υποστηρίζονται (Αριθμός)

Ο δείκτης T1648 αποτελεί πρόσθετο δείκτη του Άξονα Προτεραιότητας 6 και χρησιμοποιήθηκε στην πρόσκληση 24/2016, με στόχο της πρόσκλησης 15 δικαιούχους. Σχετίζεται με δράσεις ενίσχυσης της διαχειριστικής επάρκειας των δικαιούχων του ΠΕΠ. Ο δείκτης έχει καταχωρηθεί σε 1 ενταγμένη πράξη, με συνολική τιμή στόχου 1 δικαιούχο, ενώ η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική.

2.3.2. Ανάλυση δεδομένων τιμών επίτευξης των κοινών Δεικτών Εκροής και Άμεσου Αποτελέσματος ΕΚΤ

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζεται η ανάλυση των δεδομένων τιμών επίτευξης των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανά επενδυτική προτεραιότητα, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης για το 2022 και στοιχεία από το ΟΠΣ. Ειδικότερα, τα στοιχεία του ΟΠΣ περιλαμβάνουν τις τιμές υλοποίησης των δεικτών ανά πράξη, βάσει απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου που έχουν υποβληθεί έως τον Νοέμβριο του 2023. Τα συγκεκριμένα στοιχεία προκύπτουν από την ηλεκτρονική αποθήκευση και παρακολούθηση των δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata) και την παρακολούθηση των συμμετεχόντων και μετά το πέρας των παρεμβάσεων (follow-up).

Η ανάλυση των δεδομένων τιμών επίτευξης των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων πραγματοποιείται για να παρουσιαστεί το προφίλ των συμμετεχόντων (φύλο, ηλικία, εργασιακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, μειονεκτούσες ομάδες) και τα άμεσα αποτελέσματα μετά τη λήξη συμμετοχής τους στις πράξεις. Τα ανωτέρω δεδομένα συλλέγονται για πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο των επενδυτικών προτεραιοτήτων 8i, 9i, 9ii και 9iii του ΕΚΤ. Στις υπόλοιπες επενδυτικές προτεραιότητες του Άξονα Προτεραιότητας 5 δεν παρατηρείται πρόοδος στις τιμές επίτευξης των κοινών δεικτών εκροών και άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων.

Επενδυτική Προτεραιότητα 8i

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τιμές επίτευξης των κοινών δεικτών εκροών και των άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων έως τον Νοέμβριο του 2023, που σχετίζονται με δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 8i. Η επίτευξη των δεικτών προέρχεται από δράσεις της πρόσκλησης 79/2019, που αφορούν προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα. Το σύνολο των συμμετεχόντων / ωφελούμενων από τις ανωτέρω δράσεις ανέρχεται σε 367 άτομα.

Πίνακας 18. Κοινοί Δείκτες Εκροών ΕΚΤ – Επενδυτική Προτεραιότητα 8i

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	αριθμός	355	122	34,4%	233	65,6%	96,7%
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	αριθμός	124	41	33,1%	83	66,9%	33,8%
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	αριθμός	12	4	33,3%	8	66,7%	3,3%
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	αριθμός	4	3	75,0%	1	25,0%	1,1%
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO06	κάτω των 25 ετών	αριθμός	44	7	15,9%	37	84,1%	12,0%
CO07	άνω των 54 ετών	αριθμός	3	1	33,3%	2	66,7%	0,8%
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	αριθμός	3	1	33,3%	2	66,7%	0,8%
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	αριθμός	16	7	43,8%	9	56,3%	4,4%
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	αριθμός	351	119	33,9%	232	66,1%	95,6%

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	αριθμός	13	2	15,4%	11	84,6%	3,5%
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	αριθμός	1	0	0,0%	1	100,0%	0,3%
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	αριθμός	14	4	28,6%	10	71,4%	3,8%
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,00%
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	αριθμός	286	96	33,6%	190	66,4%	77,9%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ			367	126	34,3%	241	65,7%	100,0%

Αναλύοντας τα δεδομένα του παραπάνω Πίνακα, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για το προφίλ των συμμετεχόντων:

- ▶ **Φύλο:** Οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους, σε ποσοστό 65,7%, είναι γυναίκες, ενώ οι άνδρες αποτελούν το 34,3% των συμμετεχόντων.
- ▶ **Εργασιακή κατάσταση:** Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι άνεργοι, σε ποσοστό 96,7%, εκ των οποίων το 34,9% είναι μακροχρόνια άνεργοι (33,8% του συνόλου των συμμετεχόντων). Ακολουθούν τα οικονομικά μη ενεργά άτομα με ποσοστό 3,3% του συνόλου. Από τους οικονομικά μη ενεργούς συμμετέχοντες το 33,3% (1,1% του συνόλου) είναι άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση. Δεν υπάρχουν απασχολούμενοι και αυτοαπασχολούμενοι συμμετέχοντες.
- ▶ **Ηλικία:** Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (87,2%) έχουν ηλικία μεταξύ 25 και 54 ετών. Το 12% είναι συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών και μόλις το 0,8% είναι συμμετέχοντες άνω των 54 ετών.
- ▶ **Μορφωτικό επίπεδο:** Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (95,6%) είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) και ακολουθούν οι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4) με ποσοστό 4,4% του συνόλου. Δεν υπάρχουν συμμετέχοντες απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2).
- ▶ **Ειδικές ομάδες πληθυσμού:** Οι μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης και οι μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) αποτελούν το 3,5% του συνόλου των συμμετεχόντων. Ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,3%) του συνόλου είναι άτομα με αναπηρία, ενώ το 3,8% των συμμετεχόντων ανήκουν σε άλλες μειονεκτούντες ομάδες.

Τέλος, αναφέρεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (66,4%) είναι άτομα που προέρχονται από αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με την τιμή του δείκτη CO19. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η τιμή αυτή περιλαμβάνει μεγάλο βαθμό επισφάλειας, καθώς ο υπολογισμός του δείκτη CO19 δεν προκύπτει υποχρεωτικά από απογραφικά δελτία. Επιπλέον, το πεδίο TK δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί στο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΣΕΚΤ. Σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης του πεδίου TK στα απογραφικά, επίσης δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός. Ο ενδεικτικός υπολογισμός του δείκτη CO19 στο ΟΠΣ αναπτύχθηκε αξιοποιώντας την πληροφορία μόνο από τα απογραφικά στα οποία είχε συμπληρωθεί το πεδίο TK.

Αναφορικά με τις τιμές επίτευξης των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 8i, όπως παρατηρείται και στον παρακάτω Πίνακα, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν καλύπτουν το σύνολο των συμμετεχόντων / ωφελούμενων. Αυτό είναι λογικό, καθώς ορισμένες από τις δράσεις αυτές είναι ακόμη σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να καταγραφούν πριν την ολοκλήρωσή τους ή πριν παρέλθει ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση.

Από την ανάλυση των τιμών του παρακάτω Πίνακα, προκύπτει ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2023 ένα ικανοποιητικό ποσοστό των συμμετεχόντων (51,8% του συνόλου) κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (δείκτης CR04).

Ακολουθούν, με ποσοστό 31,9% οι συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (δείκτης CR06). Θεωρείται ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά, αλλά και οι τιμές επίτευξης όλων των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στον Πίνακα, θα αυξηθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των σχετικών δράσεων.

Πίνακας 19. Δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ – Επενδυτική Προτεραιότητα 8i

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	2	0	0,0%	2	100,0%	0,5%
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	6	2	33,3%	4	66,7%	1,6%
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	190	67	35,3%	123	64,7%	51,8%
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	15	4	26,7%	11	73,3%	4,1%
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	117	43	36,8%	74	63,2%	31,9%
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	1	1	100,0%	0	0,0%	0,3%
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	8	4	50,0%	4	50,0%	2,2%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ			367					100,0%

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τιμές επίτευξης των κοινών δεικτών εκροών και των άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων έως τον Νοέμβριο του 2023, που σχετίζονται με δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9i. Η επίτευξη των δεικτών προέρχεται από δράσεις των προσκλήσεων 01/2015, 29/2016, 42/2017, 66/2018, 83/2019, 95/2020 και 109/2021, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και παροχή δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής και στην εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Το σύνολο των συμμετεχόντων / ωφελούμενων από τις ανωτέρω δράσεις ανέρχεται σε 14.264 άτομα.

Πίνακας 20. Κοινοί Δείκτες Εκρών ΕΚΤ – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	αριθμός	7.920	7	0,1%	7.913	99,9%	55,5%
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	αριθμός	3.519	3	0,1%	3.516	99,9%	24,7%
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	αριθμός	157	0	0,0%	157	100,0%	1,1%
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	αριθμός	105	0	0,0%	105	100,0%	0,7%
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	αριθμός	6.187	19	0,3%	6.168	99,7%	43,4%
CO06	κάτω των 25 ετών	αριθμός	228	0	0,0%	228	100,0%	1,6%
CO07	άνω των 54 ετών	αριθμός	17	1	5,9%	16	94,1%	0,1%
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	αριθμός	6	0	0,0%	6	100,0%	0,0%
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	αριθμός	1.488	5	0,3%	1.483	99,7%	10,4%
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	αριθμός	7.902	20	0,3%	7.882	99,7%	55,4%
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	αριθμός	4.366	1	0,0%	4.365	100,0%	30,6%
CO12	Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	αριθμός	411	1	0,2%	410	99,8%	2,9%
CO13	Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	αριθμός	361	1	0,3%	360	99,7%	2,5%
CO14	Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	αριθμός	320	5	1,6%	315	98,4%	2,2%
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	αριθμός	1.440	3	0,2%	1.437	99,8%	10,1%
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	αριθμός	65	0	0,0%	65	100,0%	0,5%
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	αριθμός	517	0	0,0%	517	100,0%	3,6%
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	αριθμός	1	0	0,0%	1	100,0%	0,0%
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	αριθμός	12.972	26	0,2%	12.946	99,8%	90,9%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ			14.264	26	0,2%	14.238	99,8%	100,0%

Αναλύοντας τα δεδομένα του παραπάνω Πίνακα, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για το προφίλ των συμμετεχόντων:

- ▶ **Φύλο:** Οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους, σε ποσοστό 99,8%, είναι γυναίκες, ενώ οι άνδρες αποτελούν μόλις το 0,2% των συμμετεχόντων.
- ▶ **Εργασιακή κατάσταση:** Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων είναι άνεργοι, σε ποσοστό 55,5%, εκ των οποίων το 44,4% είναι μακροχρόνια άνεργοι (24,7% του συνόλου των συμμετεχόντων). Ακολουθούν οι απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, σε ποσοστό 43,4% και τέλος, τα οικονομικά μη ενεργά άτομα αποτελούν το 1,1% των συμμετεχόντων. Από τους οικονομικά μη ενεργούς συμμετέχοντες το 66,9% (0,7% του συνόλου) είναι άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση.
- ▶ **Ηλικία:** Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (98,3%) έχουν ηλικία μεταξύ 25 και 54 ετών. Το 1,6% είναι συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών και μόλις το 0,1% είναι συμμετέχοντες άνω των 54 ετών.

- ▶ **Μορφωτικό επίπεδο:** Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (55,4%) είναι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4). Ακολουθούν οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8) σε ποσοστό 30,6%, ενώ ένα σχετικά μικρό ποσοστό του συνόλου (10,4%) ανήκει σε απόφοιτους πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2).
- ▶ **Νοικοκυριά:** Ένα ποσοστό 2,9% του συνόλου καταλαμβάνουν συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, 2,5% είναι οι συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα και το 2,2% του συνόλου αποτελείται από συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα.
- ▶ **Ειδικές ομάδες πληθυσμού:** Οι μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης και οι μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) αποτελούν το 10,1% του συνόλου των συμμετεχόντων. Ένα πολύ μικρό ποσοστό (0,5%) του συνόλου είναι άτομα με αναπηρία, ενώ το 3,6% των συμμετεχόντων ανήκουν σε άλλες μειονεκτούντες ομάδες.

Τέλος, αναφέρεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (99,8%) είναι άτομα που προέρχονται από αγροτικές περιοχές, σύμφωνα με την τιμή του δείκτη CO19. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η τιμή αυτή περιλαμβάνει μεγάλο βαθμό επισφάλειας, καθώς ο υπολογισμός του δείκτη CO19 δεν προκύπτει υποχρεωτικά από απογραφικά δελτία. Επιπλέον, το πεδίο TK δεν είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθεί στο Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΕΥΣΕΚΤ. Σε περίπτωση λανθασμένης συμπλήρωσης του πεδίου TK στα απογραφικά, επίσης δεν είναι εφικτός ο υπολογισμός. Ο ενδεικτικός υπολογισμός του δείκτη CO19 στο ΟΠΣ αναπτύχθηκε αξιοποιώντας την πληροφορία μόνο από τα απογραφικά στα οποία είχε συμπληρωθεί το πεδίο TK.

Αναφορικά με τις τιμές επίτευξης των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 9i, όπως παρατηρείται και στον παρακάτω Πίνακα, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν καλύπτουν το σύνολο των συμμετεχόντων / ωφελούμενων. Αυτό είναι λογικό, καθώς ορισμένες από τις δράσεις αυτές είναι ακόμη σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να καταγραφούν πριν την ολοκλήρωσή τους ή πριν παρέλθει ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση.

Από την ανάλυση των τιμών του παρακάτω Πίνακα, προκύπτει ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2023 ένα ικανοποιητικό ποσοστό των συμμετεχόντων (13,8% του συνόλου) κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (δείκτης CR06). Ακολουθούν, με ποσοστό 9,3%, οι συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (δείκτης CR04). Θεωρείται ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά, αλλά και οι τιμές επίτευξης όλων των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στον Πίνακα, θα αυξηθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των σχετικών δράσεων.

Πίνακας 21. Δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ – Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	55	0	0,0%	55	100,0%	0,4%
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	567	0	0,0%	567	100,0%	4,0%
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	1.327	0	0,0%	1.327	100,0%	9,3%

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	308	0	0,0%	308	100,0%	2,2%
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	1.965	0	0,0%	1.965	100,0%	13,8%
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	241	0	0,0%	241	100,0%	1,7%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ			14.264					100,0%

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τιμές επίτευξης των κοινών δεικτών εκρών και των άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων έως τον Νοέμβριο του 2023, που σχετίζονται με δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii. Η επίτευξη των δεικτών προέρχεται από δράσεις της πρόσκλησης 89/2019, που αφορούν την προώθηση των υπηρεσιών διαπολιτισμικής μεσολάβησης σε Κέντρα Κοινότητας της Περιφέρειας Ηπείρου. Το σύνολο των συμμετεχόντων / ωφελούμενων από τις ανωτέρω δράσεις ανέρχεται σε 2 μόλις άτομα.

Πίνακας 22. Κοινοί Δείκτες Εκρών ΕΚΤ – Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	αριθμός	2	2	100,0%	0	0,0%	100,0%
CO06	κάτω των 25 ετών	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO07	άνω των 54 ετών	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	αριθμός	2	2	100,0%	0	0,0%	100,0%
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	αριθμός	2	2	100,0%	0	0,0%	100,0%
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ			2	2	100,0%	0	0,0%	100,0%

Αναλύοντας τα δεδομένα του παραπάνω Πίνακα, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για το προφίλ των συμμετεχόντων:

- ▶ **Φύλο:** Οι συμμετέχοντες στο σύνολό του είναι άνδρες.
- ▶ **Εργασιακή κατάσταση:** Οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους είναι απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων.
- ▶ **Ηλικία:** Δεν υπάρχουν πληροφορίες για την ηλικία των συμμετεχόντων.
- ▶ **Μορφωτικό επίπεδο:** Οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους είναι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8).
- ▶ **Ειδικές ομάδες πληθυσμού:** Οι συμμετέχοντες στο σύνολό τους είναι μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης ή ανήκουν σε μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά).

Αναφορικά με τις τιμές επίτευξης των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, δεν υπάρχουν διαθέσιμα. Αυτό είναι λογικό, καθώς οι σχετικές δράσεις είναι ακόμη σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να καταγραφούν πριν την ολοκλήρωσή τους ή πριν παρέλθει ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

Στους Πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι τιμές επίτευξης των κοινών δεικτών εκρών και των άμεσων αποτελεσμάτων συμμετεχόντων έως τον Νοέμβριο του 2023, που σχετίζονται με δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii. Η επίτευξη των δεικτών προέρχεται από δράσεις των προσκλήσεων 02/2015, 30/2016, 43/2017, 67/2018, 84/2019, 100/2020 και 110/2021, που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και την παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ. Το σύνολο των συμμετεχόντων / ωφελούμενων από τις ανωτέρω δράσεις ανέρχεται σε 406 άτομα.

Πίνακας 23. Κοινοί Δείκτες Εκρών ΕΚΤ – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CO01	άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	αριθμός	204	9	4,4%	195	95,6%	50,2%
CO02	μακροχρόνια άνεργοι	αριθμός	81	0	0,0%	81	100,0%	20,0%
CO03	οικονομικά μη ενεργά άτομα	αριθμός	80	5	6,3%	75	93,8%	19,7%

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CO04	οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	αριθμός	77	4	5,2%	73	94,8%	19,0%
CO05	απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	αριθμός	122	14	11,5%	108	88,5%	30,0%
CO06	κάτω των 25 ετών	αριθμός	3	0	0,0%	3	100,0%	0,7%
CO07	άνω των 54 ετών	αριθμός	70	12	17,1%	58	82,9%	17,2%
CO08	άνω των 54 ετών που είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση	αριθμός	46	3	6,5%	43	93,5%	11,3%
CO09	απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2)	αριθμός	153	10	6,5%	143	93,5%	37,7%
CO10	απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4)	αριθμός	175	8	4,6%	167	95,4%	43,1%
CO11	απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8)	αριθμός	59	9	15,3%	50	84,7%	14,5%
CO12	Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων	αριθμός	23	0	0,0%	23	100,0%	5,7%
CO13	Συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα	αριθμός	20	0	0,0%	20	100,0%	4,9%
CO14	Συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα	αριθμός	16	2	12,5%	14	87,5%	3,9%
CO15	μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης, μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά)	αριθμός	69	0	0,0%	69	100,0%	17,0%
CO16	συμμετέχοντες με αναπηρία	αριθμός	32	2	6,3%	30	93,8%	7,9%
CO17	άλλα μειονεκτούντα άτομα	αριθμός	29	2	6,9%	27	93,1%	7,1%
CO18	άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από τη στέγαση	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CO19	άτομα από αγροτικές περιοχές	αριθμός	348	24	6,9%	324	93,1%	85,7%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ			406	28	6,9%	378	93,1%	100,0%

Αναλύοντας τα δεδομένα του παραπάνω Πίνακα, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα για το προφίλ των συμμετεχόντων:

- ▶ **Φύλο:** Οι συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους, σε ποσοστό 93,1%, είναι γυναίκες, ενώ οι άνδρες αποτελούν το 6,9% των συμμετεχόντων.
- ▶ **Εργασιακή κατάσταση:** Το υψηλότερο ποσοστό των συμμετεχόντων (50,2%) είναι άνεργοι, εκ των οποίων το 39,7% είναι μακροχρόνια άνεργοι (20% του συνόλου των συμμετεχόντων). Ακολουθούν οι απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων, σε ποσοστό 30% και τέλος, τα οικονομικά μη ενεργά άτομα αποτελούν το 19,7% των συμμετεχόντων. Από τους οικονομικά μη ενεργούς συμμετέχοντες το 96,2% (19% του συνόλου) είναι άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση.
- ▶ **Ηλικία:** Η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (82%) έχουν ηλικία μεταξύ 25 και 54 ετών. Το 17,3% είναι συμμετέχοντες άνω των 54 ετών και μόλις το 0,7% είναι συμμετέχοντες κάτω των 25 ετών. Από τους άνω των 54 ετών συμμετέχοντες, ένα μεγάλο ποσοστό (65,7% ή 11,3% του συνόλου) είναι άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, ή οικονομικά μη ενεργά άτομα που δεν παρακολουθούν εκπαίδευση ή κατάρτιση.

- ▶ **Μορφωτικό επίπεδο:** Το μεγαλύτερο ποσοστό των συμμετεχόντων (43,1%) είναι απόφοιτοι ανώτερης δευτεροβάθμιας (ISCED 3) ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 4). Ακολουθούν οι απόφοιτοι πρωτοβάθμιας (ISCED 1) ή κατώτερης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 2) με ποσοστό 37,7%, ενώ ένα σχετικά μικρό ποσοστό του συνόλου (14,5%) ανήκει σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ISCED 5 έως 8).
- ▶ **Νοικοκυριά:** Ένα ποσοστό 5,7% του συνόλου καταλαμβάνουν συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων, 4,9% είναι οι συμμετέχοντες που ζουν σε νοικοκυριά ανέργων με συντηρούμενα τέκνα και το 3,9% του συνόλου αποτελείται από συμμετέχοντες που ζουν σε μονοπρόσωπα νοικοκυριά με συντηρούμενα τέκνα.
- ▶ **Ειδικές ομάδες πληθυσμού:** Οι μετανάστες, συμμετέχοντες αλλοδαπής προέλευσης και οι μειονότητες (συμπεριλαμβανομένων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά) αποτελούν το 17% του συνόλου των συμμετεχόντων. Το 7,9% του συνόλου είναι άτομα με αναπηρία, ενώ το 7,1% των συμμετεχόντων ανήκουν σε άλλες μειονεκτούντες ομάδες.

Τέλος, αναφέρεται ότι η πλειοψηφία των συμμετεχόντων (93,1%) είναι άτομα που προέρχονται από αγροτικές περιοχές.

Αναφορικά με τις τιμές επίτευξης των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων των δράσεων της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii, όπως παρατηρείται και στον παρακάτω Πίνακα, τα διαθέσιμα δεδομένα δεν καλύπτουν το σύνολο των συμμετεχόντων / ωφελούμενων. Αυτό είναι λογικό, καθώς ορισμένες από τις δράσεις αυτές είναι ακόμη σε εξέλιξη και τα αποτελέσματά τους δεν μπορούν να καταγραφούν πριν την ολοκλήρωσή τους, ή πριν παρέλθει ένα ικανοποιητικό χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωση.

Από την ανάλυση των τιμών του παρακάτω Πίνακα, προκύπτει ότι μέχρι τον Νοέμβριο του 2023 ένα ικανοποιητικό ποσοστό των συμμετεχόντων (9,4% του συνόλου) κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (δείκτης CR06). Ακολουθούν, με ποσοστό 5,4%, οι οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (δείκτης CR01) και οι συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (δείκτης CR04). Θεωρείται ότι τα συγκεκριμένα ποσοστά, αλλά και οι τιμές επίτευξης όλων των δεικτών άμεσων αποτελεσμάτων που παρουσιάζονται στον Πίνακα, θα αυξηθούν μετά την ολοκλήρωση όλων των σχετικών δράσεων.

Πίνακας 24. Δείκτες άμεσων αποτελεσμάτων ΕΚΤ – Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CR01	οικονομικά μη ενεργοί συμμετέχοντες, που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	22	1	4,5%	21	95,5%	5,4%
CR02	συμμετέχοντες που παρακολουθούν εκπαίδευση/κατάρτιση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	16	0	0,0%	16	100,0%	3,9%
CR03	συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CR04	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	22	1	4,5%	21	95,5%	5,4%

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	Μον. Μέτρησης	Σωρευτική Αξία					Ποσοστό στο σύνολο συμ/ντων
			Σύνολο	Άνδρες	% Ανδρών	Γυναίκες	% Γυναικών	
CR05	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, αποκτούν εξειδίκευση, ή κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	20	2	10,0%	18	90,0%	4,9%
CR06	συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	38	0	0,0%	38	100,0%	9,4%
CR07	συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	0	0	0,0%	0	0,0%	0,0%
CR08	συμμετέχοντες ηλικίας άνω των 54 ετών που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	2	0	0,0%	2	100,0%	0,5%
CR09	μειονεκτούντες συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	αριθμός	5	0	0,0%	5	100,0%	1,2%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ			406					100,0%

2.3.3. Εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης των τελικών τιμών στόχων των Δεικτών Εκροής ΕΚΤ

2.3.3.1. Άξονας Προτεραιότητας 5

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, το προγραμματισμένο και κατ' ακολουθία το υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 5, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής υλοποίησης των δεικτών, έχει στηριχθεί στα στοιχεία των σχετικών δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ (07.11.2023), στο σχέδιο δράσης του προγράμματος, στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος (2021) και στα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του 2022.

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 5 εκφράζεται με τους δείκτες εκροών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 25. Πρόοδος υλοποίησης Δεικτών Εκροής του Άξονα Προτεραιότητας 5 (07.11.2023)

Επ. Προτ.	ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
8i	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	CO01	αριθμός	290	284	97,9%	355	122,4%
9i	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	10501	αριθμός	11.100	14.146	127,4%	14.264	128,5%
9ii	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	05502	Αριθμός	10	11	110,0%	11	110,0%
9ii	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	05503	Αριθμός	26.250	9.163	34,9%	25.205	96,0%

Επ. Προτ.	ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
9ii	Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ROMA ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι)	T1634	Φυσικά πρόσωπα	10	0	0,0%	0	0,0%
9iii	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	10501	Αριθμός	334	442	132,3%	406	121,6%
9iii	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	05502	Αριθμός	7	13	185,7%	11	157,1%
9iii	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	05503	Αριθμός	1.882	2.112	112,2%	1.961	104,2%
9iii	Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις	11501	Αριθμός	105	108	102,9%	125	119,0%
9iv	Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης	11201	Αριθμός	1	1	100,0%	1	100,0%
9iv	Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)	11202	Αριθμός	39.270	39.270	100,0%	5.405	13,8%
9iv	Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν	11203	Αριθμός	9	11	122,2%	9	100,0%
9iv	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας	11204	Αριθμός	600	390	65,0%	644	107,3%
9iv	Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις	11205	Αριθμός	200	913	456,5%	675	337,5%
9iv	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	05502	Αριθμός	25	25	100,0%	26	104,0%
9iv	Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών	05503	Αριθμός	8.254	3.083	37,4%	7.427	90,0%
9iv	Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19	CV30	ευρώ	6.000.000	7.159.770,44	119,3%	5.359.381,34	89,3%
9iv	Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19	CV33	Οντότητες	12	12	100,0%	12	100,0%
9v	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας	11301	Αριθμός	11	13	118,2%	0	0,0%
9vi	Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων	CO01	Αριθμός	272	147	54,0%	0	0,0%
9vi	Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων	CO05	Αριθμός	30	30	100,0%	0	0,0%

Επενδυτική Προτεραιότητα 8i

Δείκτης Εκρώων CO01 «Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 284 άτομα και καλύπτει τον προγραμματικό στόχο (290) κατά 97,9%. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου ανέρχεται στο 122,4% (355 άνεργοι). Στον δείκτη συνεισφέρουν 261 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα», οι

οποίες με βάση τα τρέχοντα στοιχεία θα ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου. Ο στόχος του δείκτη για το 2023 έχει ήδη υπερκαλυφθεί.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

Δείκτης Εκροών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 14.146 άτομα και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (11.100). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 128,5%. Στον δείκτη συνεισφέρουν 7 ενταγμένες πράξεις, από τις οποίες προκύπτει σωρευτική τιμή υλοποίησης έως σήμερα 14.264 άτομα. Σημειώνεται ότι ο μεγάλος βαθμός υπερκάλυψης του στόχου του δείκτη οφείλεται και στο γεγονός ότι η συγκεκριμένη δράση χρηματοδοτείται και από Εθνικούς Πόρους, εκτός των διατιθέμενων πόρων του ΕΠ. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αναφέρεται στο σύνολο των ωφελούμενων από τη συγκεκριμένη δράση, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης, καθώς δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

Δείκτης Εκροών 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 11 δομές και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο του δείκτη (10 δομές). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 110%, καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι 10 πράξεις που συμβάλουν στο δείκτη, με συνολική τιμή 11 δομές. Δεν προβλέπονται νέες εντάξεις έργων που θα συμβάλουν στον δείκτη. Επομένως, η επίτευξη του δείκτη θα παραμείνει στο 110%.

Δείκτης Εκροών 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 9.163 ωφελούμενοι και καλύπτει τον προγραμματικό στόχο (26.250) κατά 34,9%. Ωστόσο, ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 96%, καθώς από τις 10 ενταγμένες πράξεις που συμβάλουν στον δείκτη προκύπτουν 25.205 ωφελούμενοι σωρευτικά έως τον Νοέμβριο του 2023. Σημειώνεται ότι η παράταση λειτουργίας των υποστηριζόμενων δομών αυξάνει τον αριθμό των ωφελούμενων ατόμων και κατά συνέπεια την τιμή υλοποίησης του δείκτη. Ο προγραμματικός στόχος του δείκτη θεωρείται ότι θα καλυφθεί πλήρως με την ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων.

Δείκτης Εκροών T1634 «Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ Ή αιτούντες άσυλο Ή ασυνόδευτοι ανήλικοι)»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι μηδενικός, έναντι του προγραμματικού στόχου που είναι 10. Ο δείκτης αφορά σε δράσεις υποστήριξης ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση και ΔΥΠΑ_14. Επίσης, έχει λανθασμένα συσχετιστεί και με τις προσκλήσεις 25/2016 και 54/2018, οι οποίες αφορούν Κέντρα Κοινότητας και θεωρείται ότι δεν συνεισφέρουν άμεσα στον δείκτη. Η προγραμματική τιμή στόχος του δείκτη είναι 10 και η υλοποίησή του είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ενταχθεί καμία πράξη στη σχετική Πρόσκληση. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη δεν θα καλυφθεί, καθώς δεν προβλέπονται νέες εντάξεις σχετικών πράξεων.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

Δείκτης Εκροών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 442 άτομα και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (334). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 121,6%. Στο δείκτη συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις και η σωρευτική τιμή υλοποίησης έως τον Νοέμβριο του 2023 ανέρχεται σε 406 άτομα. Επομένως, ο στόχος του δείκτη έχει ήδη υπερκαλυφθεί σε υψηλό ποσοστό και αναμένεται επιπλέον αύξηση.

Δείκτης Εκροών 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 13 δομές, υπερκαλύπτοντας τον προγραμματικό στόχο (7). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 157,1%. Στον δείκτη

συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις και η σωρευτική τιμή υλοποίησης έως σήμερα ανέρχεται σε 11 δομές. Επομένως, ο στόχος του δείκτη έχει ήδη υπερκαλυφθεί σε υψηλό ποσοστό και αναμένεται επιπλέον αύξηση.

Δείκτης Εκροών 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 2.112 ωφελούμενοι, υπερκαλύπτοντας τον προγραμματικό στόχο (1.882). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 104,2%. Στον δείκτη συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις και η σωρευτική τιμή υλοποίησης έως σήμερα ανέρχεται σε 1.961 ωφελούμενους, που σημαίνει ότι έχει ήδη υπερκαλυφθεί ο στόχος του δείκτη. Λαμβάνοντας υπόψη και την επίδραση της παράτασης της λειτουργίας των δομών, εκτιμάται ο η επίτευξη του δείκτη θα εμφανίσει περαιτέρω αύξηση έως το τέλος της ΠΠ.

Δείκτης Εκροών 11501 «Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 108 υπερκαλύπτοντας τον προγραμματικό στόχο (105). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 119%. Στον δείκτη συμβάλουν 4 ενταγμένες πράξεις και η σωρευτική τιμή υλοποίησης έως σήμερα ανέρχεται σε 125 σχολικές μονάδες, που σημαίνει ότι έχει ήδη υπερκαλυφθεί ο στόχος του δείκτη.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iv

Δείκτης Εκροών 11201 «Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 1, όσο και ο προγραμματικός στόχος. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 100%. Στον δείκτη συμβάλει μία ενταγμένη πράξη, η οποία έχει ολοκληρωθεί και εκτιμάται ότι η επίτευξη του δείκτη θα παραμείνει στο 100%.

Δείκτης Εκροών 11202 «Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 39.270 άτομα, όσο και ο προγραμματικός στόχος. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 13,8%. Στον δείκτη συμβάλει μία ενταγμένη πράξη, η οποία σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης θα συνεχιστεί και στην επόμενη ΠΠ. Εκτιμάται ότι στο τέλος της τρέχουσας ΠΠ, η συμβολή της ανωτέρω πράξης θα καλύψει πλήρως τον στόχο του δείκτη για το 2023.

Δείκτης Εκροών 11203 «Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 11 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (9). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 100% (9 TOMY). Στον δείκτη συμβάλει μία ενταγμένη πράξη, με την ολοκλήρωση της οποίας καλύπτεται πλήρως ο στόχος του δείκτη.

Δείκτης Εκροών 11204 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 390 άτομα και υπολείπεται του προγραμματικού στόχου (600). Ωστόσο, ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 107,3%. Στον δείκτη συμβάλουν 6 ενταγμένες πράξεις, από τις οποίες προκύπτει σωρευτική υλοποίηση 644 ωφελούμενοι, που σημαίνει ότι ο στόχος του δείκτη έχει ήδη υπερκαλυφθεί.

Δείκτης Εκροών 11205 «Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 913 άτομα και είναι πολλαπλάσιος του προγραμματικού στόχου (200). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 337%. Στον δείκτη συμβάλουν 5 ενταγμένες πράξεις, από τις οποίες προκύπτει σωρευτική υλοποίηση 675 ωφελούμενοι, που σημαίνει ότι ο στόχος του δείκτη έχει ήδη υπερκαλυφθεί σε πολύ υψηλό ποσοστό.

Δείκτης Εκροών 05502 «Αριθμός υποστηριζόμενων δομών»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 25 δομές όσο και ο προγραμματικός στόχος. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 104%, καθώς η σωρευτική τιμή υλοποίησης ανέρχεται σε 26 δομές. Στον δείκτη συμβάλουν 19 ενταγμένες πράξεις που περιλαμβάνουν δομές αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο). Ο προγραμματικός στόχος του δείκτη έχει υπερκαλυφθεί και δεν αναμένεται επιπλέον αύξηση της υλοποίησης.

Δείκτης Εκροών 05503 «Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 3.083 ωφελούμενοι και υπολείπεται αρκετά του προγραμματικού στόχου (8.254). Όμως, ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 90%. Στον δείκτη συμβάλουν 19 ενταγμένες πράξεις που περιλαμβάνουν δομές αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο), με τη σωρευτική τιμή υλοποίησης έως σήμερα να ανέρχεται σε 7.427 ωφελούμενους. Ο προγραμματικός στόχος του δείκτη εκτιμάται ότι θα καλυφθεί πλήρως με την ολοκλήρωση των δράσεων έως το τέλος της προγραμματικής περιόδου.

Δείκτης Εκροών CV30 «Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 7.159.770,44 ευρώ έναντι του προγραμματικού στόχου 6.000.000.00 ευρώ. Στο δείκτη συμβάλουν 2 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή υλοποίησης 5.359.381,34, επομένως ο στόχος έχει ήδη καλυφθεί σε ποσοστό 89,3%. Εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί πλήρως.

Δείκτης Εκροών CV33 «Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 12 και καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό στόχο. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι επίσης 100% (12 οντότητες). Στον δείκτη συμβάλλουν 2 ενταγμένες πράξεις, με τις οποίες καλύπτεται πλήρως ο στόχος του δείκτη.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ν

Δείκτης Εκροών 11301 «Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 13 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (11). Ο βαθμός επίτευξης του δείκτη είναι μηδενικός. Στο δείκτη συμβάλλουν 13 ενταγμένες πράξεις με συνολικό στόχο 13 φορείς. Η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί καμία σχετική πράξη. Βάσει των δεδομένων της συγκεκριμένης πρόσκλησης και του πρόσφατου σχεδίου δράσης δαπανών του ΕΠ, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η υλοποίηση του δείκτη ως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου. Επομένως, το ποσοστό επίτευξης του δείκτη αναμένεται να αυξηθεί και είναι πιθανή η πλήρης επίτευξη του στόχου για το 2023.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9νι

Δείκτης Εκροών CO01 «άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 147 άνεργοι και υπολείπεται αρκετά του προγραμματικού στόχου (272). Ο βαθμός επίτευξης του δείκτη είναι μηδενικός. Στο δείκτη συμβάλλουν 4 ενταγμένες πράξεις με συνολικό στόχο 147 φορείς. Η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί καμία σχετική πράξη. Επιπλέον, δεν αναμένονται νέες εντάξεις σχετικών πράξεων. Λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης και το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη είναι δύσκολο να επιτευχθεί πλήρως.

Δείκτης Εκροών CO05 «Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 30 και καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό στόχο (30). Ο βαθμός επίτευξης του δείκτη είναι μηδενικός. Στο δείκτη συμβάλλει 1 ενταγμένη πράξη με συνολικό στόχο 30 ωφελούμενους. Η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί η σχετική πράξη. Βάσει του πρόσφατου Σχεδίου Δράσης δαπανών του ΕΠ, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί η υλοποίηση του δείκτη ως το τέλος της Προγραμματικής Περιόδου και το ποσοστό επίτευξης του δείκτη αναμένεται να αυξηθεί και είναι πιθανή η πλήρης επίτευξη του στόχου για το 2023.

Από τα παραπάνω στοιχεία και τις αντίστοιχες αναφορές, είναι εμφανές ότι το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 5 καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τους δείκτες εκροής του άξονα, καθώς έχει ενταχθεί επαρκής αριθμός έργων που συμβάλλουν στην επίτευξη των δεικτών με εξαίρεση 1 δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii (T1634) και έναν δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9νι (CO001).

Σε επίπεδο τιμής υλοποίησης, οι περισσότεροι δείκτες εμφανίζουν είτε υψηλά ποσοστά επίτευξης σε σχέση με τον προγραμματισμένο στόχο, είτε ποσοστά επίτευξης που υπερκαλύπτουν τον προγραμματισμένο στόχο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος, εκτιμάται ότι το σύνολο των δεικτών του ΑΠ 5 θα παρουσιάσουν πλήρη επίτευξη των προγραμματικών στόχων τους ή πολύ υψηλό ποσοστό επίτευξης (>90%), με εξαίρεση τους δείκτες που αναφέρονται παραπάνω.

2.3.3.2. Άξονας Προτεραιότητας 6

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται, το προγραμματισμένο και κατ' ακολουθία το υλοποιούμενο και υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 6, μέσω του συστήματος ποσοτικοποιημένων στόχων – δεικτών. Επισημαίνεται ότι, η εκτίμηση τόσο του στόχου των ενταγμένων έργων, όσο και της τιμής υλοποίησης των δεικτών, έχει στηριχθεί στα στοιχεία των σχετικών δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ (07.11.2023), στο σχέδιο δράσης του προγράμματος, στην Έκθεση Υλοποίησης για το 2022 και στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος (2021).

Το προγραμματισμένο φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 6 εκφράζεται με τους δείκτες εκρών που αντιστοιχούν /αντιπροσωπεύουν ποσοτικοποιημένους στόχους για δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Άξονα Προτεραιότητας. Ειδικότερα, το φυσικό αντικείμενο του Άξονα Προτεραιότητας 6 εκφράζεται από 4 ποσοτικοποιημένους στόχους, αντίστοιχων δεικτών εκρών.

Πίνακας 26. Πρόοδος υλοποίησης Δεικτών Εκρώς του Άξονα Προτεραιότητας 6 (07.11.2023)

ΔΕΙΚΤΗΣ	Κωδ. Δείκτη	Μονάδα Μέτρησης	Στόχος (2023)	Στόχος Εντάξεων	% Εντάξεων	Υλοποίηση	% Υλοποίησης
Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται	T1645	Αριθμός	1	1	100,0%	0	0,0%
Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης	T1646	Αριθμός	1	1	100,0%	0	0,0%
Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις.	T1647	Αριθμός	3	3	100,0%	3	100,0%
Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται	12105	Αριθμός	3	0	0,0%	0	0,0%

Δείκτης Εκρών T1645 «Υποστηρικτικά εργαλεία για την οργάνωση της διαχείρισης που δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 1, όπως και ο προγραμματικός στόχος του δείκτη. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 0%, καθώς το ενταγμένο έργο που συνεισφέρει στον δείκτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο σχέδιο δράσης δεν προβλέπεται κάποια νέα ένταξη έργου και ως εκ τούτου ο στόχος του δείκτη εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί κατά 100% αν ολοκληρωθεί η ενταγμένη πράξη.

Δείκτης Εκρών T1646 «Επικοινωνιακά Σχέδια Δράσης»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 1 όσο και ο προγραμματικός στόχος. Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 0%, καθώς το ενταγμένο έργο «Δημοσιότητα Προβολή και Πληροφόρηση Δράσεως» που συνεισφέρει στον δείκτη δεν έχει ολοκληρωθεί. Στο σχέδιο δράσης δεν προβλέπεται κάποια νέα ένταξη έργου και ως εκ τούτου ο στόχος του δείκτη θα επιτευχθεί στο 100% αν ολοκληρωθεί η ενταγμένη πράξη.

Δείκτης Εκρών T1647 «Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις»

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 3 και καλύπτει πλήρως τον προγραμματικό στόχο (3). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι 100% καθώς έχουν ολοκληρωθεί οι 3 δράσεις που συνεισφέρουν στον δείκτη. Δεν προβλέπονται νέες εντάξεις σχετικών δράσεων, επομένως το ποσοστό επίτευξης εκτιμάται ότι θα παραμείνει στο 100%.

Δείκτης Εκροών 12105 «Δικαιούχοι, Φορείς πράξεων που υποστηρίζονται»

Δεν υπάρχουν ενταγμένα έργα που συνεισφέρουν στο δείκτη. Η τιμή στόχος του δείκτη είναι 3 φορείς και παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση. Δεν προβλέπεται κάποια νέα ένταξη σχετικού έργου και ως εκ τούτου ο στόχος του δείκτη δεν θα επιτευχθεί

Από τα παραπάνω στοιχεία και τις αντίστοιχες αναφορές, είναι εμφανές ότι το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 6 καλύπτει επαρκώς την επίτευξη των 3 εκ των 4 δεικτών. Δεν καλύπτεται καθόλου ο δείκτης 12105 που ποσοτικοποιεί τους φορείς που υποστηρίζονται. Σε επίπεδο τιμής υλοποίησης όλοι οι δείκτες εμφανίζουν μηδενικό ποσοστό επίτευξης σε σχέση με τον προγραμματισμένο στόχο, με εξαίρεση τον δείκτη T1647.

2.4. Βασικά Συμπεράσματα από την ανάλυση της Αποτελεσματικότητας

Τα βασικά συμπεράσματα από την ανάλυση της αποτελεσματικότητας του Προγράμματος είναι ανά ΑΠ τα εξής:

Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ

Η διαχρονική εξέλιξη της πορείας υλοποίησης του Άξονα Προτεραιότητας 1 αναδεικνύει το πρόβλημα της «καθυστερημένης» ενεργοποίησης και εφαρμογής των δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΘΣ 1), των δράσεων βελτίωσης της πρόσβασης και της χρήσης ΤΠΕ (ΘΣ 2), καθώς και των δράσεων βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΘΣ 3).

Με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ 07.11.2023, ο ΑΠ 1 εμφανίζει υψηλούς βαθμούς ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποιήσεων (154,4%, 130% και 128,2% αντίστοιχα) που ουσιαστικά αποτυπώνουν την ενεργοποίηση της δράσης του COVID-19 του 2021, τα έργα της οποίας έχουν πλέον απορροφήσει δαπάνες, ανεβάζοντας και τον βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων σε ικανοποιητικά επίπεδα (82,9%).

Η πρόοδος των παρεμβάσεων του ΑΠ 1 επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες μεταξύ των οποίων:

- οι δυσχέρειες που παρουσιάστηκαν στην υποχρεωτική εφαρμογή του ΠΣΚΕ, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων των ΘΣ 1, 2 & 3
- Η ενεργοποίηση των παρεμβάσεων των ΘΣ 1 & 2 παρουσίασε σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των σχετικών αιρεσιμοτήτων και αυτοδεσμεύσεων.
- Η ενεργοποίηση παρεμβάσεων του ΘΣ 2 επιβιβάστηκαν περαιτέρω από την εφαρμογή της νέας διαδικασίας εξέτασης τους και της έγκρισης τους από τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, η οποία ως νέα δομή, χρειάστηκε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα για να οργανώσει τη λειτουργία της και να στελεχωθεί, ώστε να ανταποκρίνεται εγκαίρως στα σχετικά αιτήματα των φορέων.
- Οι νομικές μορφές δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία επιλογής Ενδιάμεσου Φορέα
- Η θέσπιση του νέου κανονιστικού πλαισίου για τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία της περιόδου 2014-2020 και οι ενέργειες που απαιτήθηκαν για την επικαιροποίηση των ex-ante αξιολογήσεων τους, καθυστέρησαν την έναρξη εφαρμογής τους.

Αναφορικά με τους δείκτες εκροής του ΑΠ σημειώνονται τα εξής:

- Το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 1 καλύπτει σε πολύ υψηλό βαθμό τους προγραμματικούς στόχους και στην πλειοψηφία εμφανίζεται υπερκάλυψη των προγραμματικών στόχων από τα ενταγμένα έργα,
- Η πλειοψηφία των ενταγμένων έργων εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός της περιόδου επιλεξιμότητας της ΠΠ, συνεισφέροντας έτσι στην επίτευξη των στόχων των δεικτών για το 2023 (με εξαίρεση τον δείκτη SO033 της 1α και τον δείκτη CO08 της 3c).

Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη.

Η ενεργοποίηση του ΑΠ2 ξεκινάει από την αρχή σχεδόν της ΠΠ, με τις πρώτες εντάξεις έργων να πραγματοποιούνται το 2015, ενώ το 2016 οι εντάξεις στον ΑΠ δεκαπλασιάζονται με το ποσοστό τους να φτάνει στο 85,6% του π/υ του ΑΠ, κυρίως λόγω των μεταφερόμενων έργων της ΠΠ 2007-2013.

Ο ΑΠ 2 εμφανίζει πολύ υψηλούς βαθμούς ενεργοποίησης, εντάξεων και συμβασιοποίησης (160,7%, 168,4% & 137,1% αντίστοιχα) και υψηλό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (98,1%). Σημαντική επιτάχυνση παρατηρήθηκε στη συμβασιοποίηση των έργων κατά το έτος 2021 (+46,8%) που έδωσαν ώθηση και στην πραγματοποίηση δαπανών κατά το 2022 (+25,6%).

Βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες της ομαλής υλοποίησης των έργων του ΑΠ2 αποτέλεσαν τα εξής:

- Η πρόοδος της υλοποίησης επιμέρους παρεμβάσεων του Θεματικού Στόχου 4 επηρεάστηκε σημαντικά από την καθυστέρηση στην εκπλήρωση της αιρεσιμότητας 4.1, που αφορά στη θέσπιση μέτρων για τη

διασφάλιση των ελάχιστων απαιτήσεων που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση κτηρίων και καλύφθηκε με τη δημοσίευση της ΚΥΑ έγκρισης του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) τον Ιούνιο του 2017. Επίσης, για την έναρξη του Προγράμματος Εξοικονομώ Κατ' Οίκον II απαιτήθηκαν πολλές χρονοβόρες ενέργειες προετοιμασίας, όπως ο επανασχεδιασμός των κριτηρίων επιλογής/ένταξης των νοικοκυριών, η επικαιροποίηση των ζητούμενων δικαιολογητικών στο πλαίσιο της οριστικοποίησης του νέου Οδηγού Εφαρμογής, η απαιτούμενη τροποποίηση του πληροφοριακού συστήματος των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, λόγω του νέου ΚΕΝΑΚ, καθώς και η ανάπτυξη ενιαίου πληροφοριακού συστήματος υποβολής αιτήσεων. Τα ανωτέρω είχαν ως αποτέλεσμα η υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα να ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2018.

- Η πρόοδος υλοποίησης των παρεμβάσεων του ΘΣ 6 επηρεάστηκε σημαντικά από την απαίτηση εκπλήρωσης των Αιρεσιμοτήτων 6.1 «Τομέας υδάτων: ύπαρξη α) τιμολογιακής πολιτικής για το νερό και β) επαρκούς συνεισφοράς των διαφόρων χρήσεων του νερού στην ανάκτηση του κόστους των υπηρεσιών ύδρευσης, σε ποσοστό που καθορίζεται στο εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού για τις επενδύσεις που στηρίζονται από τα προγράμματα» & 6.2 «Τομέας αποβλήτων: Προώθηση των οικονομικά και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα των αποβλήτων, ιδίως μέσω της εκπόνησης σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων σύμφωνα με την οδηγία 2008/98/ΕΚ και με βάση την ιεράρχηση των αποβλήτων».
- Επιπλέον ανασταλτικό παράγοντα αποτέλεσε η αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων - Ν. 4412/2016 (και ο απαιτούμενος χρόνος προσαρμογής των Δικαιούχων σε αυτό), καθώς και η καθυστέρηση στην έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Μελών Επιτροπών Διαγωνισμού – ΜΗΜΕΔ (Φεβ 2018), που επηρέασε τη δημοπράτηση έργων με το σύστημα “Μελέτη – Κατασκευή”.
- Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ως ανασταλτικός παράγοντας και ο απαιτούμενος χρόνος ωρίμασης των Παρεμβάσεων Ολοκληρωμένων Εδαφικών Επενδύσεων (ΟΕΕ). Η εφαρμογή των εργαλείων χωρικής ανάπτυξης διέπεται από πολύπλοκες απαιτήσεις και διαδικασίες και απαιτεί αρκετό χρόνο ωρίμανσης για να υλοποιηθούν οι σχετικές στρατηγικές. Ο ενισχυμένος ρόλος των αστικών αρχών αποτελεί θετικό στοιχείο, απαιτείται ωστόσο, χρόνος για τη διαβούλευση με τους πολίτες, ώστε αφενός να διασφαλιστεί ο ρόλος της αστικής αρχής και από την άλλη να επιτευχθεί η βέλτιστη και απρόσκοπτη υλοποίηση των παρεμβάσεων.
- Τέλος, η καθυστέρηση που παρατηρείται διαχρονικά στην εφαρμογή των παρεμβάσεων του ΑΠ2 (συμβάσεις, δαπάνες) οφείλεται και στα μεγάλα ποσοστά των εκπτώσεων (50%-60%) κατά τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων.

Αναφορικά με τους δείκτες εκροής του ΑΠ 2 σημειώνονται τα εξής:

- Το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 2 καλύπτει το σύνολο των δεικτών εκροής του άξονα. Οι δείκτες όλων σχεδόν των επενδυτικών προτεραιοτήτων εμφανίζουν υψηλή τιμή κάλυψης ή και υπερκάλυψης του προγραμματικού στόχου από τα ενταγμένα έργα, με εξαίρεση 1 δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 5b.
- Με βάση τα ολοκληρωμένα έργα, η υλοποίηση φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων υστερεί σημαντικά σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους, στην πλειοψηφία των δεικτών. Όμως, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο προγραμματικός στόχος για την πλειοψηφία των δεικτών βάσει και των προβλέψεων του Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος. Οι δείκτες που κρίνεται ότι εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα μη επίτευξης του στόχου του δείκτη είναι οι CO20 και 08711 της επενδυτικής προτεραιότητας 5b και ο CO19 της 6b.

Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

Ο ΑΠ 3 εμφανίζει υψηλότερους βαθμούς ενεργοποίησης (314,2%), εντάξεων (267,2%) και συμβάσεων (219,2%), και πολύ ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (91,3%), με την πλειοψηφία των δαπανών να πραγματοποιούνται κατά τα προηγούμενα δύο έτη (2021 & 2022).

Βασικοί παράγοντες που επηρέασαν την ομαλή εφαρμογή των παρεμβάσεων του Άξονα στον τομέα των μεταφορών είναι:

- Η έλλειψη ωριμότητας των έργων για την έκδοση προσκλήσεων
- Οι χρονοβόρες διαδικασίες απαλλοτριώσεων, που αποτελούν απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για τη δημοπράτηση των έργων.
- Η αναμόρφωση του Θεσμικού Πλαισίου Δημοσίων Συμβάσεων - Ν. 4412/2016: οι αλλαγές που επέφερε ο Νόμος στις διαδικασίες διεξαγωγής των διαγωνισμών, η καθυστέρηση στην έκδοση των απαραίτητων ερμηνευτικών εγκυκλίων και αποφάσεων για την εφαρμογή της διαδικασίας διεξαγωγής διαγωνισμού, καθώς και των υποδειγμάτων της ΕΑΔΗΣΥ για την υποβολή των τευχών διαγωνισμού, καθυστέρησαν σημαντικά τις διαδικασίες δημοπράτησης των έργων.

Αναφορικά με τους δείκτες εκροής του ΑΠ 3 σημειώνονται τα εξής:

- Το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 3 καλύπτει σε υψηλό βαθμό τους δείκτες εκροής του άξονα, καθώς έχει ενταχθεί επαρκής αριθμός έργων που συμβάλουν στην επίτευξη των δεικτών.
- Ο Άξονας Προτεραιότητας 3 παρουσιάζει μηδενική υλοποίηση σε δύο από τους τρεις δείκτες εκροής. Η υστέρηση που παρατηρείται στην υλοποίηση των δεικτών του άξονα οφείλεται στο γεγονός ότι τα ενταγμένα έργα αφορούν κυρίως την κατασκευή νέου οδικού δικτύου και την ανακατασκευή ή αναβάθμιση βασικών οδικών αξόνων της Περιφέρειας Ηπείρου, τα οποία χαρακτηρίζονται από μεγάλο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και δεν έχουν ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης, 3 από τα ενταγμένα έργα του άξονα θα ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου, ενώ 2 από αυτά έχουν χαρακτηριστεί έργα phasing. Ο προγραμματικός στόχος του δείκτη CO14 κρίνεται ότι θα παρουσιάσει μικρή υστέρηση στην επίτευξή του.

Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Ο ΑΠ 4 εμφανίζει υπερδέσμευση στις εντάξεις (121,7%), στις συμβασιοποιήσεις (118%) και στις δαπάνες (105,3%).

Η πλειοψηφία των εντάξεων στο ΑΠ 4 πραγματοποιήθηκε τη διετία 2016 – 2017, ενώ αρκετά από τα ενταγμένα έργα του Άξονα αποτελούν έργα μεταφερόμενα από την προηγούμενη ΠΠ 2007 -2013.

Αναφορικά με τους δείκτες εκροής του ΑΠ 4 σημειώνονται τα εξής:

- Το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 4 καλύπτει σε μεγάλο βαθμό τους δείκτες εκροής του άξονα, καθώς έχει ενταχθεί επαρκής αριθμός έργων που συμβάλουν στην επίτευξη των δεικτών, με εξαίρεση τον δείκτη T1626 (Μονάδες υγείας που βελτιώνονται) της επενδυτικής προτεραιότητας 9a, του οποίου ο στόχος δεν καλύπτεται πλήρως από τις εντάξεις.
- Η υλοποίηση φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων του ΑΠ 4 δεν υστερεί σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με τους προγραμματικούς στόχους, με εξαίρεση τον δείκτη T1628 της επενδυτικής προτεραιότητας 9b που εμφανίζει μηδενική υλοποίηση. Σύμφωνα με το σχέδιο δράσης η πλειοψηφία των ενταγμένων έργων του ΑΠ 4 θα ολοκληρωθεί εντός της προγραμματικής περιόδου και αναμένεται πλήρης επίτευξη ή και υπερκάλυψη των στόχων των δεικτών. Οι δείκτες που κρίνεται ότι εμφανίζουν μεγάλη πιθανότητα μη επίτευξης του στόχου του δείκτη είναι οι T1626 και SO031 της επενδυτικής προτεραιότητας 9a, οι οποίοι ωστόσο αναμένεται να έχουν υψηλό ποσοστό επίτευξης του προγραμματικού στόχου (80% και 92% αντίστοιχα).

Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

Ο ΑΠ 5 φαίνεται να επιτυγχάνει τους στόχους του ήδη, αφού οι δαπάνες υπερκαλύπτουν το σύνολο των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ, όντας στο 101,6%, ενώ σημαντική είναι και η υπερδέσμευση των εντάξεων (136,4%) και των συμβασιοποιήσεων (127,4%).

Αναφορικά με τους δείκτες εκροής του ΑΠ 5 σημειώνονται τα εξής:

- ο Το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 5 καλύπτει σε ικανοποιητικό βαθμό τους δείκτες εκροής του άξονα, καθώς έχει ενταχθεί επαρκής αριθμός έργων που συμβάλουν στην επίτευξη των δεικτών, με εξαίρεση 1 δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii (T1634) και έναν δείκτη της επενδυτικής προτεραιότητας 9vi (CO01).
- ο Οι περισσότεροι δείκτες του Άξονα εμφανίζουν είτε υψηλά ποσοστά επίτευξης σε σχέση με τον προγραμματισμένο στόχο, είτε ποσοστά επίτευξης που υπερκαλύπτουν τον προγραμματισμένο στόχο. Σύμφωνα με τα δεδομένα του Σχεδίου Δράσης του Προγράμματος, εκτιμάται ότι το σύνολο των δεικτών του ΑΠ 5 θα παρουσιάσουν πλήρη επίτευξη των προγραμματικών στόχων τους ή πολύ υψηλό ποσοστό επίτευξης (>90%), με εξαίρεση τους δείκτες που αναφέρονται παραπάνω.

Άξονας Προτεραιότητας 6: Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ

Ο ΑΠ 6 εμφανίζει πλήρη ενεργοποίηση και εντάξεις, αλλά πολύ χαμηλό βαθμό συμβασιοποίησης (43,8%) και απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (32,8%). Η επιτάχυνση που παρατηρήθηκε στις διαδικασίες ένταξης των έργων το 2017 δεν έχει μέχρι στιγμής προσδώσει την απαιτούμενη δυναμική στην υλοποίηση του ΑΠ 6.

Αναφορικά με τους δείκτες εκροής του ΑΠ 6 σημειώνονται τα εξής:

- ο Το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον ΑΠ 6 καλύπτει επαρκώς την επίτευξη των 3 από τους 4 δείκτες.
- ο Δεν καλύπτεται καθόλου ο δείκτης 12105 που ποσοτικοποιεί τους φορείς που υποστηρίζονται.
- ο Όλοι οι δείκτες εμφανίζουν μηδενικό ποσοστό επίτευξης σε σχέση με τον προγραμματισμένο στόχο, με εξαίρεση τον δείκτη T1647.

Άξονας Προτεραιότητας 7: Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ

Ο ΑΠ 7 εμφανίζει πλήρη ενεργοποίηση, υπερδέσμευση σε εντάξεις και συμβάσεις (148,1% & 107,8% αντίστοιχα) και σχετικά ικανοποιητικό βαθμό απορρόφησης των προγραμματικών πόρων (91,4%).

Αναφορικά με τους δείκτες εκροής του ΑΠ 7 σημειώνονται τα εξής:

- ο Το φυσικό αντικείμενο των ενταγμένων έργων στον Άξονα Προτεραιότητας 7 καλύπτει πλήρως ή υπερκαλύπτει τον προγραμματισμένο στόχο των δεικτών.
- ο Μηδενικό ποσοστό υλοποίησης εμφανίζει ο δείκτης που αφορά τα επικοινωνιακά σχέδια δράσης. Οι υπόλοιποι 3 δείκτες του άξονα 7 εμφανίζουν ποσοστό υλοποίησης από 50% έως 87% περίπου. Εκτιμάται ότι όλοι οι δείκτες, πλην του T1650, θα παρουσιάσουν πλήρη επίτευξη ή και υπερκάλυψη των προγραμματικών τους στόχων για το 2023, με την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων εντός της ΠΠ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

3. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗΣ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

3.1. Αποτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας

Στην παρούσα Ενότητα παρουσιάζεται η πρόοδος επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας όσον αφορά στα ορόσημα του 2023 (Δείκτες εκροής και οικονομικοί δείκτες).

Άξονας Προτεραιότητας 1

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το Πλαίσιο Επιδόσεων του Άξονα Προτεραιότητας 1, το οποίο περιλαμβάνει έναν οικονομικό δείκτη, δύο δείκτες εκροής και δύο βασικά στάδια εφαρμογής. Τα στοιχεία της προόδου επίτευξης των δεικτών προέρχονται από στοιχεία καταχωρημένα στο ΟΠΣ έως 07.11.2023.

Πίνακας 27. Πλαίσιο Επιδόσεων Άξονα Προτεραιότητας 1 και πρόοδος των δεικτών του (07.11.2023)

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ/ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (07.11.2023)	ΠΟΣΟΣΤΟ
Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ		4.055	4.750	117,14%
Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K240	Ενταγμένα έργα κρατικών ενισχύσεων	αριθμός	ΕΤΠΑ	80			
Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO26	Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα	επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ		60	12	20,0%
Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K245	Αποφάσεις χρηματοδότησης κρατικών ενισχύσεων έρευνας και καινοτομίας	αριθμός	ΕΤΠΑ	30			
Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	2.967.733	73.269.987	60.727.743	82,88%

Δείκτης Εκροών CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 4.055 επιχειρήσεις και αφορά σε δράσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ, το ηλεκτρονικό εμπόριο και την αύξηση της ζήτησης για ΤΠΕ στις τοπικές επιχειρήσεις, δράσεις εκπόνησης και εφαρμογής επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια και δράσεις ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και επενδύσεις σε συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας. Ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 44/2017 της επενδυτικής προτεραιότητας 1b, τις προσκλήσεις 58/2018 και 80/2019 της 2b, την πρόσκληση 77/2019 της 3b και τις προσκλήσεις 74/2018 και 105/2020 της 3c. Στον δείκτη συμβάλλουν 4.821 ενταγμένες πράξεις, με συνολικό στόχο 4.846 επιχειρήσεις. Η υλοποίηση του δείκτη έως τον Νοέμβριο του 2023 ανέρχεται στο 117,41% του προγραμματικού στόχου, καθώς έχουν ολοκληρωθεί 4.750 επενδυτικά σχέδια. Η μεγάλη αύξηση των πράξεων που συνδέονται με τον δείκτη προέρχεται από την πρόσκληση 105/2020 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ COVID 19 ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» (4.056 πράξεις).

Δείκτης Εκροών CO26: Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα

Ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 60 επιχειρήσεις και αφορά σε δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για την υλοποίηση ερευνητικών έργων στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας και ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 44/2017. Στον δείκτη συμβάλλουν 45 ενταγμένες πράξεις, με συνολικό στόχο 70 επιχειρήσεις. Η υλοποίηση του δείκτη είναι 12 επιχειρήσεις, η οποία προέρχεται από 9 πράξεις.

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 73.269.987 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχονται σε 60.727,43 € συγχρ. ΔΔ στις 07.11.2023 και αποτελούν το 82,88% του στόχου για το 2023.

Άξονας Προτεραιότητας 2

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το Πλαίσιο Επιδόσεων του Άξονα Προτεραιότητας 2, το οποίο περιλαμβάνει έναν οικονομικό δείκτη, δύο δείκτες εκροής και δύο βασικά στάδια εφαρμογής. Τα στοιχεία της προόδου επίτευξης των δεικτών προέρχονται από στοιχεία καταχωρημένα στο ΟΠΣ έως 07.11.2023.

Πίνακας 28. Πλαίσιο Επιδόσεων Άξονα Προτεραιότητας 2 και πρόοδος των δεικτών του (07.11.2023)

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ/ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (07.11.2023)	ΠΟΣΟΣΤΟ
Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K241	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση των έργων επεξεργασίας λυμάτων	αριθμός	ΕΤΠΑ	5			
Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	ΕΤΠΑ		44.443	1.312	2,95%
Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K242	Ενταγμένα έργα πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	4			
Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO09	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις ανά έτος	ΕΤΠΑ		6.665	2.500	37,51%
Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	24.407.027	102.721.522	100.722.295	98,05%

Δείκτης Εκροών CO19: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 44.443 ισοδύναμο πληθυσμού και αφορά σε δράσεις επενδύσεων για τη διαχείριση λυμάτων. Ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 6/2015, 70/2018 και 90/2019. Στον δείκτη συμβάλουν 13 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 58.016 ισοδύναμο πληθυσμού και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 1.312, καθώς έχει ολοκληρωθεί μία μόνο από τις 13 ενταγμένες πράξεις.

Δείκτης Εκροών CO09: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 6.665 επισκέψεις/έτος, αφορά σε επενδύσεις για την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 13/2015 και 91/2019. Στο δείκτη συμβάλλουν 6 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 11.550 επισκέψεις/έτος, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί στο σύνολό τους. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 2.500 επισκέψεις/έτος, που προέρχεται από την ολοκλήρωση μίας πράξης.

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 102.721.522 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχονται σε 100.722,95 € συγχρ. ΔΔ έως 07.11.2023 και αποτελούν το 98,05% του στόχου για το 2023.

Άξονας Προτεραιότητας 3

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το Πλαίσιο Επιδόσεων του Άξονα Προτεραιότητας 3, το οποίο περιλαμβάνει έναν οικονομικό δείκτη, έναν δείκτη εκροής και ένα βασικό στάδιο εφαρμογής. Τα στοιχεία της προόδου επίτευξης των δεικτών προέρχονται από στοιχεία καταχωρημένα στο ΟΠΣ έως 07.11.2023.

Πίνακας 29. Πλαίσιο Επιδόσεων Άξονα Προτεραιότητας 3 και πρόοδος των δεικτών του (07.11.2023)

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ/ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (07.11.2023)	ΠΟΣΟΣΤΟ
Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K243	Ενταγμένα έργα οδοποιίας (ανακατασκευή ή αναβάθμιση)	αριθμός	ΕΤΠΑ	4			
Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO14	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων	χιλιόμετρα	ΕΤΠΑ		5,8	0	0,00%
Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	13.934.849	31.141.712	28.447.472	91,35%

Δείκτης Εκροών CO14: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων

Ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 5,8 χιλιόμετρα, αφορά σε δράσεις υλοποίησης υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων και ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 51/2017, 50/2017 71/2018 και 93/2020. Στο δείκτη συμβάλουν 3 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 12,8 χιλιόμετρα, οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενική.

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 31.141.712 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχονται σε 28.447.472 € συγχρ. ΔΔ έως 07.11.2023 και αποτελούν το 91,35% του στόχου για το 2023.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το Πλαίσιο Επιδόσεων του Άξονα Προτεραιότητας 4, το οποίο περιλαμβάνει έναν οικονομικό δείκτη, δύο δείκτες εκροής και δύο βασικά στάδια εφαρμογής. Τα στοιχεία της προόδου επίτευξης των δεικτών προέρχονται από στοιχεία καταχωρημένα στο ΟΠΣ έως 07.11.2023.

Πίνακας 30. Πλαίσιο Επιδόσεων Άξονα Προτεραιότητας 4 και πρόοδος των δεικτών του (07.11.2023)

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ/ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (07.11.2023)	ΠΟΣΟΣΤΟ
Ειδικός Δείκτης Εκροής	SO031	Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ		89	82	92,13%
Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K246	Συμβάσεις που έχουν υπογραφεί για την υλοποίηση πράξεων κοινωνικών υποδομών	αριθμός		2			
Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO35	Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ		60.000	51.113	85,19%
Κύριο Στάδιο Υλοποίησης	K244	Ενταγμένα έργα εκπαίδευσης (όλες οι βαθμίδες)	αριθμός	ΕΤΠΑ	3			
Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	5.423.518	31.528.209	33.240.481	105,43%

Δείκτης Εκροών SO031: Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται

Ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 89 φυσικά πρόσωπα και αφορά σε δράσεις δημιουργίας υποδομών και προμήθειας εξοπλισμού κοινωνικών δομών για την κάλυψη αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την φτώχεια και σε ειδικές ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 7/2015, 49/2017 και 94/2020 και συνδέεται με 3 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 172 φυσικά πρόσωπα, εκ των οποίων οι 2 έχουν ολοκληρωθεί, με αποτέλεσμα το ποσοστό επίτευξης του δείκτη να ανέρχεται στο 92,1% (82 φυσικά πρόσωπα).

Δείκτης Εκροών CO35: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης

Ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 60.000 φυσικά πρόσωπα και αφορά σε δράσεις κατασκευής ή αναβάθμισης υποδομών προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης, τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης ενηλίκων. Ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 18/2016, 37/2017, 41/2017, 45/2017 και 46/2017. Στον δείκτη συμβάλουν 7 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 60.410 άτομα. Καθώς έχουν ολοκληρωθεί 3 από τις ανωτέρω πράξεις, με τιμή 51.113 άτομα, το ποσοστό επίτευξης του στόχου είναι 85,2%.

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 31.528.209 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχονται σε 33.240.481 € συγχρ. ΔΔ έως 07.11.2023 και αποτελούν το 105,43% του στόχου για το 2023.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται το Πλαίσιο Επιδόσεων του Άξονα Προτεραιότητας 5, το οποίο περιλαμβάνει έναν οικονομικό δείκτη και δύο δείκτες εκροής. Τα στοιχεία της προόδου επίτευξης των δεικτών προέρχονται από στοιχεία καταχωρημένα στο ΟΠΣ έως 07.11.2023.

Πίνακας 31. Πλαίσιο Επιδόσεων Άξονα Προτεραιότητας 5 και πρόοδος των δεικτών του (07.11.2023)

ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ/ ΒΑΣΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΟΡΟΣΗΜΟ 2018	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (07.11.2023)	ΠΟΣΟΣΤΟ
Ειδικός Δείκτης Εκροής	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	αριθμός	EKT	3.248	11.434	14.670	128,30%
Ειδικός Δείκτης Εκροής	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	EKT	34	42	48	114,29%
Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	EKT	8.536.261	52.292.120	53.120.369	101,58%

Δείκτης Εκροών 10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων

Ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 11.434 άτομα και αφορά σε δράσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής, δράσεις εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής και δράσεις παροχής υπηρεσιών προσχολικής αγωγής και υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ. Ο δείκτης ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 01/2015, 29/2016, 42/2017, 66/2018, 83/2019, 95/2020 και 109/2021 της επενδυτικής προτεραιότητας 9i και τις προσκλήσεις 2/2015, 30/2016, 43/2017, 67/2018, 84/2019, 100/2020 και 110/2021 της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii. Στον δείκτη συμβάλλουν 7 ενταγμένες πράξεις της Ε.Π. 9i με τιμή υλοποίησης 14.264 και 7 πράξεις της Ε.Π. 9iii με τιμή υλοποίησης 406. Ο στόχος του δείκτη έχει ήδη υπερκαλυφθεί από την υλοποίηση των ενταγμένων έργων.

Δείκτης Εκροών 05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Ο στόχος του δείκτη για το 2023 είναι 42 δομές και αφορά σε δράσεις υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση (Κέντρα Κοινότητας), δράσεις σχετικές με τη λειτουργία Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ), Κέντρων Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία, δομών

και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας (Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης) και δράσεις για δομές αστέγων, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών (Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο). Ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 25/2016 και 54/2018 της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii, τις προσκλήσεις 20/2016, 21/2016, 33/2016 και 87/2019 της επενδυτικής προτεραιότητας 9iii και τις προσκλήσεις 26/2016, 27/2016 και 28/2016 της επενδυτικής προτεραιότητας 9iv. Στον δείκτη συμβάλλουν 10 ενταγμένες πράξεις της Ε.Π 9ii με τιμή υλοποίησης 11 δομές, 7 πράξεις στην Ε.Π. 9iii με τιμή υλοποίησης 11 δομές και 19 πράξεις στην Ε.Π. 9iv με τιμή υλοποίησης 26 δομές. Το ποσοστό επίτευξης του στόχου ανέρχεται σε 114,29%. (υπερκάλυψη του στόχου).

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 52.292.120 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχονται σε 53.120.369 € συγχρ. ΔΔ έως 07.11.2023 και αποτελούν το 101,58% του στόχου για το 2023.

3.2. Εκτίμηση της δυνατότητας επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων

Στην παρούσα Ενότητα γίνεται εκτίμηση της επίτευξης ή μη επίτευξης των στόχων των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων για το 2023 (Δείκτες Εκροής και οικονομικοί δείκτες). Η εκτίμηση στηρίζεται στην πορεία υλοποίησης των πράξεων που συμβάλλουν στο Πλαίσιο Επιδόσεων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα στοιχεία των σχετικών δεικτών που έχουν εισαχθεί στο ΟΠΣ (07.11.2023), στο πρόσφατο σχέδιο δράσης του προγράμματος, στην τελευταία αναθεώρηση του προγράμματος (2021) και στην ετήσια έκθεση υλοποίησης του 2022. Η ανάλυση παρουσιάζεται στη συνέχεια ανά δείκτη του Πλαισίου Επιδόσεων, σε επίπεδο Άξονα Προτεραιότητας.

Άξονας Προτεραιότητας 1

Δείκτης Εκροών CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 4.846 επιχειρήσεις και υπερκαλύπτει τον στόχο για το 2023 (4.055). Ο βαθμός επίτευξης του στόχου είναι 117,14%, καθώς έχουν ολοκληρωθεί 4.750 επενδυτικά σχέδια. Ο στόχος του δείκτη έχει ήδη υπερκαλυφθεί σε υψηλό βαθμό από την υλοποίηση των σχετικών έργων.

Δείκτης Εκροών CO26: Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 70 επιχειρήσεις και υπερκαλύπτει τον στόχο για το 2023 (60) κατά 103,1%, με το βαθμό επίτευξης του στόχου να είναι μηδενικός, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές πράξεις. Ο στόχος του δείκτη κρίνεται ότι θα επιτευχθεί, διότι προβλέπεται ότι οι ανωτέρω πράξεις θα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα εντός της προγραμματικής περιόδου.

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 73.269.987,00 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 1 ανέρχονται σε 60.727.743,03 € έως 07.11.2023 και αποτελούν το 82,88% του στόχου για το 2023. Το ποσοστό επίτευξης μπορεί να θεωρηθεί χαμηλό για την παρούσα χρονική στιγμή. Με βάση το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης του προγράμματος, καθώς και τις εκτιμήσεις για το βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων του Προγράμματος που παρουσιάζονται σε επόμενο Κεφάλαιο, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 θα καλυφθεί σε υψηλό ποσοστό (γύρω στο 98%), αλλά όχι πλήρως.

Άξονας Προτεραιότητας 2

Δείκτης Εκροών CO19: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 58.016 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (44.443). Ο βαθμός επίτευξης του προγραμματικού στόχου είναι πολύ χαμηλός (2,95%), δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν συνολικά 13 πράξεις που

αφορούν επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων, εκ των οποίων οι 5 έχουν χαρακτηριστεί ως κατηγορία 3 - phasing στο πρόσφατο σχέδιο δράσης του προγράμματος, 2 έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας 5 – προς απένταξη και 1 πράξη στην κατηγορία 4α - ημιτελής. Επιπλέον, πρέπει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, ο δείκτης μετράει άτομα σε νοικοκυριά με πραγματική (όχι εν δυνάμει) σύνδεση με το σύστημα επεξεργασίας λυμάτων, τα οποία δεν εξυπηρετούνταν από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) και για το λόγο αυτό η επίτευξη του δείκτη δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων του προγράμματος, αλλά και από άλλους παράγοντες. Επομένως, ο δείκτης παρουσιάζει μεγάλη επισφάλεια και το πιθανότερο είναι να καλυφθεί σε ένα σχετικά χαμηλό ποσοστό (24,6% από την ολοκλήρωση 5 σχετικών πράξεων) και να μην επιτευχθεί πλήρως ο στόχος για το 2023.

Δείκτης Εκρών CO09: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 11.550 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (6.665) κατά 173,3%, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι σχετικά χαμηλός (37,51%), δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι ενταγμένες πράξεις. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί, παρόλο που υπάρχει κάποια επισφάλεια εξαιτίας του γεγονότος ότι ο δείκτης υπολογίζει στην ουσία αποτέλεσμα και όχι εκροή του προγράμματος και η επίτευξη του στόχου επηρεάζεται και από άλλους παράγοντες, πέρα από την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων. Ωστόσο, βάσει του υψηλού ποσοστού υπερκάλυψης του στόχου από τα ενταγμένα έργα, θεωρείται ότι θα υπάρξει πλήρης επίτευξη, πιθανώς και υπερκάλυψη, του στόχου για το 2023, καθώς αναμένεται να ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα όλες οι σχετικές πράξεις πλην μίας (που έχει χαρακτηριστεί ως κατηγορία 4α στο Σχέδιο Δράσης).

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 102.721.522 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 2 ανέρχονται σε 100.722.295 € συγχρ. ΔΔ έως 07.11.2023 και αποτελούν το 98,05% του στόχου για το 2023. Με βάση το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης του προγράμματος, καθώς και τις εκτιμήσεις για το βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων του Προγράμματος που παρουσιάζονται σε επόμενο Κεφάλαιο, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 θα καλυφθεί σε ποσοστό μεγαλύτερο του 100%.

Άξονας Προτεραιότητας 3

Δείκτης Εκρών CO14: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 12,8 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (5,8) κατά 220,7%, με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να είναι μηδενικός, δεδομένου ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι ενταγμένες πράξεις. Στον δείκτη συνεισφέρουν 3 ενταγμένες πράξεις που σχετίζονται με έργα υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο ολοκληρωμένων εδαφικών επενδύσεων. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό (77,6%) όχι όμως πλήρως, αφού σύμφωνα με το πρόσφατο σχέδιο δράσης του Προγράμματος μία από τις σχετικές πράξεις με τιμή στόχου 4,5 προβλέπεται να ολοκληρωθεί εντός της ΠΠ, ενώ οι άλλες 2 έχουν χαρακτηριστεί κατηγορίας 3-phasing.

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 31.141.712 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 3 ανέρχονται σε 28.447.472 € συγχρ. ΔΔ έως 07.11.2023 και αποτελούν το 91,35% του στόχου για το 2023. Με βάση το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης του προγράμματος, καθώς και τις εκτιμήσεις για το βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων του Προγράμματος που παρουσιάζονται σε επόμενο Κεφάλαιο, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 θα υπερκαλυφθεί σε ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του 100%.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Δείκτης Εκρών SO031: Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 172 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (89), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 92,1% καθώς έχουν

ολοκληρωθεί 2 από τις 3 ενταγμένες πράξεις. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη δεν θα καλυφθεί πλήρως, αλλά σε μεγάλο βαθμό (92,1%), αφού στο σχέδιο δράσης δεν προβλέπεται η ολοκλήρωση της τρίτης πράξης που συμβάλλει στο δείκτη (έχει χαρακτηριστεί κατηγορίας 4α- ημιτελής).

Δείκτης Εκροών CO35: Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 60.410 και υπερκαλύπτει τον προγραμματικό στόχο (60.000), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 85,2%, δεδομένου ότι έχουν ολοκληρωθεί 3 από τις 7 ενταγμένες πράξεις. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα υπερκαλυφθεί αφού όλες οι ενταγμένες πράξεις προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου.

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 31.528.209 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 4 ανέρχονται σε 33.240.481 € συγχρ. ΔΔ έως 07.11.2023 και αποτελούν το 105,43% του στόχου για το 2023. Με βάση το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης του προγράμματος, καθώς και τις εκτιμήσεις για το βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων του Προγράμματος που παρουσιάζονται σε επόμενο Κεφάλαιο, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023, ο οποίος έχει ήδη υπερκαλυφθεί, θα παρουσιάσει ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης έως το τέλος του 2023.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Δείκτης Εκροών 10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 14.588 συμμετέχοντες και υπερκαλύπτει τον στόχο για το 2023 (11.434), με το βαθμό επίτευξης του στόχου να ανέρχεται στο 128,3% του προγραμματικού στόχου. Στον δείκτη συμβάλλουν 14 ενταγμένες πράξεις και η σωρευτική τιμή υλοποίησης έως τον Νοέμβριο του 2023 ανέρχεται σε 14.670 άτομα. Παρατηρείται ότι ο στόχος για το 2023 έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Σημειώνεται ότι ο μεγάλος βαθμός υπερκάλυψης του στόχου του δείκτη οφείλεται και στο γεγονός ότι οι σχετικές δράσεις χρηματοδοτούνται και από Εθνικούς Πόρους, εκτός των διατιθέμενων πόρων του ΕΠ. Η τιμή υλοποίησης του δείκτη αναφέρεται στο σύνολο των ωφελούμενων από τις συγκεκριμένες δράσεις, ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης, καθώς δεν είναι εφικτός ο διαχωρισμός τους.

Δείκτης Εκροών 05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Ο στόχος των ενταγμένων έργων που τροφοδοτούν το δείκτη είναι 48 δομές και υπερκαλύπτει τον στόχο για το 2023 (42), με το βαθμό επίτευξης του προγραμματικού στόχου να ανέρχεται στο 114,29%. Στον δείκτη συμβάλλουν 36 ενταγμένες πράξεις, με συνολική τιμή στόχου 49 δομές, με τις 48 δομές να έχουν ήδη ολοκληρωθεί. Παρατηρείται ότι ο στόχος για το 2023 έχει ήδη υπερκαλυφθεί από την υλοποίηση των ενταγμένων έργων.

Οικονομικός Δείκτης F100: Ποσό πιστοποιημένων δαπανών

Ο στόχος του οικονομικού δείκτη για το 2023 είναι 52.292.120 €. Οι πιστοποιημένες δαπάνες του Άξονα Προτεραιότητας 5 ανέρχονται σε 53.120.369 € συγχρ. ΔΔ έως 07.11.2023 και αποτελούν το 101,58% του στόχου για το 2023. Με βάση το πρόσφατο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, καθώς και τις εκτιμήσεις για το βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων, που παρουσιάζονται σε επόμενη Ενότητα, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 θα υπερκαλυφθεί σε ποσοστό αρκετά μεγαλύτερο του 100%.

3.3. Συμπεράσματα και προτάσεις από την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων

Με βάση την ανάλυση του Πλαισίου Επιδόσεων που παρουσιάζεται παραπάνω ανά Άξονα Προτεραιότητας, προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα:

- ▶ Για τον Άξονα Προτεραιότητας 1, εκτιμάται ότι το σύνολο των δεικτών εκροών του Πλαισίου Επιδόσεων θα σημειώσουν πλήρη επίτευξη ή ακόμη και υπερκάλυψη του στόχου για το 2023, ενώ ο οικονομικός δείκτης προβλέπεται να επιτευχθεί σε ποσοστό 98% περίπου.
- ▶ Για τον Άξονα Προτεραιότητας 2, εκτιμάται ότι το σύνολο των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων θα σημειώσουν πλήρη επίτευξη ή ακόμη και υπερκάλυψη του στόχου για το 2023. Εξάιρεση αποτελεί ο δείκτης CO19 «Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων», ο οποίος αναμένεται ότι θα παρουσιάσει επίτευξη του στόχου σε πολύ χαμηλό ποσοστό (25% περίπου), καθώς τα περισσότερα από τα ενταγμένα έργα που συμβάλλουν στον δείκτη προβλέπεται ότι δεν θα ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου.
- ▶ Για τον Άξονα Προτεραιότητας 3, εκτιμάται ότι ο δείκτης εκροών του Πλαισίου Επιδόσεων θα παρουσιάσει επίτευξη του στόχου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 75%, όχι όμως πλήρη επίτευξη, καθώς δύο από τις τρεις ενταγμένες πράξεις που συμβάλλουν στον δείκτη προβλέπεται ότι δεν θα ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου. Ο οικονομικός δείκτης F100 του άξονα εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί σε ένα ποσοστό πολύ μεγαλύτερο του 100%.
- ▶ Για τον Άξονα Προτεραιότητας 4, εκτιμάται ότι το σύνολο των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων θα σημειώσουν πλήρη επίτευξη ή ακόμη και υπερκάλυψη του στόχου για το 2023. Εξάιρεση αποτελεί ο δείκτης SO031 «Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται», ο στόχος του οποίου εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί κατά 92% περίπου, καθώς μία από τις σχετικές πράξεις έχει χαρακτηριστεί ως ημιτελής στο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος.
- ▶ Για τον Άξονα Προτεραιότητας 5, εκτιμάται ότι το σύνολο των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων θα σημειώσουν πλήρη επίτευξη ή ακόμη και υπερκάλυψη του στόχου για το 2023.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται οι εκτιμήσεις για το βαθμό επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Πίνακας 32. Εκτίμηση του βαθμού επίτευξης των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 για το 2023, ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΞΟΝΑΣ	ΤΥΠΟΣ ΔΕΙΚΤΗ	ΚΩΔΙΚΟΣ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΑΜΕΙΟ	ΣΤΟΧΟΣ 2023	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ (07.11.2023)	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (07.11.2023)	Εκτίμηση Επίτευξης στόχου 2023
ΑΠ1	Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO02	Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις	επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	4.055	4.750	117,14%	>100%
	Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO26	Έρευνα και καινοτομία: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα	επιχειρήσεις	ΕΤΠΑ	60	12	20,0%	>100%
	Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	73.269.987,00	60.727.743,03	82,88%	>85%
ΑΠ2	Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO19	Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων	Ισοδύναμο πληθυσμού	ΕΤΠΑ	44.443	1.312	2,95%	<65%
	Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO09	Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών	Επισκέψεις ανά έτος	ΕΤΠΑ	6.665	2.500	37,51%	>100%
	Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	102.721.522	100.722.295	98,05%	>100%
ΑΠ3	Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO14	Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων	χιλιόμετρα	ΕΤΠΑ	5,8	0	0,00%	>75%
	Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	31.141.712	28.447.472	91,35%	>100%
ΑΠ4	Ειδικός Δείκτες Εκροής	SO031	Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	89	82	92,13%	>85%
	Κοινοί Δείκτες Εκροής	CO35	Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης	φυσικά πρόσωπα	ΕΤΠΑ	60.000	51.113	85,19%	>100%
	Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΤΠΑ	31.528.209	33.240.481	105,43%	>100%
ΑΠ5	Ειδικός Δείκτες Εκροής	10501	Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων	αριθμός	ΕΚΤ	11.434	14.670	128,30%	>100%
	Ειδικός Δείκτες Εκροής	05502	Αριθμός υποστηριζόμενων δομών	αριθμός	ΕΚΤ	42	48	114,29%	>100%
	Οικονομικός	F100	Ποσό πιστοποιημένων δαπανών	ευρώ	ΕΚΤ	52.292.120	53.120.369	101,58%	>100%

Με βάση το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την αξιολόγηση του Πλαισίου Επιδόσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, η επιτυχία επίτευξης των στόχων για το 2023 ελέγχεται ως εξής:

- ▶ Αν σε έναν Άξονα Προτεραιότητας/Κατηγορία Περιφέρειας περιλαμβάνονται έως δυο (2) δείκτες, θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, αν οι δείκτες αυτοί έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 65% της τιμής των στόχων για το 2023 για τον καθένα δείκτη.
- ▶ Αν σε έναν Άξονα Προτεραιότητας/Κατηγορία Περιφέρειας περιλαμβάνονται περισσότεροι από δύο (2) δείκτες, θεωρείται ότι έχουν επιτευχθεί οι στόχοι, αν όλοι οι δείκτες που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επιδόσεων, εκτός από έναν, έχουν επιτύχει τουλάχιστον το 65% της τιμής των στόχων για το 2023.

Με βάση τα ανωτέρω, καθώς και την απαιτούμενη (από τη σύμβαση) ανάλυση της εκτίμησης επίτευξης των στόχων των δεικτών του ΠΕ, οι δείκτες του Πλαισίου Επιδόσεων κατηγοριοποιούνται σε πέντε κατηγορίες, ανάλογα με τον εκτιμώμενο βαθμό επίτευξης του στόχου για το 2023, ως ακολούθως:

Κατηγορία	% Επίτευξης
A	Ποσοστό Επίτευξης $\geq 100\%$
B	$85\% \leq$ Ποσοστό Επίτευξης $< 100\%$
Γ	$75\% \leq$ Ποσοστό Επίτευξης $< 85\%$
Δ	$65\% \leq$ Ποσοστό Επίτευξης $< 75\%$
E	Ποσοστό Επίτευξης $< 65\%$

Με βάση τα ανωτέρω, στους Πίνακες που ακολουθούν παρατίθεται η κατηγοριοποίηση των δεικτών του Πλαισίου Επιδόσεων του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου, ανά Άξονα Προτεραιότητας, με βάση τις εκτιμήσεις για το βαθμό επίτευξης των στόχων του 2023.

Πίνακας 33. Κατηγοριοποίηση Δεικτών Εκρών & F100 του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΠ	Δείκτες Εκρών						F100					
	A	B	Γ	Δ	E	Σύνολο	A	B	Γ	Δ	E	Σύνολο
1	2	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	1
2	1	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	1
3	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1
4	1	1	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1
5	2	0	0	0	0	2	1	0	0	0	0	1
Σύνολο	6	1	1	0	1	9	4	1	0	0	0	5

Πίνακας 34. Κατηγοριοποίηση Δεικτών Εκρών & F100 του Πλαισίου Επιδόσεων ανά Άξονα Προτεραιότητας

ΑΠ	A	B	Γ	Δ	E	Σύνολο	% Δεικτών Κατ. A	% Δεικτών Κατ. B	% Δεικτών Κατ. Γ	% Δεικτών Κατ. Δ	% Δεικτών Κατ. E
1	2	1	0	0	0	3	67%	33%	0%	0%	0%
2	2	0	0	0	1	3	67%	0%	0%	0%	33%
3	1	0	1	0	0	2	50%	0%	50%	0%	0%
4	2	1	0	0	0	3	67%	33%	0%	0%	0%
5	3	0	0	0	0	3	100%	0%	0%	0%	0%
Σύνολο	10	2	1	0	1	14	71%	14%	7%	0%	7%

Όπως φαίνεται από τους παραπάνω Πίνακες, από τους 9 Δείκτες Εκρών του Πλαισίου Επιδόσεων που έχουν στοχοθετηθεί για το 2023, οι 6 δείκτες (67%) εκτιμάται ότι θα επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί σε ποσοστό 100% ή μεγαλύτερο (Κατηγορία A) και 1 δείκτης (11%) εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ποσοστό επίτευξης μικρότερο του 100%, αλλά μεγαλύτερο του 85% (Κατηγορία B), 1 δείκτης (11%) θα έχει ποσοστό υλοποίησης μεταξύ 75% και 85% (Κατηγορία Γ) και ένας δείκτης (11%) θα έχει ποσοστό υλοποίησης μικρότερο του 65% (Κατηγορία E). Όσον αφορά στους οικονομικούς δείκτες, από το σύνολο των 5 οικονομικών δεικτών

του Πλαισίου Επιδόσεων που έχουν στοχοθετηθεί για το 2023, οι 4 δείκτες (80%) εκτιμάται ότι θα επιτύχουν τους στόχους που έχουν τεθεί σε ποσοστό 100% ή μεγαλύτερο (Κατηγορία Α) και 1 δείκτης (20%) εκτιμάται ότι θα παρουσιάσει ποσοστό επίτευξης μικρότερο του 100%, αλλά μεγαλύτερο του 85% (Κατηγορία Β).

Βάσει αυτών και των προϋποθέσεων επιτυχίας που αναφέρονται παραπάνω, **εκτιμάται ότι σε όλους τους Άξονες Προτεραιότητας θα σημειωθεί επιτυχία στην επίτευξη των στόχων του Πλαισίου Επιδόσεων για το 2023.**

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

4.1. Αποτίμηση της πορείας υλοποίησης του Ε.Π. σε όρους αποδοτικότητας ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Η πρόοδος υλοποίησης του οικονομικού αντικειμένου του Προγράμματος παρουσιάζεται στην Ενότητα 2.1, με ανάλυση και αποτίμηση της προόδου υλοποίησης σε όρους αποδοτικότητας (ποσοστό απορρόφησης διαθέσιμων πόρων) ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα του Προγράμματος.

Στην παρούσα Ενότητα προσεγγίζεται η αποδοτικότητα μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων της φυσικής και της οικονομικής υλοποίησης των έργων του Προγράμματος.

Για τη **μέτρηση της αποδοτικότητας των παρεμβάσεων** του Προγράμματος εφαρμόσθηκε αντίστοιχη μεθοδολογία με αυτή που εφαρμόσθηκε για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας (βλ. 2.1.6), δηλαδή μια **προσέγγιση εκ των κάτω προς τα άνω (bottom up)** αναγωγής του βαθμού υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, από το επίπεδο του Υποέργου στο επίπεδο του Έργου και στη συνέχεια στα υπερκείμενα προγραμματικά επίπεδα (Επενδυτική Προτεραιότητα, Θεματικός Στόχος, Άξονας Προτεραιότητας, Σύνολο Προγράμματος).

Η μέτρηση της αποδοτικότητας πραγματοποιείται μέσω της συνεκτίμησης στοιχείων της φυσικής και οικονομικής προόδου των ενταγμένων έργων του Προγράμματος και στη συνέχεια όλων των δομικών επιπέδων του. Η αποδοτικότητα εκφράζεται από το λόγο της φυσικής προς την οικονομική υλοποίηση και ο δείκτης αποδοτικότητας στα επιμέρους δομικά επίπεδα υπολογίζεται από το λόγο:

$$\text{Δείκτης Αποδοτικότητας (Δ.Αδ.)} = \frac{\text{Δείκτης Αποτελεσματικότητας (Δ.Αλ.)}}{\text{Ποσοστό Απορρόφηση (Δείκτης Οικονομικής Προόδου)}}$$

Ειδικότερα, ανά δομικό επίπεδο του ΕΠ, ο Δείκτης Αποδοτικότητας υπολογίζεται με τους ακόλουθους τύπους

Δομικό Επίπεδο ΕΠ	Δείκτης Αποδοτικότητας
Έργο	$(\Delta.Αδ)_E = (\Delta.Αλ.)_E / (\Delta.Οικ.Πρ.)_E$
Επενδυτική Προτεραιότητα	$(\Delta.Αδ)_{ΕΠΠρ} = (\Delta.Αλ.)_{ΕΠΠρ} / (\Delta.Οικ.Πρ.)_{ΕΠΠρ}$
Θεματικός Στόχος	$(\Delta.Αδ)_{\Theta\varsigma} = (\Delta.Αλ.)_{\Theta\varsigma} / (\Delta.Οικ.Πρ.)_{\Theta\varsigma}$
Άξονας Προτεραιότητας	$(\Delta.Αδ)_{ΑΠ} = (\Delta.Αλ.)_{ΑΠ} / (\Delta.Οικ.Πρ.)_{ΑΠ}$
Σύνολο ΕΠ	$(\Delta.Αδ)_{ΕΠ} = (\Delta.Αλ.)_{ΕΠ} / (\Delta.Οικ.Πρ.)_{ΕΠ}$

όπου:

- Δ.Αδ. = Δείκτης Αποδοτικότητας
- Δ.Αλ. = Δείκτης Αποτελεσματικότητας (βλ. 2.1.6)
- Ε = Έργο
- ΥΕ = Υποέργο
- ΕΠΠρ = Επενδυτική Προτεραιότητα
- ΘΣ = Θεματικός Στόχος
- ΑΠ = Άξονας Προτεραιότητας
- ΕΠ = Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
- Δ.Οικ.Πρ. = Δείκτης Οικονομικής Προόδου (απορρόφηση): Δαπάνες / προϋπολογισμός ένταξης

Όπως φαίνεται και από τα στοιχεία του Πίνακα που ακολουθεί, ο **Δείκτης αποδοτικότητας του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ** εμφανίζει τιμή λίγο μεγαλύτερη της μονάδας, **1,3906**, δεδομένου ότι η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων (δείκτης αποτελεσματικότητας) ακολουθείται από μικρότερο ποσοστό απορρόφησης. Ειδικότερα, ο σταθμισμένος δείκτης προόδου του φυσικού αντικειμένου των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 98,06%, ενώ η αντίστοιχη απορρόφηση του π/υ των ενταγμένων έργων παρουσιάζει υστέρηση και ανέρχεται σε 70,52%. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω μεγέθη αφορούν στο σύνολο των ενταγμένων έργων τα οποία θα συνεισφέρουν στο κλείσιμο του Προγράμματος με εκτιμώμενες δαπάνες που υπερκαλύπτουν τους διαθέσιμους πόρους (ποσοστό ολοκλήρωσης 116,3%).

Πίνακας 35. Αποδοτικότητα ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, ανά ΑΠ


ΑΠ	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές Δικαιούχου	Πληρωμές (Συγχρ. ΔΔ)	Βαρύτητα ΑΠ	Δείκτης Αποτελεσμ. ΑΠ	Σταθμισμένος Δείκτης Αποτελεσμ. ΑΠ / ΕΠ	% Απορ.	Δείκτης Αποδοτικότητας ΑΠ / ΕΠ
ΑΠ 1	93.962.464	93.955.791	77.895.909	60.727.743	22,0%	0,9865	0,2167	82,90%	1,1900
ΑΠ 2	134.281.084	129.378.471	101.565.502	100.722.295	31,4%	0,9719	0,3051	75,64%	1,2850
ΑΠ 3	83.197.061	68.275.349	28.825.902	28.447.472	19,4%	0,9829	0,1912	34,65%	2,8368
ΑΠ 4	38.420.994	37.275.761	33.348.899	33.240.481	9,0%	0,9913	0,0890	86,80%	1,1421
ΑΠ 5	71.346.902	66.631.595	56.062.787	53.120.369	16,7%	0,9840	0,1641	78,58%	1,2523
ΑΠ 6	322.962	125.380	93.976	93.976	0,1%	0,8247	0,0006	29,10%	2,8342
ΑΠ 7	6.224.912	4.541.041	3.848.200	3.848.200	1,5%	0,9575	0,0139	61,82%	1,5489
ΠΕΠ	427.756.379	400.183.389	301.641.176	280.200.537	100,0%		0,9806	70,52%	1,3906

Την υψηλότερη αποδοτικότητα εμφανίζουν οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ 3 (2,8368), δεδομένου ότι παρουσιάζουν χαμηλότερη απορρόφηση (34,65%) σε σχέση με το βαθμό της φυσικής τους ολοκλήρωσης (98,29%), γεγονός που θα πρέπει να ερμηνευθεί ως αποτέλεσμα της υστέρησης δήλωσης δαπανών σε επιμέρους έργα του Άξονα και όχι της οικονομικότερης υλοποίησής τους.


Αντίστοιχα, υψηλό δείκτη αποδοτικότητας εμφανίζει και ο ΑΠ 6 (2,8342), δεδομένου ότι οι δράσεις Τεχνικής Βοήθειας ΕΚΤ που υλοποιούνται στο πλαίσιο του ΑΠ, παρουσιάζουν χαμηλότερη απορρόφηση (29,10%) σε σχέση με το βαθμό της φυσικής τους ολοκλήρωσης (82,47%), ως αποτέλεσμα της υστέρησης δήλωσης δαπανών σε επιμέρους έργα.

Στους υπόλοιπους Άξονες Προτεραιότητας η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου ακολουθείται από αντίστοιχη πρόοδο του οικονομικού αντικειμένου, με αποτέλεσμα ο δείκτης αποδοτικότητας να διαμορφώνεται λίγο πάνω από την μονάδα.

Διάγραμμα 53. Δείκτης Αποδοτικότητας ΑΠ / ΕΠ

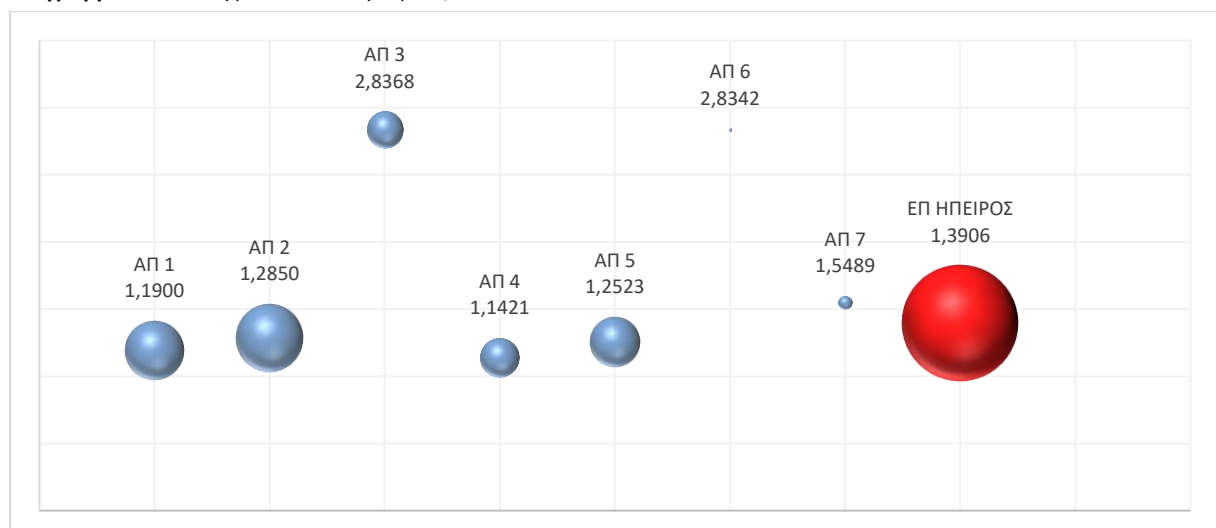

Διάγραμμα 54. Αποδοτικότητα ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ (% Φυσικής Υλοποίησης / % Απορρόφησης)

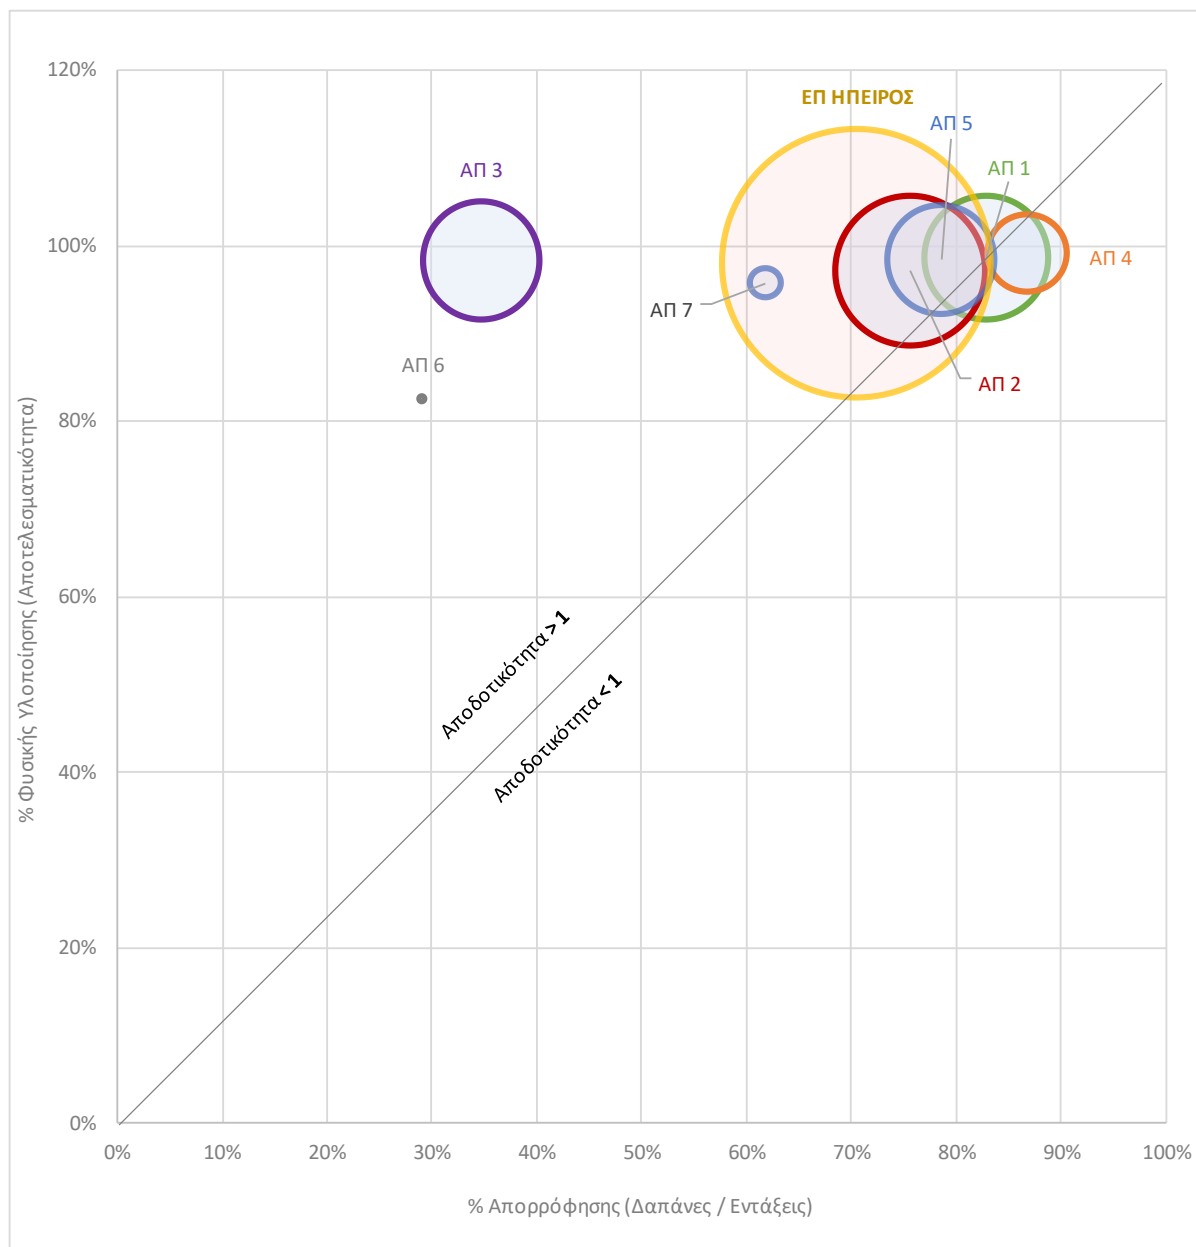


Εξετάζοντας το Δείκτη Αποδοτικότητας στο επίπεδο των Θεματικών Στόχων, προκύπτουν τα ακόλουθα:

- Την υψηλότερη αποδοτικότητα παρουσιάζουν οι παρεμβάσεις του ΘΣ 7 (δείκτης αποδοτικότητας 2,8368), όπου παρατηρείται υψηλότερη πρόοδος υλοποίησης του φυσικού έναντι του οικονομικού αντικειμένου (98,29% έναντι 34,65%),
- Την δεύτερη υψηλότερη αποδοτικότητα (με εξαίρεση την Τεχνική Βοήθεια) εμφανίζει ο ΘΣ 1 (δείκτης αποδοτικότητας 1,6944), όπου η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου υπερτερεί της απορρόφησης (99,29% έναντι 58,60%) και ακολουθεί ο ΘΣ 4 (δείκτης αποδοτικότητας 1,4972) και ο ΘΣ 5 (δείκτης αποδοτικότητας 1,3679).
- Για τους υπόλοιπους Θεματικούς Στόχους ο δείκτης αποδοτικότητας διαμορφώνεται λίγο πάνω από την μονάδα, δεδομένου ότι η πρόοδος του φυσικού αντικειμένων των υλοποιούμενων έργων ακολουθείται με κάποια μικτή χρονική υστέρηση από αντίστοιχη πρόοδο του οικονομικού αντικειμένου τους.

Πίνακας 36. Αποδοτικότητα ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, ανά ΘΣ

ΑΠ	ΘΣ	Εντάξεις	Συμβάσεις	Πληρωμές Δικαιούχου	Πληρωμές (Συνχρ. ΔΔ)	Βαρύτητα ΘΣ στον ΑΠ	Δείκτης Αποτελ. ΘΣ	Σταθμισμένος Δείκτης Αποτελ. ΘΣ / ΑΠ	% Απορ.	Δείκτης Αποδοτικότητας ΘΣ/ΑΠ
ΑΠ 1	ΘΣ1	11.675.239	11.706.467	6.841.180	4.938.678	11,87%	12,43%	0,9929	0,1234	58,60%
	ΘΣ2	10.221.607	10.183.707	7.653.513	5.929.768	10,39%	10,88%	0,9963	0,1084	74,88%
	ΘΣ3	72.065.617	72.065.617	63.401.217	49.859.296	77,74%	76,70%	0,9840	0,7547	87,98%
ΑΠ 1 Σύνολο		93.962.464	93.955.791	77.895.909	60.727.743	100,00%		0,9865	82,90%	1,1900
ΑΠ 2	ΘΣ4	44.184.343	42.577.119	28.212.981	28.094.970	32,90%	0,9560	0,3146	63,85%	1,4972
	ΘΣ5	13.214.730	11.729.169	9.028.332	9.016.944	9,84%	0,9345	0,0920	68,32%	1,3679
	ΘΣ6	76.882.011	75.072.183	64.324.189	63.610.381	57,25%	0,9873	0,5653	83,67%	1,1800
ΑΠ 2 Σύνολο		134.281.084	129.378.471	101.565.502	100.722.295	100,00%		0,9719	75,64%	1,2850
ΑΠ 3	ΘΣ7	83.197.061	68.275.349	28.825.902	28.447.472	100,00%	0,9829	0,9829	34,65%	2,8368
ΑΠ 3 Σύνολο		83.197.061	68.275.349	28.825.902	28.447.472	100,00%		0,9829	34,65%	2,8368
ΑΠ 4	ΘΣ10	21.630.824	20.785.823	19.213.861	18.880.188	56,30%	0,9893	0,5570	88,83%	1,1137
	ΘΣ9_ΕΤΠΑ	16.790.169	16.489.938	14.135.039	14.360.293	43,70%	0,9938	0,4343	84,19%	1,1805
ΑΠ 4 Σύνολο		38.420.994	37.275.761	33.348.899	33.240.481	100,00%		0,9913	86,80%	1,1421
ΑΠ 5	ΘΣ8	6.836.724	6.903.360	6.696.836	5.023.807	9,58%	0,9839	0,0943	97,95%	1,0044
	ΘΣ9_ΕΚΤ	64.510.178	59.728.235	49.365.951	48.096.562	90,42%	0,9840	0,8897	76,52%	1,2858
ΑΠ 5 Σύνολο		71.346.902	66.631.595	56.062.787	53.120.369	100,00%		0,9840	78,58%	1,2523
ΑΠ 6	TB	322.962	125.380	93.976	93.976	100,00%	0,8247	0,8247	29,10%	2,8343
ΑΠ 6 Σύνολο		322.962	125.380	93.976	93.976	100,00%		0,8247	29,10%	2,8342
ΑΠ 7	TB	6.224.912	4.541.041	3.848.200	3.848.200	100,00%	0,9575	0,9575	61,82%	1,5489
ΑΠ 7 Σύνολο		6.224.912	4.541.041	3.848.200	3.848.200	100,00%		0,9575	61,82%	1,5489

Διάγραμμα 55. Δείκτης Αποδοτικότητας ΘΣ/ΕΠ

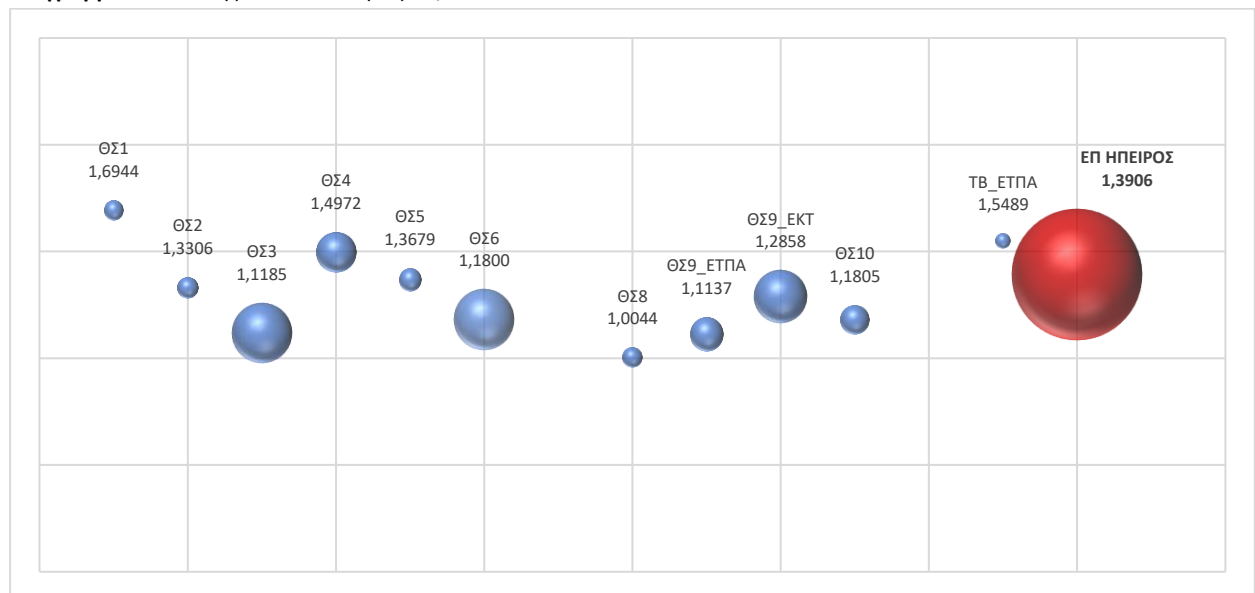

Αναλύοντας το Δείκτη Αποδοτικότητας σε επίπεδο Επενδυτικής Προτεραιότητας, προκύπτουν τα εξής:


- Τον υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας εμφανίζει η ΕπΠρ 9ν, όπου η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (δείκτης αποτελεσματικότητα 0,9757) δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη πρόοδο στη δήλωση δαπανών (19,11%).
- Τον δεύτερο υψηλότερο δείκτη αποδοτικότητας εμφανίζει η ΕπΠρ 2c, όπου και σε αυτή την περίπτωση η πρόοδος υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (δείκτης αποτελεσματικότητα 0,9881) δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη πρόοδο στη δήλωση δαπανών (24,38%).

- Ακολουθούν οι ΕπΠρ 7b & 9vi με δείκτη αποδοτικότητας 2,8368 & 2,7566 αντίστοιχα, όπου παρατηρείται υστέρηση στη δήλωση του οικονομικού αντικείμενου, που αντιστοιχεί στο υλοποιηθέν φυσικό αντικείμενο.

Πίνακας 37. Αποδοτικότητα ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, ανά ΕπΠρ

ΕπΠρ	Εντάξεις	Συμβάσεις	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΔ)	ΠΛΗΡΩΜΕΣ (ΣΥΓΧΡ ΔΔ)	Δείκτης Αποτελεσματο. ΕπΠρ	% Απορρόφησης Ενταγμένων Έργων ΕπΠρ	Δείκτης Αποδοτικότητας ΕπΠρ
1b	11.675.239	11.706.467	6.841.180	4.938.678	0,9929	58,60%	1,6944
2b	7.024.501	7.024.501	6.874.085	5.150.341	1,0000	97,86%	1,0219
2c	3.197.106	3.159.206	779.428	779.428	0,9881	24,38%	4,0532
3a	13.843.283	13.843.283	6.630.952	5.361.178	0,9301	47,90%	1,9417
3b	116.700	116.700	78.395	78.395	0,9857	67,18%	1,4673
3c	58.105.634	58.105.634	56.691.870	44.419.724	0,9969	97,57%	1,0217
4c	30.803.092	30.244.459	23.458.753	23.340.741	0,9593	76,16%	1,2596
4e	13.381.251	12.332.660	4.754.228	4.754.228	0,9485	35,53%	2,6695
5b	13.214.730	11.729.169	9.028.332	9.016.944	0,9345	68,32%	1,3679
6b	52.317.288	51.917.257	46.765.381	46.129.198	0,9965	89,39%	1,1148
6c	15.285.099	14.623.272	11.501.003	11.424.336	0,9693	75,24%	1,2882
6d	395.702	395.442	396.086	395.442	1,0000	100,10%	0,9990
6e	8.883.921	8.136.213	5.661.719	5.661.406	0,9636	63,73%	1,5119
7b	83.197.061	68.275.349	28.825.902	28.447.472	0,9829	34,65%	2,8368
9a	21.130.824	20.406.792	19.213.861	18.880.188	0,9914	90,93%	1,0903
9b	500.000	379.031			0,9000	0,00%	
10a	16.790.169	16.489.938	14.135.039	14.360.293	0,9938	84,19%	1,1805
8i	6.836.724	6.903.360	6.696.836	5.023.807	0,9839	97,95%	1,0044
9i	19.287.865	19.287.865	19.255.763	18.014.403	1,0000	99,83%	1,0017
9ii	3.981.408	2.147.326	2.068.278	2.052.437	1,0000	51,95%	1,9250
9iii	11.292.262	10.912.504	8.164.170	8.157.770	1,0000	72,30%	1,3831
9iv	27.791.904	25.935.912	19.510.088	19.504.301	0,9876	70,20%	1,4068
9v	1.008.624	1.008.624	192.708	192.708	0,9757	19,11%	5,1066
9vi	1.148.116	436.004	174.943	174.943	0,4200	15,24%	2,7566
TB-EKT	322.962	125.380	93.976	93.976	0,8247	29,10%	2,8343
TB-ΕΤΠΑ	6.224.912	4.541.041	3.848.200	3.848.200	0,9575	61,82%	1,5489

Διάγραμμα 56. Δείκτης Αποδοτικότητας ΕπΠρ/ΕΠ

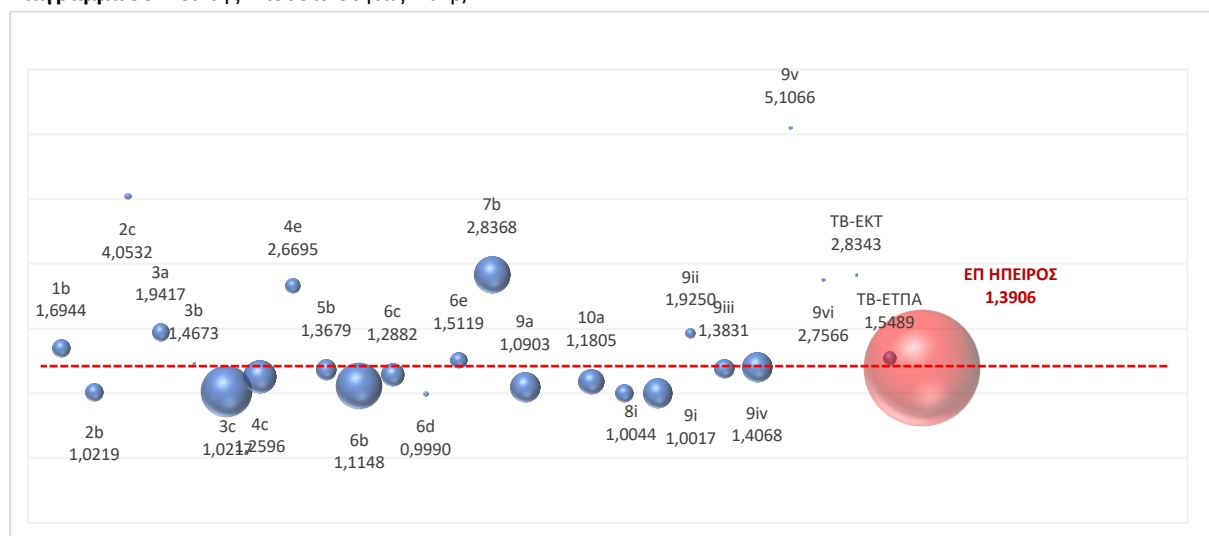

4.2. Εκτίμηση της επάρκειας των διατιθέμενων πόρων για την υλοποίηση των παρεμβάσεων του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτιμήσεις του Συμβούλου Αξιολόγησης για το βαθμό ολοκλήρωσης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020, στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου.

Ο προσδιορισμός του βαθμού ολοκλήρωσης του ΠΕΠ ανά Άξονα Προτεραιότητας και Θεματικό Στόχο, μέχρι το τέλος της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου, στηρίζεται σε εκτιμήσεις σχετικά με το βαθμό ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος (Ιούλιος 2023).

Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν εκτιμήσεις οικονομικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα αξιολόγησης της επικινδυνότητας των έργων του ΠΕΠ, που παρουσιάζονται συνοπτικά στην επόμενη υποενότητα.

4.2.1. Βαθμός επικινδυνότητας των έργων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Με βάση την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας τους, τα ενταγμένα έργα του ΕΠ κατατάσσονται σε 3 κατηγορίες:

- ▶ Κατηγορία 1: Μηδενικής ή Χαμηλής Επικινδυνότητας
- ▶ Κατηγορία 2: Μέσης Επικινδυνότητας
- ▶ Κατηγορία 3: Υψηλής Επικινδυνότητας

Στην πρώτη κατηγορία κατατάσσονται τα ενταγμένα έργα του Προγράμματος τα οποία, είτε έχουν ήδη ολοκληρωθεί, είτε παρουσιάζουν ομαλή πορεία υλοποίησης και εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2023.

Στην δεύτερη κατηγορία της μέσης επικινδυνότητας, κατατάσσονται τα έργα τα οποία παρουσιάζουν υστέρηση στην υλοποίηση τους (ρυθμός δαπανών χαμηλότερος από το μέσο όρο του Προγράμματος).

Στην τρίτη κατηγορία της υψηλής επικινδυνότητας, κατατάσσονται τα έργα τα οποία παρουσιάζουν μεγάλη υστέρηση στην υλοποίησή τους, καθώς και τα έργα που εκτιμάται ότι δεν θα ολοκληρωθούν εμπρόθεσμα έως το τέλος του 2023. Ειδικότερα, ως Υψηλής Επικινδυνότητας Έργα εκτιμώνται τα ακόλουθα:

- Έργα που δεν ολοκληρώνονται εντός της τρέχουσας ΠΠ και θα μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027 (κατάσταση 6)
- Έργα phasing (κατάσταση 3), ανάλογα με την πρόοδο υλοποίησής τους σε σχέση με τον εκτιμώμενο προϋπολογισμό ολοκλήρωσης της α' φάσης.
- Έργα κατάστασης 1 τα οποία παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση στην υλοποίησή τους και εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν χαμηλό βαθμό ολοκλήρωσης στο τέλος του 2023.
- Έργα προς απένταξη (κατάσταση 5)

Επισημαίνεται ότι για την κατηγοριοποίηση των έργων του Προγράμματος ελήφθησαν υπόψη συνδυαστικά τα ακόλουθα:

- η υφιστάμενη πρόοδος υλοποίησης του έργου
- η πλήρης συμβασιολογία ή μη του έργου
- το ύψος των αναμενόμενων νέων δαπανών για την κάλυψη της εκτίμησης ολοκλήρωσης του έργου
- το εκτιμώμενο ποσοστό ολοκλήρωσης του έργου

Με βάση την εκτίμηση του βαθμού επικινδυνότητας τους, τα ενταγμένα έργα του ΠΕΠ κατατάσσονται στις ανωτέρω 3 κατηγορίες ως ακολούθως:

Πίνακας 38. Κατανομή π/υ ενταγμένων έργων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 με βάση το βαθμό επικινδυνότητάς τους ανά ΑΠ & ΘΣ

					ΕΚ. €
ΑΠ	ΘΣ	1-Μηδενικής ή Χαμηλής Επικινδυνότητας	2-Μέσης Επικινδυνότητας	3-Υψηλής Επικινδυνότητας	
1	ΘΣ1	11,7		0,6	
	ΘΣ2	10,2		0,7	
	ΘΣ3	62,8		9,3	
Σύνολο ΑΠ1		84,7		10,6	
2	ΘΣ4	38,7	1,0	17,0	
	ΘΣ5	7,6	5,6	12,7	
	ΘΣ6	51,2	21,7	17,5	
Σύνολο ΑΠ2		97,5	28,3	47,2	
3	ΘΣ7	0,9		44,8	
Σύνολο ΑΠ3		0,9		44,8	
4	ΘΣ9 ΕΤΠΑ	21,1			
	ΘΣ10	11,9	4,9	0,5	
Σύνολο ΑΠ4		33,0	4,9	0,5	
5	ΘΣ8_ΕΚΤ	6,8			
	ΘΣ9_ΕΚΤ	62,8		1,2	
Σύνολο ΑΠ5		69,6		1,2	
6	TB_ΕΚΤ	0,3			
Σύνολο ΑΠ6		0,3			
7	TB_ΕΤΠΑ	6,2		0,01	
Σύνολο ΑΠ7		6,2		0,01	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ		292,2	71,3	104,2	

Από το σύνολο των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ, 70 έργα π/υ εντάξεων περίπου 104 εκ. €, χαρακτηρίζονται ως έργα υψηλής επικινδυνότητας. Τα έργα αυτά ανήκουν στους Θεματικούς Στόχους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9-ΕΚΤ και 1 έργο TB ΕΤΠΑ, π/υ 13 χιλ. €, το οποίο θα απενταχθεί, με την πλειοψηφία τους να κατατάσσονται στο ΘΣ 3 (36 έργα της πρόσκλησης «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών II», π/υ 9,28 εκ. €), ενώ λιγότερα σε πλήθος, αλλά υψηλότερης χρηματοδοτικής βαρύτητας είναι τα έργα του ΘΣ 7 (2 έργα, π/υ 44,8 εκ. €) και ακολουθεί ο ΘΣ 6 με 4 έργα, π/υ 17,5 εκ. €.

4.2.2. Εκτίμηση του βαθμού οικονομικής ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων

Για την εκτίμηση του βαθμού ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων του Προγράμματος αξιοποιήθηκαν οι προβλέψεις δαπανών στο τέλος του 2023 που περιλαμβάνονται στο επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος (Νοέμβριος 2023) και τα αποτελέσματα ανά Άξονα Προτεραιότητας και Θεματικό Στόχο παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα:

Πίνακας 39. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ανά ΑΠ & ΘΣ

ΑΠ	ΤΑΜΕΙΟ	ΘΣ	Αριθμός Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Δαπάνες	% Εντάξεων	% Συμβάσεων	% Δαπανών	π/υ Ολοκλήρωσης
1	ΕΤΠΑ	1	46	12.281.227	11.706.467	4.938.678	129,3%	123,2%	52,0%	8.779.850
		2	693	10.886.392	10.183.707	5.929.768	127,5%	119,3%	69,4%	8.440.533
		3	4.157	72.065.617	72.065.617	49.859.296	130,5%	130,5%	90,3%	54.406.260
2	ΕΤΠΑ	4	31	56.639.209	42.669.619	28.094.970	181,3%	136,6%	89,9%	40.586.793
		5	17	25.930.872	20.161.667	9.016.944	350,6%	272,6%	121,9%	11.215.233
		6	41	90.381.060	78.050.548	63.610.381	141,0%	121,8%	99,3%	73.447.165
3	ΕΤΠΑ	7	5	83.197.061	68.275.349	28.447.472	267,2%	219,2%	91,3%	48.121.838
4	ΕΤΠΑ	9	18	21.630.824	20.785.823	18.880.188	116,2%	111,7%	101,4%	16.756.143
		10	7	16.790.169	16.489.938	14.360.293	129,5%	127,1%	110,7%	18.866.077

ΑΠ	ΤΑΜΕΙΟ	ΘΣ	Αριθμός Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Δαπάνες	% Εντάξεων	% Συμβάσεων	% Δαπανών	π/υ Ολοκλήρωσης
5	ΕΚΤ	8	261	6.836.724	6.903.360	5.023.807	95,1%	96,0%	69,9%	5.194.368
		9	93	64.510.178	59.728.235	48.096.562	143,0%	132,4%	106,6%	53.308.723
6	ΕΚΤ	TB	5	322.962	125.380	93.976	112,8%	43,8%	32,8%	204.318
7	ΕΤΠΑ	TB	12	6.237.912	4.541.041	3.848.200	148,1%	107,8%	91,4%	4.359.761
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ			5.386	467.710.209	411.686.751	280.200.537	166,4%	141,4%	87,4%	343.687.062

Πηγή: Σχέδιο Δράσης ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ, Νοέμβριος 2023 | ΟΠΣ, 07.11.2023

Λαμβάνοντας υπόψη και το βαθμό επικινδυνότητας των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ και τις επιπρόσθετες παραδοχές που παρατίθενται στον ακόλουθο Πίνακα, διαμορφώνονται νέες εκτιμήσεις για το βαθμό οικονομικής ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων του Προγράμματος, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα.

Πίνακας 40. Πρόσθετες παραδοχές για την εκτίμηση του ποσοστού οικονομικής ολοκλήρωσης του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ με βάση το βαθμό επικινδυνότητας των έργων

Ποσοστό απώλειας πόρων λόγω της επικινδυνότητας των έργων		
Μηδενική – Χαμηλή Επικινδυνότητα	Μέση Επικινδυνότητα	Υψηλή Επικινδυνότητα
0%	10%	25%

Πίνακας 41. Εκτιμώμενος προϋπολογισμός ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων του ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ ανά ΑΠ & ΘΣ, λαμβάνοντας υπόψη και το βαθμός επικινδυνότητας των έργων

ΑΠ	ΤΑΜΕΙΟ	ΘΣ	Αριθμός Έργων	Εντάξεις	Συμβάσεις	Δαπάνες	π/υ Ολοκλήρωσης	π/υ Ολοκλήρωσης με βάση και την επικινδ.
1	ΕΤΠΑ	1	46	12.281.227	11.706.467	4.938.678	8.779.850	8.779.850
		2	693	10.886.392	10.183.707	5.929.768	8.440.533	8.440.533
		3	4.157	72.065.617	72.065.617	49.859.296	54.406.260	53.105.663
2	ΕΤΠΑ	4	31	56.639.209	42.669.619	28.094.970	40.586.793	39.463.924
		5	17	25.930.872	20.161.667	9.016.944	11.215.233	10.507.587
		6	41	90.381.060	78.050.548	63.610.381	73.447.165	68.757.189
3	ΕΤΠΑ	7	5	83.197.061	68.275.349	28.447.472	48.121.838	40.081.338
4	ΕΤΠΑ	9	18	21.630.824	20.785.823	18.880.188	16.756.143	15.926.216
		10	7	16.790.169	16.489.938	14.360.293	18.866.077	18.866.077
5	ΕΚΤ	8	261	6.836.724	6.903.360	5.023.807	5.194.368	5.194.368
		9	93	64.510.178	59.728.235	48.096.562	53.308.723	52.958.502
6	ΕΚΤ	TB	5	322.962	125.380	93.976	204.318	204.318
7	ΕΤΠΑ	TB	12	6.237.912	4.541.041	3.848.200	4.359.761	4.359.761
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ			5.386	467.710.209	411.686.751	280.200.537	343.687.062	326.645.326

Με βάση τις ανωτέρω παραδοχές και εκτιμήσεις, ο προβλεπόμενος προϋπολογισμός ολοκλήρωσης του Προγράμματος, ανά Άξονα Προτεραιότητας και Θεματικό Στόχο, παρουσιάζεται στον ακόλουθο Πίνακα, διακριτά για τα ακόλουθα 2 Σενάρια:

- **Σενάριο Α:** με βάση τις εκτιμήσεις του Σχεδίου Δράσης της ΕΥΔ
- **Σενάριο Β:** λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας των επιμέρους έργων του Προγράμματος.

Πίνακας 42. Προβλεπόμενος προϋπολογισμός ολοκλήρωσης του Προγράμματος, ανά ΑΠ και ΘΣ

ΑΠ	ΤΑΜΕΙΟ	ΘΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ	ΣΕΝΑΡΙΟ Α. Σχέδιο Δράσης ΕΥΔ		ΣΕΝΑΡΙΟ Β. Με βάση και την επικινδυνότητα των έργων	
				Π/Υ Ολοκλήρωσης	% Ολοκλήρ.	Π/Υ Ολοκλήρωσης	% Ολοκλήρ.
1	ΕΤΠΑ	1	9.500.000	8.779.850	92,4%	8.779.850	92,4%
1	ΕΤΠΑ	2	8.538.948	8.440.533	98,8%	8.440.533	98,8%
1	ΕΤΠΑ	3	55.231.039	54.406.260	98,5%	53.105.663	96,2%
2	ΕΤΠΑ	4	31.246.289	40.586.793	129,9%	39.463.924	126,3%
2	ΕΤΠΑ	5	7.396.094	11.215.233	151,6%	10.507.587	142,1%
2	ΕΤΠΑ	6	64.079.169	73.447.165	114,6%	68.757.189	107,3%
3	ΕΤΠΑ	7	31.141.712	48.121.838	154,5%	40.081.338	128,7%
4	ΕΤΠΑ	9	18.611.869	16.756.143	90,0%	15.926.216	85,6%
4	ΕΤΠΑ	10	12.970.340	18.866.077	145,5%	18.866.077	145,5%
5	ΕΚΤ	8	7.188.195	5.194.368	72,3%	5.194.368	72,3%
5	ΕΚΤ	9	45.103.925	53.308.723	118,2%	52.958.502	117,4%
6	ΕΚΤ	TB	286.274	204.318	71,4%	204.318	71,4%
7	ΕΤΠΑ	TB	4.210.908	4.359.761	103,5%	4.359.761	103,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ			295.504.762	343.687.062	116,3%	326.645.326	110,5%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΤΠΑ			242.926.368	284.979.653	117,3%	268.288.137	110,4%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΚΤ			52.578.394	58.707.409	111,7%	58.357.188	111,0%

4.3. Εντοπισμός τυχόν υπερβάσεων και αποκλίσεων σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και ανάλυση του βαθμού επιρροής τους στη στοχοθεσία του Πλαισίου Επιδόσεων

Με βάση τις εκτιμήσεις για την οικονομική ολοκλήρωση του Προγράμματος στο τέλος της ΠΠ 2014-2020, που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη Ενότητα 4.2, προκύπτει ότι οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι ΕΤΠΑ & ΕΚΤ του Προγράμματος θα απορροφηθούν με ασφαλή υπερδέσμευση και στα 2 Σενάρια οικονομικής ολοκλήρωσης του Προγράμματος.

Αναλυτικά:

Στο **Σενάριο Α**, με βάση τις εκτιμήσεις της ΕΥΔ που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης του ΠΕΠ, για την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων του Προγράμματος απαιτούνται συνολικοί πόροι ΕΤΠΑ ύψους 284,98 εκ. € (έναντι των διαθέσιμων 242,93 εκ. €) με αποτέλεσμα να προκύπτει επιβάρυνση των εθνικών πόρων της τάξης των 42,05 εκ. € (ποσοστό 117,3%). Αντίστοιχα, για το ΕΚΤ απαιτούνται συνολικοί πόροι ύψους 58,7 εκ. € (έναντι των διαθέσιμων 52,6 εκ. €) με αποτέλεσμα να προκύπτει επιβάρυνση στους εθνικούς πόρους της τάξης των 6,13 εκ. € (ποσοστό 111,18%).

Η **συνολική επιβάρυνση για τους εθνικούς πόρους ανέρχεται σε 48,18 εκ. €** και η υπερδέσμευση στο κλείσιμο του Προγράμματος ανέρχεται σε **116,3%**.

Στο **Σενάριο Β**, απαιτούνται συνολικοί πόροι ΕΤΠΑ ύψους 268,29 εκ. € (έναντι των διαθέσιμων 242,93 εκ. €) με αποτέλεσμα να προκύπτει επιβάρυνση των εθνικών πόρων με ποσό της τάξης των 25,36 εκ. € (ποσοστό 110,4%). Αντίστοιχα, για το ΕΚΤ απαιτούνται συνολικοί πόροι ύψους 58,36 εκ. € (έναντι των διαθέσιμων 52,6 εκ. €) με αποτέλεσμα να προκύπτει επιβάρυνση στους εθνικούς πόρους της τάξης των 5,78 εκ. € (ποσοστό 111%).

Για το Σενάριο Β, η **συνολική επιβάρυνση για τους εθνικούς πόρους ανέρχεται σε 31,14 εκ. €** (μειωμένη κατά 17 εκ. €) και η υπερδέσμευση στο κλείσιμο του Προγράμματος μειώνεται στο **110,5%** (από 116,3%).

Και στα 2 Σενάρια λαμβάνεται υπόψη η δυνατότητα πρόωρου «κλεισίματος» των κοινωνικών δομών του ΕΚΤ (Κέντρα Κοινότητας, ΚΗΦΗ, ΚΔΗΦ, Δομές Φτώχειας) και μεταφοράς της χρηματοδότησης τους από 01.01.2022, στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο 2021-2027.

Επισημαίνεται ότι οι εκτιμήσεις ολοκλήρωσης των υλοποιούμενων έργων και για τα 2 Σενάρια καταλήγουν σε αποκλίσεις σε σχέση με τον υφιστάμενο χρηματοδοτικό προγραμματισμό για όλους τους Άξονες Προτεραιότητας και τους Θεματικούς Στόχους, οι οποίες στις περισσότερες περιπτώσεις είναι μεγαλύτερες του 110%, που αποτελεί το ποσοστό υπερδέσμευσης ασφαλούς κλεισίματος των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι αποκλίσεις αυτές, εφόσον επιβεβαιωθούν, θα επηρεάσουν το βαθμό επίτευξης του οικονομικού δείκτη F100 του Πλαισίου Επίδοσης, καθώς και την επίτευξη των στόχων επιμέρους δεικτών για το 2023.

Με βάση τα ανωτέρω και με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων του ΠΕΠ, καθώς και για την μεγιστοποίηση υποβολής επιλέξιμων δαπανών στο πλαίσιο των ενδιάμεσων λογιστικών χρήσεων, διαμορφώθηκαν αντίστοιχες προτάσεις για την εσωτερική ανακατανομή των διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος, με ενίσχυση εκείνων των Αξόνων και Θεματικών Στόχων που παρουσιάζουν ή προβλέπεται να παρουσιάσουν υψηλότερα ποσοστά απορρόφησης, μειώνοντας τους διαθέσιμους πόρους των ΑΠ ή/και ΘΣ που παρουσιάζουν ή προβλέπεται να παρουσιάσουν χαμηλότερες επιδόσεις. Οι προτάσεις αυτές παρατίθενται στην Ενότητα 6, όπου τεκμηριώνεται η ανάγκη αναθεώρησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020.

Στην ίδια Ενότητα, παρατίθενται και οι προτάσεις του Συμβούλου για την τροποποίηση της στοχοθεσίας του δεικτών του Προγράμματος, καθώς και η συνεπαγόμενη τροποποίηση των δεικτών που περιλαμβάνονται στο Πλαίσιο Επίδοσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΙΚΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

5.1. Βασικές εξελίξεις στο περιβάλλον και στους τομείς παρέμβασης του ΕΠ Ήπειρος

Δημογραφικά Χαρακτηριστικά

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού (ΕΛΣΤΑΤ, 2021), ο **μόνιμος πληθυσμός ανέρχεται σε 319.991 άτομα (3,05% του πληθυσμού της χώρας)**, με την Περιφέρεια να κατατάσσεται στις πλέον **αραιοκατοικημένες Περιφέρειες της χώρας** (34,8 περίπου άτομα ανά τ.χλμ., έναντι 79,7 της χώρας). Με βάση τα στοιχεία πληθυσμού την περίοδο 2011-2021, ενδοπεριφερειακά εντοπίζονται διαφορετικές πληθυσμιακές τάσεις, με τις ΠΕ Άρτας & Θεσπρωτίας να έχουν σημαντικές απώλειες πληθυσμού (-6,1% & - 6,4% αντίστοιχα), η ΠΕ Πρέβεζας εμφανίζει λίγο μικρότερη ποσοστιαία μείωση (-4,9%) και η ΠΕ Ιωαννίνων εμφανίζει μείωση - 4,2%. Η μείωση του συνολικού πληθυσμού της Περιφέρειας για την ίδια περίοδο (-5%) ήταν υψηλότερη αυτής της χώρας (-3,1%).¹

Η **δημογραφική κατάσταση** χαρακτηρίζεται σημαντικά **δυσμενέστερη από αυτή της χώρας και επιδεινώνεται έτι περαιτέρω** την τελευταία περίοδο. Κύριο χαρακτηριστικό της είναι το **πρόβλημα της γήρανσης** του πληθυσμού, με τη μέση ηλικία του πληθυσμού της Περιφέρειας το 2020 να ανέρχεται στα 48,4 έτη (έναντι 45,2 της χώρας), τιμή υψηλότερη τιμή μεταξύ όλων των Περιφερειών της χώρας. Ομοίως το 2019 ο **δείκτης εξάρτησης** της Περιφέρειας (πληθυσμός των “μη παραγωγικών” ηλικιών 0-14 και 65 ετών και άνω προς τον πληθυσμό των “παραγωγικών ηλικιών” 15-64 ετών) **είναι μακράν ο υψηλότερος μεταξύ των Περιφερειών της χώρας** (66,4 έναντι 57,2 της χώρας), αυξανόμενος την περίοδο 2015-2019 με υψηλούς ρυθμούς (δεύτερη αρνητικότερη επίδοση μετά την Περιφέρεια Πελοποννήσου).

Παραγωγική Δομή και Οικονομικές Επιδόσεις


Η **συμβολή της Περιφέρειας στη διαμόρφωση του εθνικού ΑΕΠ** την περίοδο 2015-2019 παρουσιάζει τάσεις μείωσης (από 2,25% το 2014 στο 2,18% το 2019), γεγονός που το 2019 την κατατάσσει ως Περιφέρεια με την 4η χαμηλότερη συμβολή (μετά τις Περιφέρειες Β. Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Δυτικής Μακεδονίας). Αντίστοιχα, στο επίπεδο των χωρικών ενοτήτων η ΠΕ Ιωαννίνων παράγει περίπου το 50% του περιφερειακού ΑΕΠ, ενώ οι ΠΕ Άρτας-Πρέβεζας και Θεσπρωτίας το 36% και 14% περίπου.

Ως απόρροια της σημαντικής δημοσιονομικής και χρηματοοικονομικής κρίσης **το περιφερειακό ΑΕΠ μειώθηκε δραματικά την περίοδο 2011-2012**, ενώ **πιο ήπια ήταν η μείωσή του την περίοδο 2013-2017**. Το 2019 το ύψος του ΑΕΠ της Περιφέρειας ανέρχονταν στο 81% του αντίστοιχου ύψους του 2010.

Όπως αποτυπώνεται και στο Διάγραμμα που ακολουθεί, **το έτος 2020 το περιφερειακό ΑΕΠ μειώθηκε με ρυθμό λίγο μικρότερο από τον αντίστοιχο της χώρας (-8,7% έναντι -9,8%), ενώ το 2021 το περιφερειακό ΑΕΠ αυξήθηκε με ρυθμό ανάλογο με αυτό της χώρας (9,9% έναντι 9,8% της χώρας)**. Το περιφερειακό ΑΕΠ ανέρχεται το 2021 στο 78,5% του ΑΕΠ του έτους 2008, επίδοση ελαφρώς υψηλότερη από την αντίστοιχη της χώρας (75,1%).

Η συνεισφορά της **Περιφέρειας Ηπείρου στη διαμόρφωση του Εθνικού ΑΕΠ της χώρας** την περίοδο 2009-2019 ήταν της τάξης του 2,2%, ενώ τα έτη 2020 & 2021 παρουσιάζει μια μικρή αύξηση στο 2,23%.

¹ ΕΛΣΤΑΤ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 2021, <https://www.statistics.gr/el/2021-census-res-pop-results>

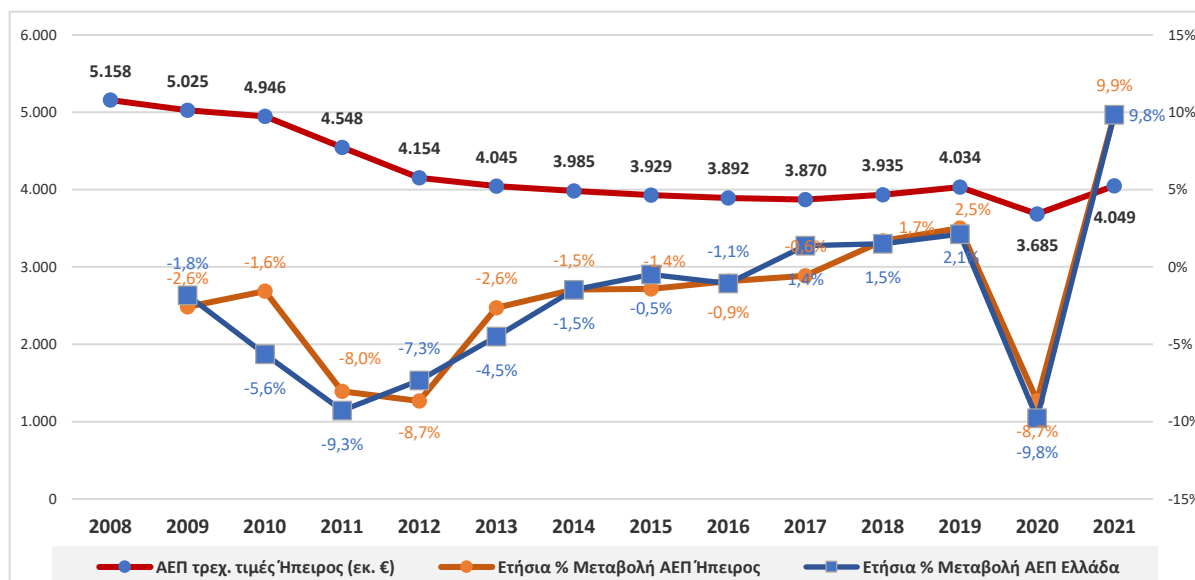Διάγραμμα 57. Εξέλιξη του ΑΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου και ποσοστιαία μεταβολή του ΑΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου και Ελλάδας, 2008-2021

Πηγή: Eurostat, Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions (nama_10r_2gdp, Last updated: 21.02.2023)

Παρά την άνοδο μετά το 2013 του **κκ ΑΕΠ της Περιφέρειας**, και ιδιαίτερα την περίοδο 2018-2019, αυτό **εξακολουθεί να παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα** (το 2019 ανέρχονταν στις 14.600 Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ) ΕΕ27 σε τρέχουσες τιμές, δηλαδή στο 70,53% της χώρας ή στο 47% της ΕΕ27). Η εν λόγω επίδοση κατατάσσει την Ήπειρο ως **δεύτερη φτωχότερη Περιφέρεια της χώρας**. Ενδοπεριφερειακά εντοπίζεται σύγκλιση του ύψους του κκ ΑΕΠ στις επιμέρους Περιφερειακές Ενότητες, με την ΠΕ Θεσπρωτίας να διαθέτει το υψηλότερο (14.800 ΜΑΔ), αλλά εξαιρετικά χαμηλό σε σχέση με το 2018 (73,6% του κκ ΑΕΠ του 2018), ενώ ακολουθούν οι ΠΕ Ιωαννίνων και Άρτας-Πρέβεζας (14.000 ΜΑΔ – 83,3% και 95,2% αντίστοιχα του κκ ΑΕΠ του 2008).

Από την ανάλυση της κατανομής της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) του 2018 στους παραγωγικούς τομείς, προκύπτει ότι η **συμμετοχή του πρωτογενή τομέα** στην συνολική ΑΠΑ **είναι σημαντική** και ανέρχεται σε 9,4%, ποσοστό **υπερδιπλάσιο της χώρας** (4,2%) και αυξημένο σημαντικά σε σχέση με το 2008 (6,14%). Ο δευτερογενής και ο τριτογενής συμμετέχουν κατά 14,04% (σημειώνοντας σημαντική υποχώρηση από το 18,4% του 2008) και 76,59% αντίστοιχα (μικρή αύξηση σε σχέση με το 2008). Σε επίπεδο υποτομέων οικονομικής δραστηριότητας σημαντική είναι η συνεισφορά της γεωργίας/κτηνοτροφίας, του εμπορίου/τουρισμού και των κατασκευών στη συνολική ΑΠΑ, ενώ υψηλότερη εξειδίκευση σε σχέση με τη χώρα πέραν του πρωτογενή τομέα εντοπίζεται στις κατασκευές.²

Οι οικονομικές επιδόσεις της Περιφέρειας είναι σαφώς επηρεασμένες από την οικονομική κρίση. Η ΑΠΑ την περίοδο 2009-2017 φθίνει με τις συνολικές απώλειες να ανέρχονται στο 25,8%, επίπεδο λιγότερο δυσμενές σε σχέση με το μ.ο. της χώρας (27,7% περίπου), με τις υψηλότερες απώλειες να εντοπίζονται στην ΠΕ Θεσπρωτίας (33,1%). Το 2019 η ΑΠΑ της Περιφέρειας ανήλθε στο 76,2% του επιπέδου του 2008, έναντι 74,4% στο επίπεδο της χώρας. Μεταξύ των παραγωγικών δραστηριοτήτων της Περιφέρειας **ο πρωτογενής τομέας επέδειξε αντοχή και αξιοσημείωτη ανάπτυξη**, παρουσιάζοντας επιδόσεις πολύ καλύτερες από αυτές του συνόλου της χώρας, με τον όγκο παραγωγής το 2018 σε όρους ΑΠΑ να είναι υψηλότερος κατά 14,1% από αυτόν του 2008 (έναντι απωλειών 3,2% στο επίπεδο της χώρας). Αντίστοιχα, **αξιόλογη αντοχή επέδειξε η μεταποιητική δραστηριότητα**, ο όγκος παραγωγής της οποίας το 2018 ήταν χαμηλότερος κατά 15,6% του 2008 έναντι 31,3% στο επίπεδο της χώρας, ενώ σημαντικές ήταν οι **απώλειες των κλάδων**

² Επεξεργασία στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ, Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία κατά κλάδο (Α10)

Εμπορίου/Μεταφορών/Διαμονής/ Εστίασης (υψηλότερες της χώρας) και **δραματική η μείωση της δραστηριότητας των κατασκευών**.³

Πρόσθετη επιβάρυνση στην οικονομία της Περιφέρειας **δημιουργείται από τα** αναγκαία περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται **για την αντιμετώπιση της κρίσης της πανδημίας COVID19** που εκδηλώθηκε το 1^ο εξάμηνο του 2020. Η αναστολή λειτουργίας αρχικά των επιχειρήσεων εστίασης και στη συνέχεια επιχειρήσεων και άλλων τομείς της οικονομίας, έχουν επηρεάσει αρνητικά τις οικονομικές δραστηριότητες και κυρίως επιμέρους κλάδους υπηρεσιών στους οποίους η Περιφέρεια εξειδικεύεται (εμπόριο και μεταφορές, τουρισμός, εστίαση κοκ.), ενώ λιγότερο φαίνεται να επηρεάζονται οι κλάδοι του πρωτογενή τομέα.

Οικονομική Δραστηριότητα – ΜΜΕ

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Μητρώου Επιχειρήσεων της Στατιστικής Υπηρεσίας του 2020, ανέρχεται σε 44.622, με κύκλο εργασιών 4.555 εκατ. €.

Καθοριστική είναι η βαρύτητα του πρωτογενή τομέα της Περιφέρειας που συγκεντρώνει το 11,6% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων (4 φορές υψηλότερο ποσοστό σε σύγκριση με τη χώρα) και το 18,7% των απασχολούμενων (έναντι 10,8% της χώρας), ενώ επιδεικνύει σημαντικά υψηλότερη σχέση ύψους κύκλου εργασιών ανά απασχολούμενο (δείκτης έμμεσης ένδειξης της παραγωγικότητας της εργασίας) σε σχέση με τη χώρα (€27,19 χιλ. έναντι €19,08 χιλ. της χώρας). Όσον αφορά στους κλάδους εξειδίκευσης, η βασικότερη δραστηριότητα του πρωτογενή τομέα εξακολουθεί να είναι η κτηνοτροφία (ιδιαίτερα η αιγοπροβατοτροφία και η πτηνοτροφία), που συγκεντρώνει το 67,3% του κύκλου εργασιών του τομέα, ενώ αξιολογή είναι η παρουσία των δραστηριοτήτων υδατοκαλλιέργειας (θαλάσσιας και εσωτερικής) που διαθέτουν το 8,3% του κύκλου εργασιών του τομέα.

Ο δευτερογενής τομέας συγκεντρώνει το 33,9% περίπου του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας (έναντι 29,3% της χώρας) **και το 14,2% των απασχολούμενων** (έναντι 12,3% της χώρας). Το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων του δευτερογενή ως προς την απασχόληση υπολείπεται του μέσου μεγέθους της χώρας (3,2 εργαζόμενοι έναντι 4,2 της χώρας), ενώ υποδιπλάσιος είναι ο μέσος κύκλος των εργασιών των επιχειρήσεων (€345,2 έναντι €701,6 χιλ. της χώρας). **Η μεταποίηση αποτελεί την κυρίαρχη δραστηριότητα του δευτερογενή τομέα**, με τον κύκλο εργασιών της να ανέρχεται στο 86,0% του κύκλου εργασιών του (έναντι 68,1% της χώρας) και το 63,8% της συνολικής απασχόλησής του (έναντι 64,5% στη χώρα). Οι κλάδοι επεξεργασίας και τυποποίησης προϊόντων διατροφής και ποτοποιίας διαθέτουν το 88,1% του κύκλου εργασιών και το 71,2% της απασχόλησης της μεταποίησης, ενώ υψηλή είναι η εξειδίκευση της Περιφέρειας στους κλάδους επεξεργασίας και συντήρησης κρέατος και παραγωγής προϊόντων κρέατος, των γαλακτοκομικών προϊόντων, της ποτοποιίας και της κατασκευής πλαστικών προϊόντων (51,7%, 12,0%, 11,0% και 4,3% του κύκλου εργασιών της μεταποίησης).⁴

Χαρακτηριστικό της παραγωγικής εξειδίκευσης της Περιφέρειας είναι και το γεγονός ότι το 2018 **τα 3/4 περίπου των συνολικών της εξαγωγών της αφορούσαν τους κλάδους παραγωγής και μεταποίησης προϊόντων του πρωτογενή τομέα** (πρωτίστως προϊόντα υδατοκαλλιέργειας αλλά και γαλακτοκομικά προϊόντα, ενώ ακολουθούν οι νωποί καρποί & φρούτα και τα κρέατα), ενώ **σταθερά σημαντική συμμετοχή στις εξαγωγές έχουν τα χημικά/πλαστικά προϊόντα**). Σημειώνεται διαχρονικά η τάση αύξησης των εξαγωγών της Περιφέρειας μετά το 2011 και οι καλύτερες επιδόσεις της σε σχέση με τη χώρα στον δείκτη του εμπορικού ισοζυγίου (πλεονασματικός το 2018 στην Περιφέρεια, ελλειμματικός στη χώρα).⁵

³ Επεξεργασία στοιχείων Eurostat - nama_10r_3gva, 30.04.2021

⁴ Το σύνολο των παραπάνω αποτελούν επεξεργασία στοιχείων του Μητρώου Επιχειρήσεων ΕΛΣΤΑΤ (2020)

⁵ Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) ΣΕΒΕ - Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια και Περιφερειακή Ενότητα ετών 2011-2018

Ο τριτογενής τομέας συγκεντρώνει το 55,3% του συνολικού κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων της Περιφέρειας (έναντι 68,0% της χώρας) **και το 67,0% των απασχολουμένων** (έναντι 76,9% της χώρας). Στον τριτογενή τομέα **κυριαρχεί ο κλάδος του εμπορίου/επισκευής μεταφορικών μέσων** διαθέτοντας το 71,4% του κύκλου εργασιών του τομέα (έναντι μόλις 58,2% στη χώρα), το 29,1% του αριθμού των επιχειρήσεων (έναντι 30,5% στη χώρα) και μόλις το 22,0% της απασχόλησης (22,9% στη χώρα).

Υψηλότερη εξειδίκευση σε σχέση με τη χώρα παρατηρείται **στους κλάδους που συνδέονται με τον τουρισμό και τον πολιτισμό** της Περιφέρειας, απόρροια των ιδιαίτερων πλεονεκτημάτων της λόγω της παρουσίας σημαντικών φυσικών και πολιτιστικών πόρων (καθαρές ακτές, περιοχές εξαιρετικού φυσικού κάλλους, αρχαιολογικά μνημεία, εθνικούς δρυμούς, τοπική πολιτιστική παράδοση, κλπ.) και της παράδοσης της Περιφέρειας στην ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων (ειδικός και ορεινός τουρισμός). Οι κλάδοι των καταλυμάτων και της εστίασης διαθέτουν το 20,9% των επιχειρήσεων, το 9,1% του κύκλου εργασιών και το 24,1% της απασχόλησης του τριτογενή τομέα (έναντι 14,3%, 6,3% και 18,1% αντίστοιχα στη χώρα). Όμως το μέσο μέγεθος των επιχειρήσεων αυτών των κλάδων κυρίως σε όρους κύκλου εργασιών, αλλά και της απασχόλησης υπολείπεται του μ.ο. της χώρας.

Τέλος, σημαντική δραστηριότητα του τριτογενή τομέα αποτελούν οι επαγγελματικές, επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες στις οποίες όμως η Περιφέρεια δεν παρουσιάζει υψηλή εξειδίκευση (τα μεγέθη τους υπολείπονται του μ.ο της χώρας).

Έρευνα – Τεχνολογία - Καινοτομία

Η Ήπειρος σύμφωνα με την έκδοση της ΕΕ Regional Innovation Scoreboard 2023 χαρακτηρίζεται ως περιφέρεια μέτριας καινοτομίας (moderate innovator) και καταλαμβάνει την 158η θέση μεταξύ των περιφερειών της ΕΕ ως προς τις επιδόσεις της στην καινοτομία, βελτιώνοντας διαχρονικά τον σχετικό συνοπτικό δείκτη. Καταγράφει υψηλές και κατά κανόνα βελτιούμενες επιδόσεις στις διεθνείς επιστημονικές συνδημοσιεύσεις και τις συνδημοσιεύσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τις δαπάνες Ε&Α στον κρατικό τομέα, τις δαπάνες καινοτομίας εκτός Ε&Α, τις ΜΜΕ που καινοτομούν, την απασχόληση σε καινοτόμες επιχειρήσεις, τις πωλήσεις νέων καινοτομιών. Εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις παρουσιάζει στη δια βίου μάθηση, την απασχόληση ειδικών στις ΤΠΕ, τις αιτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας ΡСТ, τις εφαρμογές σχεδιασμού και την απασχόληση σε δραστηριότητες έντασης γνώσης.

Το 2021 οι δαπάνες Ε&Α της Περιφέρειας αντιπροσωπεύουν το 1,59% του ΑΕΠ της, ποσοστό μεγαλύτερο του εθνικού μέσου όρου (1,46%), παρουσιάζοντας σημαντική πρόοδο σε σχέση με το 2011 (0,84%). Στη συντριπτική της πλειοψηφία η ερευνητική δραστηριότητα εξακολουθεί να διεξάγεται στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Οι δαπάνες Ε&Α του τομέα επιχειρήσεων ως ποσοστό (%) του ΑΕΠ ανέρχονται το 2021 στο 0,23% (παρουσιάζοντας αύξηση σε σχέση με το αντίστοιχο ποσοστό των ετών 2019 & 2020: 0,18% & 0,20% αντίστοιχα)⁶ και επόμενα η ενίσχυση της συμμετοχής του ιδιωτικού τομέα στην έρευνα εξακολουθεί να αποτελεί βασική πρόκληση.

Ιδιαίτερης σημαντικότητας, αναδεικνύεται η δημιουργία και λειτουργία του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Πάρκου Ηπείρου (Ε.ΤΕ.Π.Η.) με κύριο ρόλο να διαχέει την τεχνογνωσία που παράγεται στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τα ερευνητικά κέντρα / ινστιτούτα, στοχεύοντας στη δημιουργία ενός νέου πόλου ανάπτυξης στην Ήπειρο.

Τέλος, η Περιφέρεια Ηπείρου διακρίνεται για το υψηλό ποσοστό ανθρωπίνων πόρων που απασχολούνται με την Επιστήμη και Τεχνολογία. Ειδικότερα η Περιφέρεια Ηπείρου το 2020 παρουσιάζει την τρίτη καλύτερη επίδοση, μετά τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας, ως προς το ποσοστό των ατόμων επί των οικονομικά ενεργών με τριτοβάθμια εκπαίδευση, περιλαμβανομένων και αυτών που απασχολούνται με την Επιστήμη και Τεχνολογία (34,2% και 37,3% αντίστοιχα), των ατόμων που απασχολούνται με την Επιστήμη και

⁶ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης – Δείκτες Παρακολούθησης της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης

Τεχνολογία (22,7%) και των ατόμων με τριτοβάθμια εκπαίδευση που απασχολούνται με την Επιστήμη και Τεχνολογία (19,6%)⁷.

Ψηφιακή Σύγκλιση

Η υστέρηση στον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (δείκτης DESI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) σε εθνικό επίπεδο (27η θέση επί συνόλου 28 κρατών μελών της ΕΕ), όπως αποτυπώνεται στην ετήσια έκθεση της χώρας για το 2020⁸, **αντανακλάται και σε επίπεδο Περιφερειών** και αποτελεί σημαντικό εμπόδιο τόσο για την Ελλάδα συνολικά, όσο και για τις Περιφέρειες όσον αφορά την αξιοποίηση των ευκαιριών ανάπτυξης στο πλαίσιο μετάβασης στην ψηφιακή κοινωνία και οικονομία.

Γενικότερα, **στην Περιφέρεια Ηπείρου εμφανίζεται** περιορισμένη διείσδυση στη χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, ενώ σημαντική υστέρηση παρουσιάζεται στις ψηφιακές δεξιότητες του πληθυσμού της. Ειδικότερα, στον ευρύτερο γεωγραφικό χώρο της Περιφέρειας (Βόρεια Ελλάδα) το 2020 το ποσοστό των νοικοκυριών που έχει οικιακή σύνδεση στο διαδίκτυο ανέρχεται στο 99% (100% στην Αττική) και ευρυζωνική το 81% (83% στην Αττική), το ποσοστό ιδιωτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για συναλλαγές με τις δημόσιες αρχές σε 49% (έναντι 53% στη χώρα), για τραπεζικές συναλλαγές 35% και των ατόμων που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών το 3% περίπου, ενώ το ποσοστό των ατόμων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ ηλεκτρονικό υπολογιστή το 21%⁹.

Αξίζει να αναφερθεί ότι στην Περιφέρεια εντοπίζεται μικρός αριθμός επιχειρήσεων ΤΠΕ με περιορισμένο κύκλο εργασιών, που επικεντρώνεται κυρίως στην ολοκλήρωση συστημάτων, τη συντήρηση και την υποστήριξη λογισμικού για τις κρατικές υπηρεσίες, και τις τοπικές επιχειρήσεις. Αυτή η υστέρηση προκαλεί σημαντική διαρροή από ταλαντούχους επαγγελματίες ΤΠΕ από την περιοχή, καθώς οι σχετικές θέσεις εργασίας είναι περιορισμένες, δυσχεραίνοντας τη διείσδυση των ΤΠΕ στο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον της Περιφέρειας.

Με τη συνδρομή του ΠΕΠ Ηπείρου υλοποιούνται 18 έργα ανάπτυξης και χρήσης ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών και ψηφιακών εφαρμογών έξυπνης πόλης από τους Ο.Τ.Α. και λοιπούς φορείς της Περιφέρειας.

Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Φυσικοί-Πολιτιστικοί Πόροι

Στην Περιφέρεια εντοπίζεται **ένας σημαντικός αριθμός περιβαλλοντικά ευαίσθητων και προστατευόμενων περιοχών με υψηλή οικολογική και αισθητική αξία** που την καθιστούν ιδιαίτερα προνομιούχο από την άποψη του φυσικού περιβάλλοντος. Καταγράφονται 31 περιοχές ενταγμένες στον Εθνικό Κατάλογο του δικτύου Natura 2000 (28% της συνολικής έκτασης).

Από τις περιοχές αυτές, κατά την περίοδο σχεδιασμού του Προγράμματος:

- σε 24 με συνολική έκταση 3.330 τ.χλμ. (74%) είχαν εκπονηθεί Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες
- σε 15 περιοχές είχε συνταχθεί Σχέδιο Διαχείρισης,
- σε άλλες 3 (Πάρκο Παμβώτιδας) το Σχέδιο Διαχείρισης έχριζε επικαιροποίησης,
- σε 3 περιοχές Natura που εντάσσονται στο Πάρκο Αμβρακικού είχε δρομολογηθεί η εκπόνηση Σχεδίου Διαχείρισης.

Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στους τομείς του περιβάλλοντος, της αντιμετώπισης των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή και της προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας είναι η ακόλουθη:

⁷ Eurostat, HRST by category and NUTS 2 regions [hrst_st_rcat], 27.04.2021

⁸ <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/greece>

⁹ Eurostat, [isoc_r_iacc_h], [isoc_r_broad_h], [isoc_r_iuse_i], 25.05.2021

- στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του Εθνικού Συστήματος Προστατευόμενων Περιοχών και διαχειριστικών δομών περιοχών Natura 2000 εντάχθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ έργο ανάπτυξης δράσεων για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας της Λίμνης Παμβώτιδας (μελέτες και υλοποίηση δράσεων παρακολούθησης, διαχειριστικές δράσεις, δικτύωση και προβολή), ενώ από το ΠΕΠ χρηματοδοτούνται έργα διαχειριστικών δράσεων στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου (ανάδειξη και προβολή της προστατευόμενης περιοχής / παρακολούθησης των πληθυσμών της ιχθυοπανίδας της Τεχνητής λίμνης των πηγών Αώου) και λειτουργίας Κέντρου Περιβαλλοντικής Ερμηνείας και Διαδραστικής Ψηφιακής Ενημέρωσης του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου - Λευκάδας
- Ενεργοποιήθηκαν από το ΠΕΠ δράσεις για την ανάπτυξη συστημάτων για την παρακολούθηση, αξιολόγηση και δημιουργία μοντέλων για την εξέλιξη των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε επιμέρους υψηλής σημαντικότητας περιοχές, με την ένταξη τεσσάρων (4) έργων (συστήματα καταγραφής, παρακολούθησης, διαχείρισης και ενημέρωσης στην πόλη της Ηγουμενίτσας και στην ευρύτερη περιοχή Άραχθου, σύστημα παρακολούθησης και πρόληψης φυσικών καταστροφών του Δ. Μετσόβου και μελέτη, πρόβλεψη και μοντελοποίηση επιπτώσεων κλιματικής αλλαγής επί της δελταϊκής ακτογραμμής του ποταμού Καλαμά), καθώς και το έργο της ανάπτυξης συστήματος καταγραφής, παρακολούθησης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα

Ως προς τη φυσική και πολιτισμική κληρονομιά, τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί ουσιαστική πρόοδος σε ότι αφορά ενέργειες προστασίας και ανάδειξής της, εστιάζοντας στη δημιουργία χώρων αναψυχής και διαδρομών σε περιοχές φυσικού κάλους σημαντικής οικολογικής αξίας, καθώς και σε αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία, μουσεία και στοιχεία αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.

Την τρέχουσα προγραμματική περίοδο μέσω του ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενισχύονται παρεμβάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου, με την ένταξη έξι (6) έργων αξιοποίησης και επανάχρησης αξιόλογων κτιριακών υποδομών (πρώην φυλακών, δημαρχιακών καταστημάτων και δημοτικών σχολείων) με αναβαθμισμένα ενεργειακά και βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, καθώς και διαμόρφωσης και προβολής χώρων υψηλής αισθητικής και περιβαλλοντικής αξίας.

Επιπρόσθετα μέσω του ΠΕΠ χρηματοδοτούνται επτά (7) έργα προστασίας, συντήρησης, αποκατάστασης και ανάδειξης του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας, εκ των οποίων έξι (6) στο πλαίσιο της ΟΧΕ για την Πολιτιστική διαδρομή στα αρχαία θέατρα της Ηπείρου και ένα (1) στο πλαίσιο Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης.

Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Στον τομέα της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο των 4 ΧΥΤΑ που προβλέπονται από τον εν ισχύ Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), που τροποποιήθηκε και εγκρίθηκε το 2015, έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του συνόλου των ΧΑΔΑ, ενώ ολοκληρώθηκε και η κατασκευή της Μονάδας Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) Ηπείρου μέσω σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, που τέθηκε σε λειτουργία το 2019. Η μέγιστη ετήσια δυναμικότητα της ΜΕΑ Ηπείρου είναι 105.000tn. Μέσω της ΜΕΑ επιτυγχάνεται συνολική ανάκτηση 17.000 τόνων ανακυκλώσιμων υλικών ανά έτος, ενώ παράγονται 10.800kWh/έτος Πράσινης Ενέργειας, ικανής να καλύψει τις ανάγκες 3.000 οικογενειών με εξοικονόμηση 12.000 τόνων CO₂.

Για την αποτελεσματική λειτουργία του **συστήματος διαχείρισης του ΠΕΣΔΑ υπολείπεται η κατασκευή και ο εξοπλισμός του προβλεπόμενου δικτύου των 8 (οκτώ) σταθμών μεταφόρτωσης (ΣΜΑ)**, οι οποίοι θα δώσουν λύσεις στη μεταφορά σκουπιδιών από δυσπρόσιτες περιοχές της Περιφέρειας, η μετατροπή υφιστάμενων ΧΥΤΑ σε ΧΥΤΥ, η δημιουργία Πράσινων Σημείων, για τα οποία έχει ήδη εκδοθεί πρόσκληση υποβολής προτάσεων από το ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020, και η τόνωση των -πολύ σημαντικών- δράσεων που αφορούν την ανακύκλωση και την διαλογή στην πηγή.

Διαχείριση Υδάτων

Σε σχέση με τους **υδατικούς πόρους** η κατάσταση χαρακτηρίζεται ως ικανοποιητική. Το Υδατικό διαμέρισμα Ηπείρου (GR05 - το πλέον πλεονασματικό της χώρας), αντιμετωπίζει κατά τόπους ποσοτικά και ποιοτικά προβλήματα. Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων που έχει εκπονηθεί σε εφαρμογή της Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60/ΕΚ) η Ήπειρος διαθέτει 106 επιφανειακά υδάτινα σώματα εκ των οποίων 79 χαρακτηρίζονται από υψηλή ή καλή οικολογική κατάσταση. Από τα υπόλοιπα, τα 12 θεωρείται ότι θα επιτύχουν τους στόχους της Οδηγίας Πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ) ως το 2015, ενώ 15 κατατάσσονται στις εξαιρέσεις και ο στόχος για καλή οικολογική κατάσταση μετατίθεται για το 2027. Κύρια προβλήματα εντοπίζονται στις Λίμνες (ειδικά στην Παμβώτιδα), άλλα και στην παράκτια ζώνη. Αντίστοιχη κατάσταση εμφανίζουν και τα υπόγεια συστήματα, με αυτά τις παράκτιας ζώνης να θεωρούνται περισσότερο επιβαρυσμένα.

Το Σχέδιο Διαχείρισης Υδάτων περιλαμβάνει διαχειριστικά και τεχνικά μέτρα τα οποία στοχεύουν στην μείωση των απωλειών από ύδρευση/ άρδευση, την επεξεργασία, την υδρονομία και την διαχείριση του αποθέματος. Στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020 έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται έργα συστημάτων αυτόματης διαχείρισης και ελέγχου διαρροών δικτύων και λοιπών υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων, του Δ. Ηγουμενίτσας, της ΔΕΥΑ Άρτας και του Δ. Ζηρού, καθώς και έργα αναβάθμισης υποδομών ύδρευσης της ΔΕΥΑ Πρεβέζης και του Δ. Γ. Καραϊσκάκη.

Στον τομέα της **διαχείρισης λυμάτων**, έχουν κατασκευασθεί και συνεχίζουν να κατασκευάζονται οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων και τα δίκτυα αποχέτευσης που απαιτούνται για την κάλυψη των προτεραιοτήτων της Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Στην Ήπειρο λειτουργούν 7 Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων, οι οποίες εξυπηρετούν το σύνολο των οικισμών Α και Β προτεραιότητας. Καταγράφονται επίσης 15 οικισμοί Γ' προτεραιότητας (2009) από τους οποίους οι 6 καλύπτουν τις υποχρεώσεις της Οδηγίας.

Την τρέχουσα προγραμματική περίοδο έχουν εγκριθεί στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ δύο (2) έργα υποδομών συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας λυμάτων ολοκλήρωσης υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων σε οικισμούς Γ προτεραιότητας (ΕΕΛ) που απαιτούνται σύμφωνα με την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ στους Δ. Νικολάου Σκουφά και Ζηρού, καθώς και τέσσερα (4) έργα ολοκλήρωσης των υποδομών των οικισμών Γ προτεραιότητας και Β προτεραιότητας που συγχρηματοδοτήθηκαν κατά την προγραμματική περίοδο 2007-2013 σε οικισμούς των Δ. Ιωαννίνων, Σουλίου, Νικολάου Σκουφά και σειράς οικισμών της Άρτας. Τέλος, στο ΠΕΠ Ηπείρου έχουν εγκριθεί δέκα (10) έργα δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων, εκ των οποίων το ένα έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ τέσσερα (4) αναμένεται να ολοκληρωθούν στην επόμενη προγραμματική περίοδο.

Παράλληλα μέσω του ΠΕΠ χρηματοδοτούνται τέσσερα (4) έργα διαχείρισης υδάτινων πόρων (δίκτυα πόσιμου νερού), τρία (3) έργα υλοποίησης Σχεδίων Ασφάλειας Νερού και οριοθέτησης ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού, καθώς και το έργο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης της Περιφέρειας.

Λόγω του ορεινού αναγλύφου οι ζώνες δυνητικά υψηλού κινδύνου πλημμύρας σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ είναι εκτατικά περιορισμένες. Ως περιοχές υψηλού κινδύνου θεωρούνται το οροπέδιο των Ιωαννίνων, οι περιοχές πέριξ του Αμβρακικού (συμπεριλαμβανομένης της Πρέβεζας), οι παράκτιες περιοχές της Θεσπρωτίας (ΛΑΠ Καλαμά) και τα πεδινά της ΛΑΠ Αχέροντα. Στο ΕΠ Ηπείρου έχουν ενταχθεί πέντε (5) έργα αντιπλημμυρικής προστασίας σε πεδινές - μη δασικές περιοχές, καθώς και πέντε (5) έργα κατασκευής, αντικατάστασης, βελτίωσης και επέκτασης δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων.

Ενεργειακή απόδοση

Η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας και η μείωση των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, αποτελούν βασικές προτεραιότητες της Στρατηγικής του Προγράμματος και συνολικά της χώρας. Επίσης, η συμμετοχή του τομέα των μεταφορών και ιδιαιτέρως των οδικών μεταφορών στην κατανάλωση ενέργειας και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, αποτελεί ένα από τα βασικότερα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα που αναζητούν βιώσιμη λύση.

Στο πλαίσιο αυτό μέσω του ΠΕΠ ενεργοποιήθηκαν:

- παρεμβάσεις αναβάθμισης κτιρίων και βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης δημοσίων κτιρίων, με την ένταξη τεσσάρων (4) έργων σχολικών μονάδων, δομής ψυχικής υγείας και λοιπών δημοσίων κτιρίων,
- παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενεργειακή αποδοτικότητα των αστικών μεταφορών με την ένταξη επτά (7) έργων προμήθειας ενεργειακά αποδοτικών οχημάτων ή/και υποδομών Δήμων και οργανισμών τους, καθώς και δύο (2) έργων φωτεινών σηματοδοτών και εγκατάστασης λαμπτήρων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ενεργοποιήθηκαν παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης με την ένταξη και χρηματοδότηση έργων εκπόνησης σχεδίων δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια στα τέσσερα αστικά κέντρα της Περιφέρειας, καθώς και τεσσάρων (4) έργων αναβάθμισης ενεργοβόρων υποδομών δημοσίων κτιρίων (Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων και τρία κλειστά κολυμβητήρια)

Υποδομές Μεταφορών

Η κατάσταση του οδικού δικτύου έχει βελτιωθεί σημαντικά, εξ αιτίας της διέλευσης δύο από τους σημαντικότερους άξονες του βασικού (core) δικτύου ΔΕΔ-Μ της χώρας, της Εγνατίας οδού και της Ιόνιας οδού που έχουν ολοκληρωθεί. Ζητούμενο για το Πρόγραμμα ήταν η σύνδεση των παραπάνω αξόνων με τα αστικά κέντρα και τις περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς και η βελτίωση της οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων στο πλαίσιο στρατηγικών χωρικής ανάπτυξης εντάχθηκαν στο ΠΕΠ τα ακόλουθα έργα:

- Ολοκλήρωση μεγάλου δακτυλίου πόλης Ιωαννίνων
- Οδός Σταύρου Νιάρχου
- Παράκαμψη Νικόπολης - Συγκοινωνιακά έργα ανάδειξης αρχαιολογικού χώρου Νικόπολης

καθώς και το έργο της σύνδεσης του Α/Κ Τερόβου της Ιόνιας Οδού με τη 2η Επαρχιακή Οδό Ιωαννίνων - Γέφυρα Πλάκας (αποτελεί έργο υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομές)

Σε ότι αφορά τις λιμενικές υποδομές στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ εντάχθηκε το έργο της αναβάθμισης των θαλάσσιων και χερσαίων υποδομών του λιμένα Ηγουμενίτσας (Γ1 Φάση), που αποτελεί τμήμα του βασικού δικτύου των ΔΕΔ-Μ.

Αγορά Εργασίας

Το **ποσοστό απασχόλησης** του πληθυσμού ηλικίας 20-64 ετών της Περιφέρειας κατά την περίοδο 2009-2014 μειώνεται συνεχώς, ενώ στη συνέχεια ανακάμπτει χωρίς σταθερό ρυθμό για να ανέλθει το 2020 στο 58,0%, επίπεδο χαμηλότερο του μ.ο. της χώρας και των χωρών της ΕΕ27 (61,1% και 72,3% αντίστοιχα). Οι γυναίκες εμφανίζουν σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα συμμετοχής στο εργατικό δυναμικό σε σχέση με τους άνδρες (47,7% έναντι 68,3%), ενώ το ίδιο ισχύει και για τους απόφοιτους χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης σε σχέση κυρίως με τους απόφοιτους πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (49,5% έναντι 73,7%).¹⁰

Το **ποσοστό ανεργίας** των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών της Περιφέρειας το 2020 είναι 2,6 φορές υψηλότερο σε σχέση με την ΕΕ27 και υψηλότερο της χώρας (18,2% έναντι 16,4% στην Ελλάδα και 6,9% στην ΕΕ27). Σημειώνεται αύξηση του επιπέδου ανεργίας σε σχέση με το 2019 κατά 1,7 ποσοστιαίες μονάδες, σε αντίθεση με τη χώρα όπου παρατηρείται μείωση κατά 0,9 ποσοστιαίες μονάδες. Η ανεργία των γυναικών είναι σημαντικά μεγαλύτερη από αυτή των ανδρών (22,6% έναντι 15,3% για τους άνδρες). Μάλιστα, **το πρόβλημα**

¹⁰ Eurostat, lfst_r_lfe2empn, 20.11.2023

της ανεργίας πλην των γυναικών **πλήττει σημαντικά και τους νέους της Περιφέρειας**. Με βάση τα συγκριτικά στοιχεία της Eurostat το 2020 το ποσοστό ανεργίας των νέων της Περιφέρειας ηλικίας 15-24 ετών ανήλθε στο 38,0% (έναντι 35,0% της χώρας και 16,9% της ΕΕ27), σημειώνοντας όμως ραγδαία μείωση σε σχέση με τα επίπεδα του 2014 (69,8%).¹¹

Το **ποσοστό των μακροχρόνια ανέργων** ηλικίας 20-64 ετών ως προς τον ενεργό πληθυσμό το 2020 ανήλθε στο 13,8%, ποσοστό υψηλότερο της χώρας (10,9%) και 5,3 φορές υψηλότερο της ΕΕ27 (2,6%). Αντίστοιχα το ποσοστό μακροχρόνια ανέργων ως προς τους ανέργους της Περιφέρειας ανήλθε σε 75,9%, ποσοστό υψηλότερο της χώρας (66,7%) και διπλάσιο της ΕΕ27 (36,8%), παραμένοντας σε υψηλά επίπεδα και τα τελευταία έτη της οικονομικής ανάκαμψης.¹²

Η **αποκλιμάκωση των ποσοστών ανεργίας μετά το 2021 αποτελεί σαφή τάση**, με το ποσοστό ανεργίας των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών της Περιφέρειας το 2021 να μειώνεται στο 15,2% (έναντι 14,7% στην Ελλάδα και 6,9% στην ΕΕ27) και το 2022 στο 13,4% (έναντι 12,3% στην Ελλάδα και 6% στην ΕΕ27)¹³.

Είναι προφανές ότι η κατάσταση της απασχόλησης στην Περιφέρεια επιβαρύνθηκε λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 στην αγορά εργασίας σε εντονότερο βαθμό συγκριτικά με το σύνολο της χώρας, ενώ η ανάκαμψη της απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας στην Περιφέρεια Ηπείρου φαίνεται να πραγματοποιείται ελαφρώς ταχύτερα από ότι στο σύνολο της χώρας, αν και παραμένει υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο ποσοστό της ΕΕ27.

Κοινωνική Συνοχή (Φτώχεια - Κοινωνικός Αποκλεισμός- Υγεία)

Το 2019 το ποσοστό των ατόμων της Περιφέρειας που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού ανέρχεται στο 27,6% (3^η καλύτερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας) και το ποσοστό των ατόμων της Περιφέρειας που βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας στο 17,4% (ελαφρά χαμηλότερο του μ.ο. της χώρας). Ως προς τις υλικές στερήσεις ποσοστό ομοίως η Περιφέρεια παρουσιάζει μαζί με τα Ιόνια Νησιά την καλύτερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας (11,7% έναντι 16,2% της χώρας), ενώ ως προς την ηλικιακή κατανομή του πληθυσμού (% άνω των 60 ετών) τη 4^η δυσμενέστερη (12,7% έναντι 13,8% της χώρας).¹⁴

Επιπρόσθετα, **στην Περιφέρεια σε μικρότερο βαθμό σε σύγκριση με άλλες περιφέρειες της χώρας συγκεντρώνονται ομάδες του πληθυσμού που αντιμετωπίζουν αυξημένο τον κίνδυνο του κοινωνικού αποκλεισμού** (π.χ Ρομά, άστεγοι κλπ).

Όσον αφορά στον τομέα της **Υγείας**, το **σημαντικότερο πρόβλημα αφορά τις ενδοπεριφερειακές ανισότητες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας** είτε λόγω κοινωνικοοικονομικών, είτε λόγω γεωγραφικών χαρακτηριστικών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η ύπαρξη σημαντικού αριθμού ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών με μειωμένη πρόσβαση των κατοίκων τους σε υπηρεσίες υγείας.

Παράλληλα, αν και έχει προχωρήσει η αναβάθμιση σημαντικού αριθμού κλινών των Νοσοκομείων της Περιφέρειας, **καταγράφονται ακόμη ελλείψεις καινοτόμου τεχνολογίας και ειδικών μονάδων με αποτέλεσμα τη μειωμένη ποιότητα & αποτελεσματικότητα διαγνώσεων και θεραπειών**.

Η εμφάνιση και η εξάπλωση της πανδημίας του Covid-19 δημιουργεί πρόσθετες ανάγκες στήριξης του συστήματος υγείας και ενίσχυσης των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας.

¹¹ Eurostat, lfst_r_lfu3rt, 20.11.2023

¹² Eurostat, lfst_r_lfu2ltu, 20.11.2023

¹³ Eurostat, lfst_r_lfu3rt, 20.11.2023

¹⁴ Eurostat, ilc_peps11, 20.11.2023

Εκπαίδευση - Δια Βίου Μάθηση

Οι εκπαιδευτικές επιδόσεις του πληθυσμού της Ηπείρου κυμαίνονται στο μέσο όρο των επιδόσεων της χώρας. Αντίθετα, η συνολική κατανομή του μαθητικού πληθυσμού της ανά βαθμίδα εκπαίδευσης διαφέρει σημαντικά, με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μαθητικού πληθυσμού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, έναντι των υπολοίπων βαθμίδων εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, το 2018 στην Περιφέρεια συγκεντρώνεται το 4,4% των σπουδαστών ανώτατης εκπαίδευσης της Ελλάδας (ISCED5-8). Η αναλογία του ποσοστού των φοιτητών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έναντι του ποσοστού του πληθυσμού ανέρχεται στο 1,4 (τρίτη καλύτερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών της χώρας).¹⁵

Η σημαντική συγκέντρωση σπουδαστών σε συνδυασμό με την αναγκαία συμπλήρωση και επέκταση των υποδομών (κυρίως εξοπλισμού) τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Περιφέρεια θα συμβάλλει στην περαιτέρω παραγωγή έρευνας και καινοτομίας εντός των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Τέλος, το ποσοστό των νέων της Περιφέρειας που δεν εργάζονται, ούτε συμμετέχουν σε κάποιο πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης («άτομα NEET») το 2019 ανέρχεται σε 11,7% στις ηλικίες 15-24 ετών, έναντι 12,5% στο επίπεδο της χώρας (3^η καλύτερη επίδοση μεταξύ των Περιφερειών) και 18,1% στις ηλικίες 18-24 ετών, έναντι 17,9% στο επίπεδο της χώρας.¹⁶

Η χαμηλή συμμετοχή στην εκπαίδευση και την κατάρτιση συνδέεται και με τις ελλείψεις υποδομών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης στην Περιφέρεια και για τον λόγο αυτό είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός τους.

¹⁵ Eurostat, educ_uoe_enrt06 & educ_uoe_enrt05, 03.05.2021

¹⁶ Eurostat, edat_ifse_22, 08.02.2021

5.2. Αξιολόγηση επικαιρότητας της λογικής παρέμβασης και των ειδικών στόχων του ΕΠ

Σύμφωνα με την υφιστάμενη κατάσταση των τομέων δραστηριότητας στους οποίους δραστηριοποιείται το ΠΕΠ Ηπείρου, **παραμένει επίκαιρη η στόχευση του Προγράμματος για την επίτευξη των πέντε Στρατηγικών Στόχων:**

- Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ.
- Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη
- Ενίσχυση υποδομών μεταφορών.
- Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας
- Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

Οι επιμέρους ανάγκες ανά Στρατηγικό Στόχο του Προγράμματος έχει ήδη αποτυπωθεί αναλυτικά στον Πίνακα 1. Η Λογική Παρέμβασης του ΕΠ Ηπείρου 2014-2020 ανά Άξονα Προτεραιότητας της Ενότητας 1.1.1. *Στόχοι, Δομή και Λογική Παρέμβασης του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020* (ανάγκες και προκλήσεις ανά Άξονα Προτεραιότητας και Θεματικό Στόχο της Στρατηγικής Ευρώπη 2020, επιλεγμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες, Ειδικοί ανά Επενδυτική Προτεραιότητα Στόχοι, αναμενόμενα αποτελέσματα ανά Ειδικό Στόχο, Ενδεικτικές Δράσεις για την επίτευξη των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων και αναμενόμενες εκροές από την υλοποίηση των Δράσεων του Προγράμματος).

Στον Πίνακα που ακολουθεί με βάση αυτή τη διάταξη της λογικής του Προγράμματος καταρτίζεται μήτρα συνάφειας του ΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου με τα προβλήματα και τις ανάγκες όπως διαμορφώνονται από την τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Περιφέρειας των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων ανά Άξονα Προτεραιότητας με τις ανάγκες όπως διαμορφώνονται στον παραπάνω μνημονευόμενο Πίνακα.

Στους δύο κάθετους άξονες εμφανίζονται οι ανάγκες ανά Θεματικό Στόχο, έτσι όπως αυτοί έχουν αποτυπωθεί στο εγκεκριμένο Πρόγραμμα και απορρέουν από την εκτίμηση των εξελίξεων στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον υλοποίησης του Προγράμματος, καθώς και στους τομείς πολιτικής στους οποίους εστιάζονται οι παρεμβάσεις του.

Στον οριζόντιο Άξονα εμφανίζονται οι επιλεγείσες ανά Άξονα Προτεραιότητας Επενδυτικές Προτεραιότητες, ενώ στο σημείο διασταύρωσης των αναγκών με τις Επενδυτικές Προτεραιότητες αποτυπώνεται ο βαθμός κάλυψης αυτών των αναγκών (υψηλή με σκούρο πράσινο, μέση κάλυψη με πράσινο και χαμηλή κάλυψη με ανοικτό πράσινο). Στην τελευταία στήλη εμφανίζεται η συχνότητα με την οποία οι ανάγκες καλύπτονται από τις επιμέρους Επενδυτικές Προτεραιότητες (αριθμός Επενδυτικών Προτεραιοτήτων) ανεξάρτητα του βαθμού κάλυψης των αναγκών.

Επισημαίνεται ότι έχει προστεθεί στο ΘΣ 3 η **ανάγκη χρηματοδότησης δράσεων στήριξης της επιχειρηματικότητας της Περιφέρειας, στο πλαίσιο της προσπάθειας αντιμετώπισης και περιορισμού των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19.**

Πίνακας 43. Μήτρα συνάφειας του ΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου με τα προβλήματα και τις ανάγκες

ΘΣ	Ανάγκες	ΑΠ1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ						ΑΠ2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη						ΑΠ3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	ΑΠ4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας			ΑΠ5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων									
		1a	1b	2b	2c	3a	3b	3c	4c	4e	5b	6b	6c	6d	6e	7b	9a	9b	10a	8i	8v	9i	9ii	9iii	9iv		9v
1	- Ενίσχυση δράσεων ΕΤΑΚ σε βιολογική γεωργία, υδατοκαλλιέργειες, επεξεργασίας, τυποποίηση, συμπράξεις, προβολή, τουρισμό, πολιτισμό, διαχείριση και προστασία περιβάλλοντος και ΑΠΕ. - Εστίαση σε 2-3 βασικές περιοχές έρευνας και επέκταση των υπηρεσιών τεχνολογίας για τη βιομηχανία γαλακτοκομικών προϊόντων και άλλων γεωργικών προϊόντων διατροφής - Ενίσχυση της ιδιωτικής Ε&Α																										10
2	- Ενίσχυση επιχειρήσεων για τη χρήση ΤΠΕ και ευρυζωνικότητας - e-διακυβέρνηση σε Περιφέρεια και Δήμους. - e-learning στα σχολεία, σε ομάδες πολιτών, ανάπτυξη κατάλληλων υλικών και διάχυση. - Ηλεκτρονική συνεργασία των νοσοκομείων. - Ψηφιακή ανάδειξη πολιτιστικού πλούτου, ηλεκτρονικά μουσεία. - Επενδύσεις σε ΤΠΕ και τεχνογνωσία για προστασία του περιβάλλοντος και βιοποικιλότητας																										6
3	- Σύνδεση εφαρμοσμένης έρευνας και επιχειρήσεων. - Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των επιχειρήσεων, της παραγωγής / αφομοίωσης καινοτομίας. - Βελτίωση ποιότητας προϊόντων, εξαγωγών γεωργικών προϊόντων, υδατοκαλλιέργειας. - Ανάπτυξη νέων ειδικών μορφών τουρισμού - Βελτίωση υποδομών εγκατάστασης και εξυπηρέτησης ΜΜΕ. - Αποτελεσματική χρήση του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. Κάλυψη των αυξημένων αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων της Περιφέρειας λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19																										8
4	- Ενεργειακή αποδοτικότητα και εξοικονόμηση ενέργειας στις επιχειρήσεις και στον οικιακό τομέα - Ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων. - Εγκαταστάσεις μικρής κλίμακας για τηλεθέρμανση με βιομάζα - Εκμετάλλευση βιοαερίου από απόβλητα. - Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ομάδων πληθυσμού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας																										5
5	- Εκπόνηση διαχειριστικών σχεδίων και δημιουργία υποδομών για την αντιμετώπιση κινδύνων (πλημμύρες, υπερχείλιση παράκτιων περιοχών, πυρκαγιές) - Προστασία του εδάφους και των ακτών από την διάβρωση - Ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων και ανάπτυξη εναλλακτικών πηγών και τεχνικών αξιοποίησης αποθεμάτων - Προστασία και ορθολογική διαχείριση δασών και γεωργικής γης - Ολοκληρωμένη διαχείριση των παραμέτρων καθορισμού της βιοποικιλότητας - Πράσινες υποδομές για την επανασύνδεση υφιστάμενων φυσικών περιοχών - Ενημέρωση – ευαισθητοποίηση πολιτών για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις πρακτικές άμβλυνσης των επιπτώσεων																										5
6	- Αποτελεσματική ορθολογική διαχείριση των απορριμμάτων. - Κατασκευή μονάδας επεξεργασίας ΑΣΑ και ολοκλήρωση υποδομών που ΑΠ απαιτηθούν για την εναρμόνιση με το νέο εθνικό σχεδιασμό. - Αξιοποίηση γεωργοκτηνοτροφικών αποβλήτων και ίλυσος ΕΕΛ. - Ολοκλήρωση υποδομών διαχείρισης λυμάτων για εναρμόνιση με την κοινοτική νομοθεσία και κατασκευή ή/και επέκταση υποδομών σε μικρούς οικισμούς που βρίσκονται πλησίον ευαίσθητων υδάτινων αποδεκτών και οικοσυστημάτων. - Αποτελεσματική διαχείριση /αξιοποίηση ειδικών αποβλήτων μέσω ΣΔΙΤ και ιδιωτικών επενδύσεων Εκσυγχρονισμός και παρακολούθηση των δικτύων ύδρευσης και διασφάλιση της ποιότητα και της ποσότητας του νερού. - Παρακολούθηση του υδατικού ισοζυγίου, εφαρμογή ειδικών τιμολογιακών πολιτικών, αποκατάσταση υδροφορέων και δημιουργία σύγχρονων φορέων διαχείρισης υδάτων. - Προστασία και διατήρηση της φυσικής κληρονομιάς και βιοποικιλότητας - Ολοκλήρωση σχεδίων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών. - Προστασία, ανάδειξη και διαχείριση τοπίων πολιτιστικής και ιστορικής σημασίας και έλεγχος των πιέσεων. - Ολοκλήρωση πολεοδομικού σχεδιασμού - Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων περιοχών																										4

ΘΣ	Ανάγκες	ΑΠ1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ						ΑΠ2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη						ΑΠ3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	ΑΠ4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας			ΑΠ5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων									
		1a	1b	2b	2c	3a	3b	3c	4c	4e	5b	6b	6c	6d	6e	7b	9a	9b	10a	8i	8v	9i	9ii		9iii	9iv	9v
7	- Αναβάθμιση του Αεροδρομίου Ιωαννίνων - Δρομολόγηση της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Ηπείρου με την υπόλοιπη Ελλάδα - Ολοκλήρωση των ΔΕΔ-Μ που διέρχονται ή εξυπηρετούν την Περιφέρεια και διασύνδεση αυτών (Ιόνια οδός, Ε65) - Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης αστικών κέντρων, σημείων τουριστικού ενδιαφέροντος και Συνοριακών σταθμών με τα ΔΕΔ-Μ - Παραμβάσεις βελτίωσης οδικής ασφάλειας - Ανάπτυξη Θαλάσσιων διαδρόμων και διασυνδέσεων μακροπεριφέρειας Αδριατικής – Ιονίου.																										4
9	- Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση - Βελτίωση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού αγροτο-διατροφικού συστήματος. - Σύνδεση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας - Σύνδεση κατάρτισης με τις ανάγκες τις τοπικής αγοράς εργασίας - Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και δράσεων τηλεκατάρτισης για την απομακρυσμένη εκπαίδευση ενηλίκων - Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε σχέση με την παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων σε δυσπρόσιτες περιοχές. - Λειτουργία δομών ανοικτού πανεπιστημίου και διαδικασιών αξιολόγησης στα ΑΕΙ της Περιφέρειας.																										9
10	- Χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής για την καταπολέμηση των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού - Υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας - Ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας - Δημιουργία τοπικών κοινωνικών συμπράξεων - Ολοκληρωμένο δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας με διασύνδεση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων παροχής κοινωνικής προστασίας, δημοσίου, ιδιωτικού, εθελοντικού, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. - Ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. - Ανάπτυξη μοντέλων παροχής υπηρεσιών και καινοτόμων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας που αξιοποιούν στο έπακρο τις ΤΠΕ																										7
8	Χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής πολιτικής για την καταπολέμηση των φαινομένων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού																										5
9	- Υποστήριξη της κοινωνικής επιχειρηματικότητας - Ανάπτυξη κοινωνικής καινοτομίας - Δημιουργία τοπικών κοινωνικών συμπράξεων - Ολοκληρωμένο δίκτυο Παροχής Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας με διασύνδεση όλων των κοινωνικών υπηρεσιών και φορέων παροχής κοινωνικής προστασίας, δημοσίου, ιδιωτικού, εθελοντικού, κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα. - Ισχυρές κοινωνικές υπηρεσίες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση - Ανάπτυξη μοντέλων παροχής υπηρεσιών και καινοτόμων μεθόδων διάγνωσης και θεραπείας που αξιοποιούν στο έπακρο τις ΤΠΕ																										6

Υψηλός βαθμός κάλυψης Μέσος βαθμός κάλυψης Χαμηλός βαθμός κάλυψης

Στο πλαίσιο της εκτίμησης της κάλυψης των αναγκών, όπως εντοπίζονται σε αυτό το στάδιο της αξιολόγησης, από τις υπάρχουσες Επενδυτικές Προτεραιότητες, καταρχήν καθίσταται σαφές ότι η πλειονότητα των αναγκών καλύπτονται από τις Επενδυτικές Προτεραιότητες του ΠΕΠ Ηπείρου.

Εξάιρεση αποτελούν οι επιμέρους ανάγκες που διατυπώνονται στο Πρόγραμμα και αφορούν:

- στη ανάγκη δημιουργία των υποδομών σύνδεσης της Περιφέρειας με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας και την αναβάθμιση του αεροδρομίου Ιωαννίνων. Η διατύπωση αυτών των αναγκών δεν υποστηρίχθηκε με ανάλογη πρόβλεψη στο επίπεδο Ειδικού Στόχου, δεικτών αποτελέσματος, ενδεικτικών δράσεων και δεικτών εκρών, καθώς σχεδιαστικά δεν ήταν στις προθέσεις του Προγράμματος η υποστήριξη της κάλυψης αυτών των αναγκών.
- στην ανάγκη δημιουργίας εγκαταστάσεων μικρής κλίμακας για τηλεθέρμανση με βιομάζα και την εκμετάλλευση βιοαερίου από απόβλητα (ομοίως η διατύπωση αυτής της ανάγκης δεν υποστηρίχθηκε από τις λοιπές συνιστώσες της λογικής παρέμβασης του ΠΕΠ).

Στην εκτίμηση του βαθμού κάλυψης των αναγκών δεν περιλαμβάνεται μόνο η χρηματοδοτική στήριξη παρεμβάσεων για την ικανοποίηση των αναγκών, μέσω των Ενδεικτικών Κατηγοριών Δράσεων των επιμέρους Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, αλλά και το κριτήριο της συμβολής και συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων και στην παραγωγή προστιθέμενης αξίας που κεφαλαιοποιείται με πόρους άλλων Θεματικών Στόχων και ενδεικτικών πόρων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων.

Από την εκτίμηση του βαθμού κάλυψης των αναγκών προκύπτει ότι αφενός το σύνολο των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου υποστηρίζουν περισσότερες από τρεις διατυπωμένες ανάγκες, ενώ κάθε διατυπωμένη ανάγκη υποστηρίζεται από περισσότερες της μιας Επενδυτικές Προτεραιότητες.

Από την συνολική ανάγνωση της μήτρας διαπιστώνεται **ο υψηλός βαθμός συνάφειας και συνέργειας του αναπτυξιακού σχεδιασμού ΕΠ της Περιφέρειας Ηπείρου**. Υψηλότερος βαθμός συνάφειας εντοπίζεται στην κάλυψη των αναγκών του συστήματος καινοτομίας και έξυπνης εξειδίκευσης, καθώς και στην κάλυψη των αναγκών πρόσβασης των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες και στην αγορά εργασίας. Αυτή η διαπίστωση επιβεβαιώνει τις βασικές σχεδιαστικές παραδοχές και τη στρατηγική στόχευση του Προγράμματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών της περιφερειακής εξειδίκευσης και της προστασίας του ανθρώπινου δυναμικού, έναντι των δραματικών αλλαγών και προκλήσεων που επέβαλε η παρατεταμένη δημοσιονομική και οικονομική κρίση.

5.3. Αποτίμηση προόδου και δυνατότητας επίτευξης των τιμών στόχου των Δεικτών Αποτελέσματος ΕΤΠΑ/ΕΚΤ

Στην παρούσα ενότητα εξετάζεται η πορεία υλοποίησης όλων των δεικτών αποτελέσματος του ΕΤΠΑ/ΕΚΤ και γίνεται εκτίμηση της επίτευξης ή μη της στοχοθεσίας των δεικτών για το 2023. Οι δείκτες αποτελέσματος του Ε.Π. παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Άξονας Προτεραιότητας 1

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων του Άξονα Προτεραιότητας 1 (ΕΤΠΑ).

Πίνακας 44. Δείκτες Αποτελεσμάτων Άξονα Προτεραιότητας 1

ΕΠ	ΕΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
1a	1.1.1	T1604	Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τ	αριθμός	6,8	2014	10,6	Δ/Υ
1b	1.2.1	T1605	Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων	Ευρώ	3.430.000	2014	4.116.000	45
2b	2.2.1	T1606	Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ	εκ. €	79	2011	86,9	574
2c	2.3.1	07904	Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες	%	39%	2014	45%	19
3a	3.1.1	T1608	Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες	ποσοστό	27,8	2014	29,2	54
3b	3.2.1	T1609	Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου	ευρώ	209.432.000	2014	340.000.000	2
3c	3.3.1	T1610	Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου	ευρώ	740.500.000	2010	750.000.000	45

T1604: Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τ

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 6,8 και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 10,6. Ο αριθμός των συμμετοχών μετράται με βάση τα στοιχεία του ΕΛΚΕ του Παν. Ιωαννίνων και του ΤΕΙ Ηπείρου και των λοιπών ερευνητικών οργανισμών της Περιφέρειας. Ως μονάδα μέτρησης ορίζεται η συμμετοχή κάθε οργανικής μονάδας των παραπάνω ιδρυμάτων σε έργα των προγραμμάτων της ΓΓΕΤ (ΕΠΑΝΕΚ), του ΠΕΠ Ηπείρου και του Ορίζοντα 2020 με πάνω από έναν εταίρο.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2022, η τιμή υλοποίησης του δείκτη το 2022 ήταν 18,44 συμμετοχές. Η εξέλιξη της τιμής του δείκτη ανά έτος αποτυπώνεται παρακάτω.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
T1604	αριθμός	10,6	4,00	5,50	4,67	5,75	21,60	19,17	20,14	19,00	18,44

Για την εκτίμηση των τιμών υλοποίησης ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των: α) Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που αφορούν την συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα του Ορίζοντα 2020 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2014-2022, β) ΕΥΔ ΕΤΑΚ για τα έτη 2014-2022 που αφορούν το «Ερευνώ Καινοτομώ» και γ) ΕΥΔ Ηπείρου που αφορούν τη δράση «Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων». Παρατηρώντας την πορεία εξέλιξης των τιμών υλοποίησης, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για το 2023. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προκύπτει από την δράση «1.1.1.1 Δράσεις ενίσχυσης

φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών φορέων» και εκτιμάται ότι θα είναι μηδενική δεδομένου ότι το μοναδικό έργο που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης και αφορά στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του Κέντρου Υποστήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής Ακρίβειας (ΚΥΕΙΑ) του ΠΓΝΙ, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα μεταφερθεί στο νέο Πρόγραμμα Ηπείρου 2021-2027.

T1605: Δαπάνη E&A των επιχειρήσεων

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 3.430.000 € και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 4.116.000 €. Η δαπάνη των επιχειρήσεων για έρευνα (ΔΕΠΕΤΑ) εξαρτάται από το ΑΕΠ της χώρας. Επομένως, μείωση του ΑΕΠ σε περιόδους ύφεσης έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση αυξημένου ποσοστού ΔΕΠΕΤΑ. Αντίθετα, σε περίοδο ανάπτυξης και με δεδομένο ότι οι δαπάνες των επιχειρήσεων δεν αυξάνονται με τον ίδιο ρυθμό όπως το ΑΕΠ, το ποσοστό ΔΕΠΕΤΑ μπορεί να μειωθεί. Εκτιμάται ότι οι λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, όπως η Περιφέρεια Ηπείρου, θα παρουσιάσουν ανάπτυξη (εν μέρει λόγω του τουρισμού) και επομένως θα έχουν μεγαλύτερο ΑΕΠ στα επόμενα χρόνια. Όμως, λόγω μικρής κρίσιμης μάζας ερευνητικού δυναμικού, δεν θα έχουν αυξημένες δαπάνες από πλευράς επιχειρήσεων για έρευνα. Στις περιφέρειες αυτές η εθνική RIS3 στοχεύει στην ανάπτυξη κουλτούρας καινοτομίας και «εισαγωγή» έρευνας από άλλες περιφέρειες και το εξωτερικό.

Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν το 2021 και προκύπτουν από το Δελτίο Δ10 - Δαπάνες E&A ανά περιφέρεια (NUTS2) του ΕΚΤ, σύμφωνα με τα οποία η δαπάνη E&A των επιχειρήσεων το 2021 ανέρχεται σε 9.400.000 €. Τα δημοσιευμένα στοιχεία, όπως παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2022, αφορούν το 2020 και, σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά η δαπάνη E&A των επιχειρήσεων το 2020 ανέρχεται σε 7.520.000 €. Η εξέλιξη της τιμής του δείκτη ανά έτος, για τα έτη που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, αποτυπώνεται παρακάτω.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T1605	Ευρώ	4.116.000		3.480.000	5.250.000	18.030.000	9.540.000	7.220.000	7.520.000	9.400.000

Παρατηρώντας την πορεία εξέλιξης των τιμών υλοποίησης, φαίνεται να υπερκαλύπτεται ο στόχος για το 2023. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 45 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 44/2017, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. *Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν έχει δηλωθεί σε 1 πράξη της ανωτέρω πρόσκλησης (mis 5033107).*

T1606: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 79 εκ. € και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 86,9 εκ. €. Η τιμή βάσης προέκυψε από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2011 για τον κλάδο "Ι Ενημέρωση και Επικοινωνία" (Δελτίου Τύπου της 13-1-2014, "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2011", ΕΛΣΤΑΤ), ενώ η τιμή στόχου του 2023 προέκυψε προσθέτοντας μία αύξηση κατά 10% στην τιμή βάσης.

Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία, όπως παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2020, αφορούν το 2020 και σύμφωνα με αυτά η τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 47 εκ. € (ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΛΣΤΑΤ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2020"). Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιμής του δείκτη, για τα έτη που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
T1606	εκ. €	86,90	41,00	40,00	41,00	43,00	43,00	45,00	47,00

Παρατηρείται ότι η τιμή υλοποίησης για το 2020 είναι χαμηλότερη από την τιμή βάσης του δείκτη. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 574 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)» Ι και ΙΙ.

07904: Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 39% και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 45%. Ο δείκτης αναφέρεται στο σύνολο Δημόσιων Φορέων που θα παρέχουν πρόσβαση (υπηρεσίες e-government) στους πολίτες. Η πηγή των στοιχείων είναι η ετήσια Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα της ΕΛΣΤΑΤ. Μετράει το ποσοστό του αριθμού των κατοίκων της Περιφέρειας που έχουν πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες μέσω του διαδικτύου προς τον συνολικό αριθμό των κατοίκων της Περιφέρειας. Τα δεδομένα για τον υπολογισμό του δείκτη στηρίζονται στην ετήσια έρευνα που διεξάγει η Eurostat, μέσω των εθνικών στατιστικών οργανισμών για τη χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά και σε ατομικό επίπεδο. Καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Περιφέρεια Ηπείρου, για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που αντιστοιχούν στο *NUTS Kentriki Ellada*.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2022, η τιμή υλοποίησης του δείκτη το 2021 ήταν 44%, και παρακάτω παρουσιάζεται η μεταβολή της τιμής για τα έτη 2014-2021.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
07904	%	45,00	39,00	35,00	38,00	38,00	37,00	41,00	39,00	44,00

Φαίνεται να επιτυγχάνεται ο στόχος για το 2023, λαμβάνοντας υπόψη ότι υλοποιούνται επιπλέον σχετικές δράσεις που θα αυξήσουν το ποσοστό των πολιτών που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 19 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 56/2018, 57/2018 και 64/2018, μέσω των οποίων αναπτύσσονται ή αναβαθμίζονται 45 ψηφιακά συστήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες από διάφορους Φορείς της Περιφέρειας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, 2 από τις ανωτέρω πράξεις θα απενταχθούν και οι υπόλοιπες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

T1608: Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 27,8% και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 29,2%. Ο δείκτης ορίζεται ως το ποσοστό επί του συνόλου των επιχειρήσεων της Περιφέρειας που προχώρησαν στην καινοτομία προϊόντος ή και διαδικασίας. Η τιμή βάσης προέκυψε από έρευνα για την Καινοτομία στις Ελληνικές Επιχειρήσεις 2012 – 2014 που εκπόνησε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), ενώ η τιμή στόχος για το έτος 2023 εκτιμήθηκε με υπολογιζόμενη αύξηση 5%.

Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία δόθηκαν από το ΕΚΤ και αφορούν το ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες στο σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας τις διετίες 2014-2016 (35,98%) και 2016-2018 (53,60%) και παρουσιάζονται στους Πίνακες Δεδομένων "ΜμΕ που εισάγουν καινοτομίες προϊόντος ή/και διαδικασίας, ως ποσοστό (%) των ΜμΕ". Βάσει αυτών, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος του δείκτη για το 2023. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 54 ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών». Επισημαίνεται ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν έχει καταχωρηθεί στις πράξεις της Πρόσκλησης 82/2019 στο ΟΠΣ.

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν υπολογίζεται πλέον. Το ΕΚΤ υπολόγισε μόνο για την περίοδο 2016-2018 τους δείκτες προκειμένου να μην διακοπεί η χρονοσειρά.

Σύμφωνα με τη 4η έκδοση του εγχειριδίου Oslo (Oslo Manual 2018, Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition), η οποία ακολουθείται από τη Eurostat, και ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, για τη μέτρηση της καινοτομίας (Community Innovation Survey), διακρίνονται πλέον δύο τύποι καινοτομίας. Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγχειριδίου Oslo διέκριναν τέσσερις τύπους καινοτομίας. Καθώς η καινοτομία διαδικασίας δεν καταμετρείται ξεχωριστά δεν είναι δυνατός ο υπολογισμός του δείκτη.

T1609: Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 209.432.000 € και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 340.000.000 €. Η τιμή βάσης προέκυψε βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιμων στοιχείων από τον ΣΕΒΕ (2014) για την αξία των εξαγωγών. Βάσει των στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των εξαγωγών της Περιφέρειας Ηπείρου αυξήθηκε το διάστημα 2008-2012 με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 5,5%. Θεωρώντας ότι η τάση αυτή διατηρείται, καθώς η ενίσχυση της εξωστρέφειας αποτελεί βασική στρατηγική επιλογή της χώρας για την περίοδο 2014-2020, υπολογίστηκε ο στόχος του δείκτη για το 2023.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης του 2022 και προκύπτουν από την Έκθεση του ΣΕΒΕ "Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια" (Περίοδος 2019-2021) η οποία δημοσιεύτηκε το 2023 και επικαιροποιεί τα στοιχεία των ετών 2017-2019 της προηγούμενης μελέτης, οι εξαγωγές της Περιφέρειας το 2021 ήταν 413.100.000 €. Παρακάτω παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιμής του δείκτη, για τα έτη που υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T1609	Ευρώ	340.000.000	209.432.000	315.992.000	263.903.000	267.600.000	306.700.000	323.800.000	350.600.000	413.100.000

Παρατηρείται αύξηση της τιμής υλοποίησης κατά την περίοδο 2016-2021 και ο στόχος του 2023 έχει ήδη επιτευχθεί. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 2 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 77/2019 «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια», στις οποίες όμως δεν έχει δηλωθεί ο συγκεκριμένος δείκτης.

T1610: Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 740.500.000 € (2010) και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 750.000.000 €. Η τιμή βάσης προέκυψε βάσει των διαθέσιμων οριστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ (2010) για τις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου σε όλους τους κλάδους εκτός αγροτικού τομέα, δημόσιας διοίκησης και άμυνας. Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου έγινε η παραδοχή ότι από το 2010 μέχρι το 2016, ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής της Περιφέρειας ήταν ίδιος με τον ρυθμό μεταβολής σε επίπεδο χώρας - 10,6% και από το 2016 γίνεται η παραδοχή ότι αναμένεται η τάση να αντιστραφεί με την είσοδο της χώρας σε ρυθμούς ανάπτυξης. Συνεπώς για το 2023, στοχεύοντας στο να επανέλθουν οι τιμές στην εκκίνηση του 2010, ορίστηκε η τιμή στόχος για το 2023, η οποία αντιστοιχεί σε ετήσιο ρυθμό αύξησης που ξεπερνά το 3%.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που προκύπτουν από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που έγιναν διαθέσιμα το 2023 στο δελτίο "01. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2020)", η τιμή για το 2020 είναι 293.000.000 €, ενώ στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται και η τιμή των προηγούμενων ετών.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
T1610	Ευρώ	750.000.000	229.000.000	217.000.000	203.000.000	206.000.000	252.000.000	261.000.000	293.000.000

Παρατηρείται ότι η τιμή υλοποίησης είναι χαμηλότερη από την τιμή βάσης του δείκτη. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει σημαντικός κίνδυνος μη επίτευξης του στόχου του δείκτη, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν από το 2020 και μετά λόγω της πανδημίας του Covid 19. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από την πράξη «Συμμετοχή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II», η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση 150 επιχειρήσεων της Περιφέρειας, καθώς και από 44 έργα της πρόσκλησης 74/2018.

Άξονας Προτεραιότητας 2

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων του Άξονα Προτεραιότητας 2 (ΕΤΠΑ).

Πίνακας 45. Δείκτες Αποτελεσμάτων Άξονα Προτεραιότητας 2

ΕΠ	ΕΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
4c	4.3.1	T1613	Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας	ktoe	57,99	2013	902,1	5
4e	4.5.1	T1614	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ CO2	48.726.297	2012	58.858.799	24
5b	5.2.1	T1616	Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ	km2	939	2014	850	10
6b	6.2.1	T1661	Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	%	80	2014	75	21
6c	6.3.1	T1662	Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ	Αριθμός	994.770	2014	1.297.949	8
6d	6.4.1	T1663	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	%	62,69	2014	100,00	5
6e	6.5.1	T1620	Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 µg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης	Αριθμός ημερών κατ έτος	33,00	2014	35,00	7

T1613: Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 57,99 ktoe και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 902,1 ktoe. Ο δείκτης προκύπτει από την έκθεση του άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Η σχετική έκθεση υποβλήθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2013 και στην συνέχεια υποβάλλεται ως τμήμα του ΕΣΔΕΑ (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση), το οποίο υποβάλλεται κάθε τρία χρόνια σύμφωνα με την ίδια Οδηγία. Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/1999 για τη διακυβέρνηση της Ενεργειακής Ένωσης και της Δράσης για το Κλίμα, οι στόχοι ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων περιλαμβάνονται πλέον στα ενοποιημένα Εθνικά Σχέδια για την Ενέργεια και το Κλίμα και η πρόοδος επίτευξης των ενεργειακών στόχων παρακολουθείται στη συνέχεια με την υποβολή ενοποιημένων Εκθέσεων ανά διετία. Η Ελλάδα υπέβαλε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα το Δεκέμβριο του 2019 (ΦΕΚ 4893/Β/31.12.2019), στο οποίο τίθεται στόχος βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης στην τελική κατανάλωση ενέργειας κατά ποσοστό τουλάχιστον στο 38% σε σχέση με την πρόβλεψη εξέλιξης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το έτος 2030, όπως είχε εκτιμηθεί το έτος 2007 στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών ενεργειακών πολιτικών, με αποτέλεσμα η τελική κατανάλωση ενέργειας να μην ξεπεράσει τα 16,5 Mtoe το έτος 2030 στο σύνολο της χώρας.

Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη αποτελέσματος αφορούν το εθνικό επίπεδο, καθώς η επενδυτική προτεραιότητα 4c του ΠΕΠ συμβάλλει στο εθνικό στόχο και την εθνική πολιτική.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα αφορούν το έτος 2021 και δόθηκαν από το ΥΠΕΝ το 2023 (Εκθέσεις προόδου για την επίτευξη του στόχου του άρθρου 7, της Οδηγίας 27/2012 - Εκθέσεις Προόδου για τα έτη αναφοράς 2020 και 2021). Σύμφωνα με αυτά, η ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας το 2021 ανέρχεται σε 894,75 ktoe. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζεται η εξέλιξη της τιμής του δείκτη, από όπου προκύπτει ότι σημειώνεται μια συνεχής αύξηση της ετήσιας εξοικονόμησης τελικής ενέργειας κατά την περίοδο 2014-2021.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T1613	ktoe	902,1	144,05	192,13	231,97	552,71	764,09	812,14	860,19	894,75

Λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζουν να υλοποιούνται δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας σε όλη τη χώρα, κρίνεται ότι ο στόχος του δείκτη για το 2023 θα υπερκαλυφθεί. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 2 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 53/2018 και 85/2019, μέσω των οποίων αναβαθμίζονται κτίρια και βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση στον οικιακό κτιριακό τομέα. Επίσης, στον δείκτη συμβάλλουν 3 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 72/2018, που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια (στις 3 αυτές πράξεις δεν έχει καταχωρηθεί ο δείκτης στο ΟΠΣ).

T1614: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 48.726.297 τόνους ισοδύναμου CO₂ και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 58.858.799 τόνοι ισοδύναμου CO₂. Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη αποτελέσματος αφορούν το εθνικό επίπεδο καθώς η επενδυτική προτεραιότητα 4ε του ΠΕΠ συμβάλλει στον εθνικό στόχο και την εθνική πολιτική. Οι συγκεκριμένες τιμές έχουν προσδιοριστεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (Γενική Γραμματεία Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ) βάσει της μεθοδολογίας με την οποία συντάσσεται η ετήσια έκθεση της χώρας για την κλιματική αλλαγή προς τα Ηνωμένα Έθνη. Δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε περίοδο αναπτυξιακής ύφεσης, είναι αναμενόμενο από το 2012 έως το 2023 (διάστημα στο οποίο αναμένεται ανάκαμψη) οι εκπομπές CO₂ να αυξηθούν. Η αύξηση αυτή θα είναι περιορισμένη λόγω των προβλεπόμενων μέτρων. Εξάλλου, οι συγκεκριμένες τιμές σε επίπεδο χώρας συνδέονται και με τους στόχους της χώρας σε σχέση με τη Στρατηγική E2020. Ο στόχος της χώρας για το 2020 για το δείκτη «εκπομπές CO₂ για τομείς εκτός ΣΕΔΕ» είναι «-4% σε σχέση με τις τιμές του 2005». Επειδή από το 2005 έως το 2012 η μείωση ήταν ήδη της τάξης του 29%, υπάρχουν περιθώρια αύξησης έως το στόχο που έχει τεθεί σε σχέση με την E2020. Συμπερασματικά, η αύξηση του στόχου σε σχέση με την πιο πρόσφατα διαθέσιμη τιμή βάσης (2012) συνδέεται με τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας και με τις υποχρεώσεις της ως προς την Στρατηγική E2020 (-4% επί των τιμών του 2005).

Η τιμή του δείκτη δόθηκε από το ΥΠΕΝ το 2023 και σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, η τιμή για το 2021 είναι 43.941.100 τόνοι. Η εξέλιξη της τιμής του δείκτη για την περίοδο 2015 – 2021 παρουσιάζεται παρακάτω.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T1614	Τόννοι Ισοδύναμου CO ₂	58.858.799		45.449.373	44.897.200	45.819.230	44.694.510	44.744.900	42.900.000	43.941.100

Βάσει των παραπάνω στοιχείων, φαίνεται ότι η υλοποίηση του δείκτη το 2023 είναι πιθανό να είναι χαμηλότερη του στόχου που έχει τεθεί, καθώς οι σχετικές δράσεις που υλοποιούνται και τα προβλεπόμενα μέτρα ίσως αποδίδουν περισσότερο από το αναμενόμενο στη μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.

Η συμβολή του προγράμματος στο δείκτη προέρχεται από 24 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 14/2016, 15/2016, 35/2016, 81/2019 και 102/2020 που περιλαμβάνουν σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, σχέδια δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Από τις ανωτέρω πράξεις, 9 έχουν ολοκληρωθεί, 3 θα μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027 και οι υπόλοιπες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως 31.12.23.

T1616: Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της οδηγίας 2007/60/ΕΚ

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 939 km² και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 850 km². Για τον καθορισμό της τιμής βάσης υπολογίστηκε η συνολική έκταση των ζωνών υψηλού κινδύνου πλημμύρας στο Υ.Δ. Ηπείρου, βάσει της Προκαταρκτικής Αξιολόγησης Κινδύνων Πλημμύρας. Ως στόχος τίθεται η μείωση της έκτασης των περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή της οδηγίας 2007/60/ΕΚ. Η τιμή στόχου για το 2023 προσδιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το διαθέσιμο προϋπολογισμό και ένα μέσο μοναδιαίο κόστος για την υλοποίηση των σχετικών παρεμβάσεων.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης του 2022, δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του δείκτη καθώς δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα για την υλοποίηση παρεμβάσεων και τα αποτελέσματα αυτών. Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 10 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 55/2018, 59/2018 και 86/2019, αν και έχει καταχωρηθεί και σε πράξεις των προσκλήσεων 34/2016 και 65/2018, οι οποίες θεωρείται ότι δεν σχετίζονται άμεσα και θα πρέπει να αφαιρεθεί ο δείκτης από τις αντίστοιχες πράξεις. Επίσης, σημειώνεται ότι ο δείκτης δεν έχει εισαχθεί σε όλες ενταγμένες πράξεις των ανωτέρω προσκλήσεων, οι οποίες συνεισφέρουν στην υλοποίηση του δείκτη. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω σχετικές πράξεις περιλαμβάνουν αντιπλημμυρικά έργα με στόχο την προστασία περιοχών συνολικής έκτασης 22,3 km² και 3 από τις πράξεις αυτές με στόχο την προστασία περιοχών συνολικής έκτασης 17 km² περίπου θα μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027.

T1661: Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 80% και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 75%.

Το ποσοστό επίτευξης του στόχου είναι 100% για το 2017. Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος ΣΔΛΑΠ Ηπείρου (θεώρηση της μελέτης το 2013) προσδιορίστηκαν 132 επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα σώματα, εκ των οποίων τα 106 είναι σε καλή και άνω κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική), δηλ. το 80%. Σύμφωνα με την 1η αναθεώρηση (2017) του Σχεδίου Διαχείρισης Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου προσδιορίζονται 133 επιφανειακά και υπόγεια υδάτινα σώματα, εκ των οποίων τα 100 είναι σε καλή και άνω κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική), δηλ. το 75%. Ο στόχος για το 2023 τέθηκε με σκοπό να αναχαιτιστεί η πτωτική τάση της ποιότητας των υδατινών συστημάτων της Περιφέρειας με την υλοποίηση των σχετικών πράξεων του ΠΕΠ.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης του 2022, δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του δείκτη από το 2017 (75%) καθώς δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα για την ολοκλήρωση σχετικών παρεμβάσεων και τα αποτελέσματα αυτών. Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 21 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 5/2015, 6/2015, 16/2016, 19/2016, 70/2018 και 90/2019, που περιλαμβάνουν επενδύσεις στη διαχείριση υδατινών πόρων και λυμάτων, υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης, υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού και οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού.

T1662: Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 994.770 και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 1.297.949. Η τιμή βάσης προέκυψε από σχετικά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2014 και η τιμή στόχου υπολογίστηκε λαμβάνοντας έναν μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 3%.

Τα πιο πρόσφατα δεδομένα αφορούν το έτος 2022 (1.521.405 διανυκτερεύσεις) και προκύπτουν από το 'Δελτίο Τύπου: Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ (οριστικά στοιχεία) της ΕΛΣΤΑΤ' (δημοσίευση 18/07/2023), ενώ παρακάτω παρουσιάζονται και τα στοιχεία των προηγούμενων ετών.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
T1662	αριθμός	1.297.949	994.770	943.076	1.002.859	1.153.945	1.615.661	1.634.104	663.154	848.488	1.521.405

Βάσει των ανωτέρω δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη την επίδραση της πανδημίας στις τουριστικές ροές κυρίως τα έτη 2020 & 2021, θεωρείται ότι είναι εφικτή η επίτευξη του στόχου του δείκτη για το 2023, ο οποίος κατά το 2022 έχει ήδη υπερκαλυφθεί. Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 8 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 13/2015, 40/2017, 91/2019 και 92/2020 που περιλαμβάνουν δράσεις για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας και δράσεις δικτύωσης και προβολής του τουρισμού. Οι πράξεις αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.

T1663: Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 62,69% και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 100%, τιμές που προέκυψαν από τη μελέτη «Κάλυψη των ελλείψεων των δεικτών στους Θεματικούς στόχους 4,5,6 για τα Ε.Π. 2014-20». Για να προσμετρηθεί μια περιοχή του δικτύου Natura 2000 στο δείκτη θα πρέπει να καλύπτεται από κάποιο εργαλείο διαχείρισης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

Το «Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών με Εργαλεία Διαχείρισης» το 2021 ανήλθε σε 100%, δεδομένης της σύστασης και λειτουργίας του «Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» που αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Ε.Κ.Π.Α.Α. και των 36 Φ.Δ.Π.Π. Η διαδικασία διαδοχής και μετονομασία του Ε.Κ.Π.Α.Α. σε Ο.Φ.Υ.Π.Ε.Κ.Α. καθορίστηκε με τις διατάξεις του ν. 4685/2020 (Α 92) όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4722/2020 (Α 177) & ν. 4819/2021 (Α 129). Ο Φορέας εποπτεύεται από το Υπ. Περιβάλλοντος, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Δεδομένου αυτού του νέου συστήματος διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, καλύπτεται το εργαλείο διαχείρισης που αφορά την «ύπαρξη σχήματος διοίκησης» κατά 100% σε όλες τις Προστατευόμενες Περιοχές της Περιφέρειας.

Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 5 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 48/2017, που περιλαμβάνουν επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου και έχουν ολοκληρωθεί.

T1620: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 µg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 33 (ημέρες κατ' έτος) και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 35 (ημέρες κατ' έτος). Η τιμή βάσης ορίστηκε βάσει των τελευταίων διαθέσιμων μετρήσεων της συγκέντρωσης των ΑΣ10. Η τιμή στόχος 2023 προσδιορίζεται βάσει των στόχων της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα και της προγενέστερης ΚΥΑ 3277/2009. Η τιμή στόχος προσδιορίζεται ως μέγιστη επιθυμούμενη τιμή. Το ότι η τιμή στόχος δηλώνεται μεγαλύτερη από την τιμή βάσης (ενώ επί της ουσίας ο ΕΣ προσδοκά την μείωση της ρύπανσης) οφείλεται στο γεγονός ότι οι τάσεις για την περιοχή των Ιωαννίνων όπως έχουν τεκμηριωθεί από πρόσφατες ερευνητικές και επιστημονικές εκθέσεις δείχνουν μια σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης των ΑΣ10 πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς την λήψη μέτρων το όριο των 35 ημερών θα ξεπεραστεί άμεσα. Στόχος συνεπώς της πολιτικής για την ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί η ανακοπή αυτής της τάσης σε επίπεδα τέτοια, ώστε να είναι "ανεκτά", να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται το επίπεδο διαβίωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία που διατίθενται από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου και καταγράφονται από τον σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων, η τιμή του δείκτη το 2018 ήταν 34% και το 2019 αυξήθηκε σε 40%, ενώ στο 2020 σε 65%. Το 2021 η τιμή του δείκτη διαμορφώθηκε σε 42% και το 2022 αυξήθηκε σε 47%. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται και οι τιμές των προηγούμενων ετών.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
T1620	Αριθμός ημερών/έτος	35,00	33,00	62,00	24,00	17,00	34,00	40,00	65,00	42,00	47,00

Παρατηρώντας την αύξηση στην τιμή του δείκτη τα τελευταία έτη, η επίτευξη του στόχου για το 2023 δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαια και κρίνεται ότι είναι αναγκαία η λήψη μέτρων και η υλοποίηση δράσεων για τον

περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 7 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 12/2015, 47/2017 και 52/2017 (δεν έχει καταχωρηθεί σε όλες τις πράξεις), που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Σημειώνεται στην υλοποίηση του δείκτη συμβάλουν διάφορα μέτρα και μέσα πολιτικής πέρα από το ΠΕΠ, όπως το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το Πράσινο Ταμείο, το ΕΠΑΝΕΚ κ.α. Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται να επιδράσουν τόσο στην μείωση της παραγωγής των ρύπων, όσο και στην δυνατότητα αυτοκαθαρισμού - διασποράς και απορρόφησης των ρύπων.

Άξονας Προτεραιότητας 3

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων του Άξονα Προτεραιότητας 3 (ΕΤΠΑ).

Πίνακας 46. Δείκτες Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 3

ΕΠ	ΕΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ
7b	7.2.1	T1667	Χρονοαπόσταση	λεπτά	60	2014	21	4
7b	7.2.2	T1624	Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου (τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες/ έτος)	Αριθμός	128	2013	100	1

T1667: Χρονοαπόσταση

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 60 (λεπτά) και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 21 (λεπτά). Η τιμή βάσης υπολογίστηκε λαμβάνοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για τη σύνδεση διαφόρων σημείων εντός της περιφέρειας μέσω του υφιστάμενου οδικού δικτύου, ενώ η τιμή στόχου προέκυψε εκτιμώντας το χρόνο που θα απαιτείται για τη σύνδεση των ίδιων σημείων μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων αναβάθμισης / ανακατασκευής του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, βάσει κα της Ετήσιας Έκθεσης υλοποίησης του 2022, δεν υπάρχει αλλαγή στην τιμή του δείκτη καθώς δεν ολοκληρώθηκαν σχετικές παρεμβάσεις στους ενταγμένους οδικούς άξονες. Στον δείκτη, σύμφωνα με τα στοιχεία των εντάξεων, συμβάλουν 4 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 22/2016, 50/2017, 51/2017 και 71/2018 που αφορούν έργα υποδομών μεταφορών, εκ των οποίων οι 2 θα αποτελέσουν τμηματοποιημένα έργα. Η τμηματοποίηση των 2 έργων που συμβάλλουν στο δείκτη εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την επίτευξη του στόχου του δείκτη για το 2023.

T1624: Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου (τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες/ έτος)

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 128 ατυχήματα και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 100 ατυχήματα. Ο δείκτης μετρά τροχαία ατυχήματα με σοβαρές σωματικές βλάβες. Με βάση τα στοιχεία της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηπείρου, το 2013 καταγράφηκαν 128 τέτοια ατυχήματα που αποτελεί και την τιμή βάσης. Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου 2023, βάσει των ιστορικών στοιχείων ανά έτος εκτιμάται ότι οι ενέργειες οδικής ασφάλειας θα συμβάλλουν στην μείωση των ατυχημάτων με ετήσιο ρυθμό μεταβολής μεγαλύτερου του ιστορικού μ.ο. (= 1,1%) και αθροιστικά κατά 28%.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, που διατίθενται από την ΕΛΣΤΑΤ, το 2021 σημειώθηκαν 106 τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες στην Περιφέρεια και στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι διαθέσιμες τιμές προηγούμενων ετών.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T1620	Αριθμός	100	157	136	140	119	146	103	108	106

Εκτιμάται ότι η επίτευξη του στόχου του δείκτη είναι εφικτή με την ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων έως το 2023. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 1 ενταγμένη πράξη της πρόσκλησης 38/2017, που αφορά

συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας.

Άξονας Προτεραιότητας 4

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων του Άξονα Προτεραιότητας 4 (ΕΤΠΑ).

Πίνακας 47. Δείκτες Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 4

ΕΠ	ΕΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ
9a	9.1.1	T1649	Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)	Αριθμός Επισκέψεων	951.311	2013	1.008.390	4
9a	9.1.2	T1665	Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	16	13
9b	9.2.1	T1666	Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης	Αριθμός	0	2014	1	1
10a	10.1.1	T1631	Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	ποσοστό	10,60	2013	9,70	7

T1649: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 951.311 (αριθμός επισκέψεων) και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 1.008.390 (αριθμός επισκέψεων). Η τιμή βάσης προκύπτει από στοιχεία του ESYnet για το 2013 και αφορά αθροιστικά στον αριθμό επισκέψεων στις μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας της Περιφέρειας. Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου 2023 γίνεται εκτίμηση, λαμβάνοντας υπόψη την εμπειρία της ΕΤΥΚΑ, για αύξηση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας σε ποσοστό 6%.

Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Υλοποίησης 2022, τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία αφορούν το 2021, οπότε οι επισκέψεις ανέρχονται σε 1.337.576. Δηλαδή ο στόχος του δείκτη είχε ήδη υπερκαλυφθεί. Στον παρακάτω Πίνακα παρουσιάζονται οι διαθέσιμες τιμές προηγούμενων ετών.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T1649	Αριθμός Επισκέψεων	1.008.390		1.237.177		1.277.157	1.174.653		1.235.697	1.337.576

Το πρόγραμμα συμβάλει στο δείκτη με 4 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 11/2015, που αφορούν βελτίωση των υποδομών υγείας, εκ των οποίων οι 2 έχουν ολοκληρωθεί.

T1665: Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες υπηρεσίες

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης μηδέν και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 16 δομές. Ο δείκτης αναφέρεται σε νέες δομές που παρέχουν «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες» συγκριτικά με τις υπηρεσίες που λάμβαναν οι ωφελούμενοι την προηγούμενη προγραμματική περίοδο από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων. Ως τιμή βάσης τίθεται 0, γιατί στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο καμία από τις εν λόγω δομές δεν παρείχε αυτό που ορίζεται στην ονομασία του δείκτη ως «διευρυμένες/βελτιωμένες υπηρεσίες». Για τον υπολογισμό της τιμής στόχου θεωρείται ότι όλες οι δομές θα παρέχουν τις υπηρεσίες που

ορίζονται ως «διευρυμένες/βελτιωμένες». Έτσι η τιμή στόχου ορίζεται σε 16 και αντιστοιχεί στον αριθμό των 10 δομών παντοπωλείου-συσσιτίου, 3 φαρμακείων, 2 Κέντρων Δημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία και 1 Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ετήσια Έκθεσης Υλοποίησης 2022, λειτουργούν 8 νέες δομές από το 2017, 5 επιπλέον από το 2018 που αφορούν δομές παροχής βασικών αγαθών και επιπρόσθετα λειτουργούν τα 2 ΚΔΗΦ από το 2019. Επομένως η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 15 δομές από το 2019, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
T1665	Αριθμός	16				8	13	15	15	15

Στον δείκτη συμβάλουν 13 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 7/2015, 32/2016, 49/2017 και 94/2020, μέσω των οποίων ενισχύονται 18 δομές συνολικά. Με την ολοκλήρωση όλων των πράξεων θα υπερκαλυφθεί ο στόχος του δείκτη για το 2023.

T1666: Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης μηδέν και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 1 (μειώθηκε από 5 σε 1 στην αναθεώρηση του 2021, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 9.2.1.1. «Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες»). Η τιμή βάσης είναι μηδέν, γιατί στην προηγούμενη Προγραμματική Περίοδο δεν χρηματοδοτήθηκαν σχετικές δράσεις.

Ο δείκτης τροφοδοτείται από το έργο «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή Ελευθεροχωρίου Φιλιππιάδας», το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 104/2020 και είναι σε εξέλιξη. Με την ολοκλήρωση του συγκεκριμένου έργου θα επιτευχθεί και η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023.

T1631: Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος έχει τιμή βάσης 10,6% και η τιμή στόχος για το έτος 2023 είναι 9,7%. Η τιμή βάσης προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2013 και η τιμή στόχος για το 2023 τίθεται βάσει του αντίστοιχου εθνικού στόχου της στρατηγικής E2020.

Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την υλοποίηση του δείκτη, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη σχετικές δράσεις. Επικαιροποιημένα στοιχεία θα προκύψουν από την νέα απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ και η επίτευξη του στόχου για το 2023 θεωρείται εφικτή. Το πρόγραμμα συμβάλει στη μείωση του ποσοστού του δείκτη με 7 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 18/2016, 37/2017, 41/2017, 45/2017 και 46/2017, που αφορούν υποδομές προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και εξοπλισμό εργαστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 4 έχουν ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι δεν έχει καταχωρηθεί σε όλες τις σχετικές πράξεις στο ΟΠΣ.

Άξονας Προτεραιότητας 5

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κοινοί δείκτες αποτελεσμάτων ΕΚΤ για τους οποίους έχει οριστεί τιμή στόχος στο Ε.Π. και οι ειδικοί δείκτες αποτελεσμάτων του Άξονα Προτεραιότητας 5 (ΕΚΤ).

Πίνακας 48. Δείκτες Αποτελέσματος Άξονα Προτεραιότητας 5

ΕΠ	ΕΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ
8i	8.1.1	CR06	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	0	2014	58	261
9i	9.1.1	10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε	Αριθμός	750	2016	5.273	7

ΕΠ	ΕΣ	ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΔΕΙΚΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΔΕΙΚΤΗ
			αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους					
9ii	9.2.1	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	10	10
9ii	9.2.2	11105	Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	39	2014	1	Δ/Υ
9iii	9.3.1	10502	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση	Αριθμός	37	2016	119	7
9iii	9.3.2	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	7	7
9iii	9.3.2	11509	Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ	ποσοστό	2,3	2016	3.8	4
9iv	9.4.1	11206	Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)	Ποσοστό	0	2014	35,7	1
9iv	9.4.1	11207	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια	Ποσοστό	1,39	2014	2,94	6
9iv	9.4.1	11208	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις	Ποσοστό	0	2014	31,4	5
9iv	9.4.2	05504	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	Αριθμός	0	2014	25	20
9v	9.5.1	11303	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	Αριθμός	3	2014	8	13
9vi	9.6.1	CR06	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	Αριθμός	0	2014	27	3
9vi	9.6.1	CR03	Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την λήξη συμμετοχής τους	Αριθμός	0	2014	15	1

CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (Επενδυτική Προτεραιότητα 8i)

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί έναν κοινό δείκτη αποτελεσμάτων του ΕΚΤ, για τον οποίο στο πρόγραμμα για την επενδυτική προτεραιότητα 8i έχει τεθεί τιμή βάσης 0 (2014) και τιμή στόχου 58 συμμετέχοντες για το 2023 (η τιμή στόχος αυξήθηκε στην αναθεώρηση του 2021 από 33 που ήταν αρχικά). Ο δείκτης τροφοδοτείται από δράσεις που περιλαμβάνουν προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη ανέρχεται σε 117 συμμετέχοντες στην παρούσα φάση, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι σχετικές δράσεις. Επομένως, ο δείκτης έχει ήδη παρουσιάσει υπερεπίτευξη.

10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (Επενδυτική προτεραιότητα 9i)

Ο συγκεκριμένος δείκτης για την επενδυτική προτεραιότητα 9i έχει τιμή βάσης 750 (2014) και τιμή στόχο 5.273 συμμετέχοντες για το 2023 (η τιμή στόχος αυξήθηκε στην αναθεώρηση του 2021 από 2.977 που ήταν αρχικά). Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 7 ενταγμένες πράξεις των προκλήσεων 01/2015, 29/2016, 42/2017, 66/2018, 83/2019, 95/2020 και 109/2021. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2022, η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 6.974 συμμετέχοντες το 2022, οπότε έχει υπερκαλυφθεί ο στόχος, όπως φαίνεται και στον παρακάτω Πίνακα.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Σύνολο
10502	Αριθμός	5.273	0	2	751	797	921	1.067	928	1.199	1.309	6.974

05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Επενδυτική προτεραιότητα 9ii)

Ο συγκεκριμένος δείκτης για την επενδυτική προτεραιότητα 9ii έχει τιμή βάσης 0 (2014) και τιμή στόχο 10 δομές για το 2023 (η τιμή στόχος μειώθηκε στην αναθεώρηση του 2021 από 11 που ήταν αρχικά). Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 10 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 25/2016 και 54/2018 (Κέντρα Κοινότητας). Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2022, η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 1. Ο στόχος του δείκτη αναμένεται να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των ανωτέρω πράξεων και τη λειτουργία των αντίστοιχων δομών. Η τελική τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 10 και προέκυψε από την επαναληπτική μέτρηση του δείκτη μέσω ερωτηματολογίου στις υποστηριζόμενες δομές (Οκτώβριος 2023)

11105: Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει τιμή βάσης 39 (2014) και τιμή στόχο 1 άτομο για το 2023. Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις υποστήριξης ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη είναι μηδενική στην παρούσα φάση, καθώς δεν έχουν ενταχθεί σχετικές πράξεις. Κρίνεται ότι η υλοποίηση του δείκτη θα παραμείνει μηδενική, καθώς δεν προβλέπεται η ένταξη δράσεων υποστήριξης/ αύξησης της απασχόλησης ατόμων σε μειονεκτική θέση, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii.

10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους (Επενδυτική προτεραιότητα 9iii)

Ο συγκεκριμένος δείκτης για την επενδυτική προτεραιότητα 9iii έχει τιμή βάσης 37 (2016) και τιμή στόχο 119 συμμετέχοντες για το 2023 (η τιμή στόχος μειώθηκε στην αναθεώρηση του 2021 από 221 που ήταν αρχικά). Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν την φροντίδα παιδιών ΑμεΑ. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 7 ενταγμένες πράξεις των προκλήσεων 02/2015, 30/2016, 43/2017, 67/2018, 84/2019, 100/2020 και 110/2021 που αφορούν παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2022, η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 154 συμμετέχοντες το 2022, όπως φαίνεται στον παρακάτω Πίνακα.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Σύνολο
10502	Αριθμός	221		0	39	14	24	16	6	16	39	154

05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Επενδυτική προτεραιότητα 9iii)

Ο συγκεκριμένος δείκτης για την επενδυτική προτεραιότητα 9iii έχει τιμή βάσης 0 (2014) και τιμή στόχο 7 δομές για το 2023. Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 7 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 20/2016, 21/2016, 33/2016 και 87/2019, που περιλαμβάνουν λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, ξενώνων φιλοξενίας, Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2022, η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 4 δομές. Η υφιστάμενη τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 4 (με βάση τη συμβολή των δομών κακοποιημένων γυναικών) και δεν θα μεταβληθεί λόγω της μη λειτουργίας του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος, που αποτελεί ένα από τα δύο κριτήρια για να λάβει θετική τιμή ο συγκεκριμένος δείκτης στις λοιπές υποστηριζόμενες δομές. Η αντιμετώπιση του κριτηρίου αυτού στην Τελική Έκθεση του Προγράμματος θα γίνει με βάση τις οδηγίες που θα δοθούν κεντρικά. Το άλλο κριτήριο σχετίζεται με την «υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα γενικότερα», το οποίο με βάση τα αποτελέσματα της επαναληπτικής μέτρησης του δείκτη μέσω ερωτηματολογίου στις υποστηριζόμενες δομές, εκπληρώνεται για το σύνολο των υπόλοιπων υποστηριζόμενων δομών (9). Οπότε η τιμή επίτευξης του δείκτη χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της λειτουργίας του Γεωπληροφοριακού θα ανερχόταν σε 13.

11509: Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ

Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει τιμή βάσης 2,3% (2016) και τιμή στόχο 3,8% για το 2023. Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 4 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 3/2015, 31/2016, 68/2018 και 108/2021 που περιλαμβάνουν την παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2022, η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 0,9% για το 2022. Ο στόχος του δείκτη αναμένεται να επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των ανωτέρω πράξεων.

11206: Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)

Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει τιμή βάσης 0% (2014) και τιμή στόχο 35,7% για το 2023. Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις ανάπτυξης δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 1 ενταγμένη πράξη της πρόσκλησης 76/2018 που περιλαμβάνει τη λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας

(TOMY) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2022, η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 17,32% για το 2022. Λαμβάνοντας υπόψη τη μείωση του ποσοστού φτώχειας στην Περιφέρεια Ηπείρου κατά τα τελευταία έτη (21,1% το 2021 και 15,8% το 2022), όπως προσδιορίζεται με βάση την «Έρευνα Εισοδήματος και Συνθηκών Διαβίωσης των Νοικοκυριών» της ΕΛΣΤΑΤ, εκτιμάται ότι ο δείκτης δεν θα επιτευχθεί.

11207: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Περιφέρει

Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει τιμή βάσης 1,39% (2014) και τιμή στόχο 2,94% για το 2023. Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις ανάπτυξης δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 6 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 63/2018, που περιλαμβάνουν δράσεις για την παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2022, η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 0% για το 2022, όμως η επίτευξη του στόχου για το 2023 κρίνεται εφικτή με την ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων.

11208: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις

Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει τιμή βάσης 0% (2014) και τιμή στόχο 31,4% για το 2023. Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις ανάπτυξης δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 5 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 62/2018, που περιλαμβάνουν δράσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων. Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2022, η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 0% για το 2022, όμως η επίτευξη του στόχου για το 2023 κρίνεται εφικτή με την ολοκλήρωση των σχετικών δράσεων.

05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες (Επενδυτική προτεραιότητα 9iv)

Ο συγκεκριμένος δείκτης για την επενδυτική προτεραιότητα 9iv έχει τιμή βάσης 0 (2014) και τιμή στόχο 25 δομές για το 2023. Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 20 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 26/2016, 27/2016, 28/2016 και 69/2018, που περιλαμβάνουν Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κοινωνικά Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία, Δομές αστέγων και το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση υλοποίησης 2022, η σωρευτική τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενική το 2022. Η υφιστάμενη τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενική και θα παραμείνει μηδενική λόγω της μη λειτουργίας του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος, που αποτελεί ένα από τα δύο κριτήρια για να λάβει θετική τιμή ο συγκεκριμένος δείκτης. Η αντιμετώπιση του κριτηρίου αυτού στην Τελική Έκθεση του Προγράμματος θα γίνει με βάση τις οδηγίες που θα δοθούν κεντρικά. Το άλλο κριτήριο σχετίζεται με την «υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα γενικότερα», το οποίο με βάση τα αποτελέσματα της επαναληπτικής μέτρησης του δείκτη μέσω ερωτηματολογίου στις υποστηριζόμενες δομές, εκπληρώνεται για το σύνολο των υποστηριζόμενων δομών. Οπότε η τιμή επίτευξης του δείκτη χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της λειτουργίας του Γεωπληροφοριακού θα ανερχόταν σε 25.

11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

Ο συγκεκριμένος δείκτης έχει τιμή βάσης 3 (2014) και τιμή στόχο 8 φορείς για το 2023 (η τιμή στόχος μειώθηκε στην αναθεώρηση του 2021 από 29 που ήταν αρχικά). Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο. Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 13 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 97/2020 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας». Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των ανωτέρω πράξεων.

CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους (Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi)

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελεί έναν κοινό δείκτη αποτελεσμάτων του ΕΚΤ, για τον οποίο στο πρόγραμμα για την επενδυτική προτεραιότητα 9vi έχει τεθεί τιμή βάσης 92 (2014) και τιμή στόχου 27 συμμετέχοντες για το 2023 (η τιμή στόχος μειώθηκε στην αναθεώρηση του 2021 από 145 που ήταν αρχικά). Ο δείκτης σχετίζεται με ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης.

Στο δείκτη συμβάλλουν 3 ενταγμένες πράξεις στο πλαίσιο των προσκλήσεων 98/2020 & 101/2020, με τιμή στόχου 17. Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη είναι μηδενική στην παρούσα φάση και εκτιμάται ότι δεν θα επιτευχθεί.

CR03 «Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την λήξη συμμετοχής τους»

Ο δείκτης CR03 προστέθηκε στην αναθεώρηση του 2021 για την μέτρηση των αποτελεσμάτων της δράσης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων» στο πλαίσιο των ΤΑΠΤοΚ. Η τιμή στόχος του δείκτη ανέρχεται σε 15 συμμετέχοντες. Ο δείκτης τροφοδοτείται από 1 ενταγμένο έργο στο πλαίσιο της πρόσκλησης 99/2020 με τιμή στόχο 15.

5.4. Εξέταση της συμβολής των Δεικτών Εκροής και Αποτελέσματος στη λογική παρέμβασης του Προγράμματος

Για την αξιολόγηση της ορθότητας, αξιοπιστίας και πληρότητας του συστήματος ποσοτικών στόχων και δεικτών του Προγράμματος, εξετάζονται στην παρούσα ενότητα, οι ποσοτικοί στόχοι – δείκτες ανά Άξονα Προτεραιότητας.

Ο έλεγχος - εξέταση του πλέγματος δεικτών έχει ως στόχο τον έλεγχο της καταλληλότητας των Δεικτών να αποτυπώσουν με σαφήνεια και συνέπεια ως προς τη λογική παρέμβασης του Προγράμματος τα αναμενόμενα αποτελέσματα που περιγράφονται στους ειδικούς στόχους του ΕΠ.

5.4.1. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 1

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας 1, με βάση την αναθεώρηση του Προγράμματος το 2021, σε σύνδεση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους Ειδικούς Στόχους και τις Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων και ένδειξη της χρηματοδοτικής τους βαρύτητας, ως ποσοστό του ΑΠ και του Ειδικού Στόχου αντίστοιχα.

Πίνακας 49. Δείκτες– Λογική Παρέμβασης Άξονα Προτεραιότητας 1

Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επ. Πρ.	Ειδικό Στόχοι	Πόροι ως % του ΑΠ	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Πόροι ως % του ΕΣ	Δείκτες εκροών
- Δημιουργία δικτύων ερευνητικών υποδομών - Αύξηση δραστηριοτήτων Ε&Α	1a	Ειδικός Στόχος 1.1.1: Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο.	0,68%	T1604: Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&ΤΑ	1.1.1.1: Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη της δικτύωσης ερευνητικών φορέων.	100,0%	SO033: Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται
Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις	1b	Ειδικός Στόχος 1.2.1: Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας.	12,28%	T1605: Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων	1.2.1.1: Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων.	100,0%	CO26: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα
Ανάπτυξη συνθηκών για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στις τοπικές επιχειρήσεις	2b	Ειδικός Στόχος 2.2.1: Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα	8,92%	T1606: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ	2.2.1.1: Ανάπτυξη ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών από τις ΜΜΕ 2.2.1.2: Ενίσχυση της ζήτησης υπηρεσιών ΤΠΕ από τις τοπικές ΜΜΕ	0,0% 100,0%	CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις
- Ανάπτυξη εργαλείων αναπτυξιακού σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών - Εξοικονόμηση πόρων και μείωση κόστους λειτουργίας παρεχόμενων από τους ΟΤΑ υπηρεσιών	2c	Ειδικός Στόχος 2.3.1: Αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ	2,73%	07904: Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες	2.3.1.1: Ανάπτυξη και χρήση ψηφιακών συστημάτων, προϊόντων και υπηρεσιών από τους Ο.Τ.Α	100,0%	SO007: Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται
- Ενίσχυση επιχειρηματικότητας σε περιφερειακό επίπεδο - Αξιοποίηση καινοτομίας ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην επιχειρηματική δραστηριότητα μιας ΜΜΕ	3a	Ειδικός Στόχος 3.1.1: Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας	7,00%	T1608: Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες	3.1.1.1: Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 3.1.1.2: Υποστηρικτικοί μηχανισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα	100,0% 0,0%	CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται CO28: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά CO08: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται
Προσανατολισμός των ΜΜΕ που ανήκουν σε δυναμικούς κλάδους της περιφερειακής οικονομίας στην εξωστρέφεια, ώστε να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους στο ανταγωνιστικό περιβάλλον δραστηριοποίησής τους.	3b	Ειδικός Στόχος 3.2.1 Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας	0,14%	T1609: Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου	3.2.1.1: Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας στις ΜΜΕ	100,0%	CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση

Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επ. Πρ.	Ειδικοί Στόχοι	Πόροι ως % του ΑΠ	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Πόροι ως % του ΕΣ	Δείκτες εκροών
Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία των ΜΜΕ της Περιφέρειας επιτυγχάνοντας έτσι καλύτερες υπηρεσίες και προϊόντα, τη μείωση του κόστους παραγωγής και διάθεσης αλλά και βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων	3c	Ειδικός Στόχος 3.3.1: Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας	68,24%	T1610: Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου	3.3.1.1: Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού	10,0%	CO01: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν στήριξη CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις CO03: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων
					3.3.1.2: Σύσταση Ταμείου Επιχειρηματικότητας II	14,6%	CO08: Παραγωγικές επενδύσεις: Αύξηση της απασχόλησης στις επιχειρήσεις που λαμβάνουν ενίσχυση CV23: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19 CV21: Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19
					3.3.1.3: Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19	75,4%	CV22: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19 CV20: Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID-19

Στον Άξονα Προτεραιότητας συμμετέχουν **επτά (7) Επενδυτικές Προτεραιότητες** με τους ακόλουθους Δείκτες:

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 1α

Ιδιαίτερα χαμηλή είναι η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας στον ΑΠ1 (0,68%), οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 1.1.1: «Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο», ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των Δεικτών:

T1604: Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&ΤΑ

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων αύξησης των δραστηριοτήτων Ε&Α, αλλά και της δημιουργίας δικτύων ερευνητικών υποδομών, στο βαθμό που αποτυπώνει τις συμμετοχές ερευνητικών φορέων σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&ΤΑ.

SO033: Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα εκφράζονται/πραγματοποιούνται μέσω του Δείκτη, επόμενα ο συγκεκριμένος δείκτης εκροής κρίνεται κατάλληλος.

Σημειώνεται ότι το έργο που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών υποδομών» το οποίο τροφοδοτεί τους ανωτέρω δείκτες έχει χαρακτηριστεί στο Σχέδιο Δράσης της ΕΥΔ ως μεταφερόμενο στην επόμενη ΠΠ 2021-2027, οπότε απαιτείται προσαρμογή της λογικής παρέμβασης.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 1b στο σύνολο των πόρων του ΑΠ1 ανέρχεται στο 12,28%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 1.2.1: «Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας», ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1605: Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων

Ο δείκτης αποτελέσματος T1605 κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις.

CO26: Αριθμός επιχειρήσεων που συνεργάζονται με ερευνητικά ινστιτούτα

Μέσω του κοινού δείκτη CO26 εκφράζονται/πραγματοποιούνται τα αναμενόμενα αποτελέσματα συνεργασίας των επιχειρήσεων με τους ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας.

Σημειώνεται ότι στην Πρόσκληση της σχετικής Δράσης 44/2017 "Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας" περιλαμβάνεται και ο κοινός Δείκτης Εκροών CO02, η τιμή στόχος του οποίου ταυτίζεται με αυτή του Δείκτη CO26. Η συμπερίληψη του εν λόγω Δείκτη, καθώς και του Δείκτη CO01 στους επιχειρησιακούς δείκτες, δεν προσθέτει κρίσιμη πληροφορία ή διαδρομή στη λογική παρέμβασης του ΑΠ1. Σε κάθε περίπτωση όμως, η τιμή επίτευξης του Δείκτη CO26 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό της συνολικής τιμής του Δείκτη CO01 του Προγράμματος (βλέπε Πίνακα 3B Αριθμός επιχειρήσεων που υποστηρίζονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα μετά την αφαίρεση των πολλαπλών μορφών στήριξης στις ίδιες επιχειρήσεις των Ετήσιων Εκθέσεων Υλοποίησης).

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 2b

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 2b στο σύνολο των πόρων του ΑΠ1 ανέρχεται στο 8,92%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 2.2.1: "Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα", ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1606: Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ

Ο δείκτης αποτελέσματος T1606 κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων ανάπτυξης νέων προϊόντων και υπηρεσιών, μέσω της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων με τις επιχειρήσεις.

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

CO02: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Οι κοινοί Δείκτες Εκροής CO01 και CO02 ποσοτικοποιούν τις εκροές των Δράσεων (επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη ΤΠΕ στις επιχειρήσεις).

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 2c

Χαμηλή είναι η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας στον ΑΠ1 (2,73%), οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 2.3.1: «Αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ», ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των Δεικτών:

07904: Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες

Ο δείκτης αποτελέσματος 07904 κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

SO007: Ψηφιακές υπηρεσίες που δημιουργούνται/ αναβαθμίζονται

Ομοίως ο δείκτης εκροής SO007 κρίνεται κατάλληλος για την ποσοτικοποίηση των εκροών των υλοποιούμενων δράσεων.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3a στο σύνολο των πόρων του ΑΠ1 ανέρχεται στο 7%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 3.1.1: “Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1608: Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες

Ο δείκτης αποτελέσματος T1608 κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

CO28: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά

CO08: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

Οι κοινοί Δείκτες Εκροής CO01 και CO28 που χρησιμοποιούνται από κοινού, καθώς και ο Δείκτης CO08 ποσοτικοποιούν τις εκροές της Δράσης ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 3b

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 3b στο σύνολο των πόρων του ΑΠ1 ανέρχεται στο 0,14%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 3.2.1: “ Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1609: Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου

Ο δείκτης αποτελέσματος T1609 κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

CO08: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

Οι κοινόι Δείκτες Εκροής CO01, CO02 και CO08 ποσοτικοποιούν τις εκροές της Δράσης «Υποστήριξη οργανωτικής καινοτομίας και εξωστρέφειας στις ΜΜΕ» και κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 3c

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 3c διαθέτει την υψηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα στον ΑΠ1 (68,24%), οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 3.3.1: “Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1610: Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου

Ο δείκτης αποτελέσματος T1610 κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

CO01: Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται

CO08: Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται

Οι κοινόι Δείκτες Εκροής CO01 και CO08 ποσοτικοποιούν τις εκροές των Δράσεων ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και της Δράσης συμμετοχής του ΠΕΠ στη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

CO02: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν επιχορηγήσεις

Ο κοινός Δείκτης Εκροής CO02 ποσοτικοποιεί τις εκροές των δράσεων ενίσχυσης των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας και κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

CO03: Παραγωγικές επενδύσεις: Αριθμός επιχειρήσεων που λαμβάνουν οικονομική στήριξη πλην επιχορηγήσεων

Ο κοινός Δείκτης Εκροής CO03 συνδέεται με τη δράση συμμετοχής του ΠΕΠ στη σύσταση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

CV20: Κόστος μη επιστρεπτέας οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19

CV21: Κόστος οικονομικής ενίσχυσης στις ΜΜΕ για κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19

CV22: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν μη επιστρεπτέα οικονομική ενίσχυση για κεφάλαιο κίνησης για την αντιμετώπιση του COVID19

CV23: Αριθμός ΜΜΕ που λαμβάνουν ενίσχυση σε κεφάλαιο κίνησης πλην επιχορηγήσεων για την αντιμετώπιση του COVID-19

Οι ανωτέρω δείκτες ποσοτικοποιούν τις εκροές της Δράσης «Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19» και προστέθηκαν στην λογική παρέμβασης του ΑΠ1 με την αναθεώρηση του 2021.

5.4.2. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 2

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας 2, με βάση την αναθεώρηση του Προγράμματος το 2021, σε σύνδεση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους Ειδικούς Στόχους και τις Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων και ένδειξη της χρηματοδοτικής τους βαρύτητας, ως ποσοστό του ΑΠ και του Ειδικού Στόχου αντίστοιχα.

Πίνακας 50. Δείκτες– Λογική Παρέμβασης Άξονα Προτεραιότητας 2

Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επ. Πρ.	Ειδικοί Στόχοι	Πόροι ως % του ΑΠ	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Πόροι ως % του ΕΣ	Δείκτες εκροών
- Εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα της Περιφέρειας (δημόσια κτίρια και κτίρια οικιακής χρήσης) - Συμβολή στον εθνικό στόχο για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τη Στρατηγική Ε2020	4c	Ειδικός Στόχος 4.3.1: Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας	28,23%	T1613: Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας	4.3.1.1: Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια κτίρια	8,62%	CO31: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης
					4.3.1.2: Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα	91,38%	CO32: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
- Βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας στα αστικά κέντρα - Εξοικονόμηση ενέργειας στα αστικά κέντρα - Βελτίωση της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα - Τόνωση της ανταγωνιστικότητας των κέντρων των πόλεων - Συμβολή στον εθνικό στόχο για μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τη Στρατηγική Ε2020.	4e	Ειδικός Στόχος 4.5.1: Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας	2,19%	T1614: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ	4.5.1.1: Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές	55,48%	CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου
					4.5.1.2: Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα	44,52%	
Αύξηση του βαθμού ετοιμότητας του περιφερειακού μηχανισμού στο να προλαμβάνει κινδύνους και να αντιμετωπίζει τις καταστροφές	5b	Ειδικός Στόχος 5.2.1: Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών	7,20%	T1616: Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της οδηγίας 2007/60/ΕΚ	5.2.1.1: Επενδύσεις σε έργα πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών	100%	CO20: Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 08704: Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή 08705: Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα 08706: Ενέργειες αναβάθμισης δομών πολιτικής προστασίας 08711: Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας
- Βελτίωση της κατάστασης των Υδάτινων Σωμάτων της Περιφέρειας - Διασφάλιση της επάρκειας και της ποιότητας του πόσιμου ύδατος.	6b	Ειδικός Στόχος 6.2.1: Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη	47,26%	T1661: Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις	6.2.1.1: Επενδύσεις στη διαχείριση υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό)	13,39%	CO18: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επ. Πρ.	Ειδικοί Στόχοι	Πόροι ως % του ΑΠ	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Πόροι ως % του ΕΣ	Δείκτες εκροών
- Μείωση απωλειών σε συστήματα υδροληψίας και διανομής πόσιμου ύδατος - Προστασία σημείων υδροληψίας - Ολοκλήρωση υποδομών συλλογής και επεξεργασίας αστικών λυμάτων		διαχείριση των υδατικών πόρων		κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ	6.2.1.2: Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων	86,61%	CO19: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων
Ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού μέσω της ανάδειξης και αξιοποίησης φυσικών και πολιτιστικών πόρων της Περιφέρειας	6c	Ειδικός στόχος 6.3.1: Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία.	9,74%	T1662: Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ	6.3.1.1: Επενδύσεις για την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος.	100%	CO09: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών SO006: Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς
- Αποτελεσματική ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τη βιοποικιλότητα και τις περιοχές NATURA 2000 - Ενίσχυση και ανάδειξη οικοσυστημάτων και προστατευόμενων περιοχών	6d	Ειδικός στόχος 6.4.1: Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας.	0,39%	T1663: Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης	6.4.1.1: Επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου.	100%	CO23: Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης
- Αντιστροφή της κοινωνικής και περιβαλλοντικής υποβάθμισης των αστικών περιοχών - Βελτίωση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητας των κέντρων των αστικών περιοχών - Αποκατάσταση του οικονομικού ιστού των αστικών κέντρων	6e	Ειδικός στόχος 6.5.1: Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών	4,99%	T1620: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 μg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης	6.5.1.2: Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης.	100%	CO38: Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

Στον Άξονα Προτεραιότητας 2 συμμετέχουν **επτά (7) Επενδυτικές Προτεραιότητες** με τους ακόλουθους Δείκτες:

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4c στο σύνολο των πόρων του ΑΠ2 ανέρχεται στο 28,23%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 4.3.1: “Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκρών:

T1613: Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας

Ο συγκεκριμένος δείκτης αποτελέσματος κρίνεται κατάλληλος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων στην εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό απόθεμα και της συμβολής της Περιφέρειας στην επίτευξη του εθνικού στόχου για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

CO31: Αριθμός νοικοκυριών που κατατάσσονται σε καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης

CO32: Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων

CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Οι ως άνω Δείκτες Εκρών κρίνονται ως εύστοχοι για την παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων και αποδίδουν τις εκροές των Δράσεων που έχουν ενεργοποιηθεί.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 4e

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4e στο σύνολο των πόρων του ΑΠ2 ανέρχεται στο 2,19%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 4.5.1: “Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκρών:

T1614: Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ

CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου

Τόσο ο Δείκτης Αποτελέσματος (T1614), όσο και ο κοινός Δείκτης Εκροής CO34 κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων στην εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στη βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 5b

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 4e στο σύνολο των πόρων του ΑΠ2 ανέρχεται στο 7,2%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 5.2.1: “Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών”.

Τόσο ο Δείκτης Αποτελέσματος (T1616), όσο και οι κοινοί Δείκτες Εκροής (CO20, 08704, 08705, 08706 και 08711) κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 6b

Η Επενδυτική Προτεραιότητα 6b διαθέτει την υψηλότερη χρηματοδοτική βαρύτητα στον ΑΠ2 (47,26%), οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 6.2.1: “Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκρών:

T1661: Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ

CO18: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης

CO19: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων

Τόσο ο Δείκτης Αποτελέσματος (T1661), όσο και οι κοινοί Δείκτες Εκρών CO18 και CO19 κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6c στο σύνολο των πόρων του ΑΠ2 ανέρχεται στο 9,74%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 6.3.1: “Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1662: Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ

CO09: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών

SO006: Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς

Τόσο ο Δείκτης Αποτελέσματος (T1662), όσο και οι Δείκτες Εκροών CO09 και SO006 κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 6d

Χαμηλή είναι η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6d στον ΑΠ2 (0,39%), οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 6.4.1: “Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας”. Η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1663: Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης

CO23: Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης

Τόσο ο Δείκτης Αποτελέσματος (T1663), όσο και ο κοινός Δείκτης Εκροών CO23 κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 6e

Χαμηλή είναι η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 6e στον ΑΠ2 (4,99%), οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 6.5.1: “Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών”. Η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1620: Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 µg/m3 που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης

CO38: Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές

Τόσο ο Δείκτης Αποτελέσματος (T1620), όσο και ο κοινός Δείκτης Εκροών CO38 κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

5.4.3. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 3

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας 3, με βάση την αναθεώρηση του Προγράμματος το 2021, σε σύνδεση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους Ειδικούς Στόχους και τις Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων και ένδειξη της χρηματοδοτικής τους βαρύτητας, ως ποσοστό του ΑΠ και του Ειδικού Στόχου αντίστοιχα.

Πίνακας 51. Δείκτες– Λογική Παρέμβασης Άξονα Προτεραιότητας 3

Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επ. Πρ.	Ειδικός Στόχος	Πόροι ως % του ΑΠ	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Πόροι ως % του ΕΣ	Δείκτες εκροών
- Μείωση χρόνου μετακίνησης - Βελτίωση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας.	7b	Ειδικός Στόχος 7.2.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος	96,79%	T1667: Χρονοαπόσταση	7.2.1.1: Έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ – Υποδομές	100%	CO13: Συνολικό μήκος νέων δρόμων CO14: Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων δρόμων
Βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων		Ειδικός Στόχος 7.2.2: Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου	3,21%	T1624: Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου (τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες/έτος)	7.2.2.1: Επενδύσεις στη βελτίωση των συνθηκών ασφάλειας στο επαρχιακό και εθνικό οδικό δίκτυο	100%	SO022: Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών

Στον ΑΠ 3 συμμετέχει μόνο μια (1) Επενδυτική Προτεραιότητα (7b), που εξειδικεύεται με δύο (2) Ειδικούς Στόχους. Τόσο οι δείκτες εκροών, όσο και οι δείκτες αποτελεσμάτων χαρακτηρίζονται από ευστοχία, καθώς προσφέρουν τα κατάλληλα στοιχεία για την παρακολούθηση της προόδου των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

5.4.4. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 4

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι Δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας 4, με βάση την αναθεώρηση του Προγράμματος το 2021, σε σύνδεση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους Ειδικούς Στόχους και τις Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων και ένδειξη της χρηματοδοτικής τους βαρύτητας, ως ποσοστό του ΑΠ και του Ειδικού Στόχου αντίστοιχα.

Πίνακας 52. Δείκτες– Λογική Παρέμβασης Άξονα Προτεραιότητας 4

Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επ. Πρ.	Ειδικοί Στόχοι	Πόροι ως % του ΑΠ	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Πόροι ως % του ΕΣ	Δείκτες εκροών
Βελτίωση των υποδομών και του εξοπλισμού στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια φροντίδα υγείας ώστε να εξασφαλίζεται η πρόσβαση κυρίως για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.	9a	Ειδικός Στόχος 9.1.1: Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες.	43,37%	T1649: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)	9.1.1.1: Υποδομές Υγείας	100%	T1626: Μονάδες υγείας που βελτιώνονται
- Κοινωνικές υποδομές για την κάλυψη αναγκών, πρόνοιας, στέγασης και σίτισης σε ομάδες πληθυσμού που πλήττονται από την φτώχεια (όπως ξενώνες φιλοξενίας, κοινωνικά παντοπωλεία, κέντρα σίτισης κλπ.) - Υποδομές για ΑμεΑ - Δημιουργία κοινωνικών υποδομών για διευκόλυνση των		Ειδικός Στόχος 9.1.2: Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων.	14,93%	T1665: Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες υπηρεσίες	9.1.2.1: Κοινωνικές υποδομές πρόνοιας, φροντίδας και στέγασης	100%	SO031: Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται T1664: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών
Αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ΡΟΜΑ σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσής τους	9b	Ειδικός Στόχος 9.2.1: Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου	0,63%	T1666: Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης	9.2.1.1: Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες	100%	T1628: Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης
- Αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, - Αναβάθμιση των υποδομών αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης - Βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση	10a	Ειδικός Στόχος 10.1.1: Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση.	41,07%	T1631: Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης	10.1.1.1: Υποδομές Προσχολικής και Σχολικής Εκπαίδευσης.	42,40%	CO35: Δυναμικότητα ενισχυόμενων υποδομών παιδικής μέριμνας ή εκπαίδευσης
					10.1.1.2: Υποδομές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.	38,55%	
					10.1.1.3: Υποδομές για αρχική επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση ενηλίκων.	19,05%	

Στον Άξονα Προτεραιότητας 4 συμμετέχουν **τρεις (3) Επενδυτικές Προτεραιότητες** με τους ακόλουθους Δείκτες:

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 9a

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9a στο σύνολο των πόρων του ΑΠ4 ανέρχεται στο 58,3%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 9.1.1: “Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες” και 9.1.2: “Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1649: Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)

T1665: Αριθμός δομών που ενισχύονται για να προσφέρουν βελτιωμένες /διευρυμένες υπηρεσίες

T1626: Μονάδες υγείας που βελτιώνονται

SO031: Δυναμικότητα κοινωνικών υποδομών που ενισχύονται

T1664: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

Οι ως άνω Δείκτες κρίνονται ως εύστοχοι για την παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων και αποδίδουν τα αποτελέσματα και τις εκροές των Δράσεων που έχουν ενεργοποιηθεί.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9b στο σύνολο των πόρων του ΑΠ4 ανέρχεται μόλις στο 0,63%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 9.2.1: “Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

T1666: Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης

T1628: Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης

Οι ως άνω Δείκτες κρίνονται ως απόλυτα εύστοχοι για την παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων και αποδίδουν τα αποτελέσματα και τις εκροές των Δράσεων που έχουν ενεργοποιηθεί.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 10a

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 10a στο σύνολο των πόρων του ΑΠ4 ανέρχεται στο 41,07%, οι παρεμβάσεις της οποίας καλούνται να υπηρετήσουν τον Ειδικό Στόχο 10.1.1: “Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση”.

Σημειώνεται ότι οι ενισχυόμενες παρεμβάσεις αφορούν σε υποδομές εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης και μόνο έμμεσα εξυπηρετούν τον στόχο της βελτίωσης της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Προτείνεται επόμενα η προσαρμογή του λεκτικού του Ειδικού Στόχου 10.1.1 σε “Ανάπτυξη (σύγχρονων) υποδομών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης”, λεκτικό που είναι συνεπές με τα επιθυμητά αποτελέσματα.

T1631: Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Ο συγκεκριμένος Δείκτης αποτελέσματος δεν κρίνεται κατάλληλος για τη μέτρηση της αλλαγής στην αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. Παράλληλα δεν υφίσταται Δείκτης αποτελέσματος που να εκφράζει ενιαία τα αναμενόμενα αποτελέσματα στην εκπαίδευση και δια βίου μάθηση. Προτείνεται η επανεξέταση και αντικατάσταση του Δείκτη με εστίαση στα αναμενόμενα αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης (π.χ. Ποσοστό δομών εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης που αναβαθμίζονται).

CO35: Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται

Ο Δείκτης κρίνεται ως εύστοχος για την παρακολούθηση των επιθυμητών αποτελεσμάτων και αποδίδει τις εκροές των Δράσεων που έχουν ενεργοποιηθεί.

5.4.5. Σύστημα Δεικτών και λογική παρέμβασης του Άξονα Προτεραιότητας 5

Στον Πίνακα που ακολουθεί αποτυπώνονται οι δείκτες εκροών και αποτελεσμάτων ανά Επενδυτική Προτεραιότητα του Άξονα Προτεραιότητας 5, με βάση την αναθεώρηση του Προγράμματος το 2021, σε σύνδεση με τα αναμενόμενα αποτελέσματα, τους Ειδικούς Στόχους και τις Ενδεικτικές Κατηγορίες Δράσεων και ένδειξη της χρηματοδοτικής τους βαρύτητας, ως ποσοστό του ΑΠ και του Ειδικού Στόχου αντίστοιχα.

Πίνακας 53. Δείκτες– Λογική Παρέμβασης Άξονα Προτεραιότητας 4

Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επ. Πρ.	Ειδικοί Στόχοι	Πόροι ως % του ΑΠ	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Πόροι ως % του ΕΣ	Δείκτες εκροών
Υποστήριξη ανέργων πτυχιούχων στην προσπάθειά τους για εύρεση εργασίας, μειώνοντας έτσι την ανεργία στη συγκεκριμένη ομάδα και περιορίζοντας το φαινόμενο της διαρροής του επιστημονικού δυναμικού της Περιφέρειας	8i	Ειδικός Στόχος 8.1.1: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα	13,75%	CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους	8.1.1.1: Προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία.	100%	CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
- Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, μέσα από την ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για: - ευπαθή άτομα (ευάλωτες και ειδικές κοινωνικές ομάδες) οι οποίοι θα συμμετέχουν στην αγορά εργασίας συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης - άτομα που έχουν τη φροντίδα παιδιών προσχολικής ηλικίας (κυρίως γυναίκες).	9i	Ειδικός Στόχος 9.1.1: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	27,99%	10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους	9.1.1.1: Δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.	100%	10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων
Δημιουργία δομών για την βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε κοινωνικές υπηρεσίες όπως Κέντρα Κοινότητας, Κέντρα Στήριξης Οικογένειας, ΟΦΗΛΙ κ.α.	9ii	Ειδικός Στόχος 9.2.1: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες.	3,65%	05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες	9.2.1.1: Υποστήριξη περιθωριοποιημένων κοινοτήτων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.	89,53%	05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών
Δημιουργία ευκαιριών για την οικονομική και κοινωνική ενσωμάτωση των Ρομά και άλλων περιθωριοποιημένων ομάδων και μείωση του κινδύνου κοινωνικού τους αποκλεισμού		Ειδικός Στόχος 9.2.2: Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους		11105: Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της	9.2.1.2: Υποστήριξη ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.	10,47%	T1634: Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι)
Βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση, μέσα από την ανάπτυξη δικτύου παροχής υπηρεσιών υποστήριξης για άτομα που έχουν τη φροντίδα φιλοξενίας βρεφών,	9iii	Ειδικός Στόχος 9.3.1: Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό	14,17%	10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε	9.3.1.1: Δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν την φροντίδα παιδιών ΑμεΑ	100%	10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη

Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επ. Πρ.	Ειδικό Στόχο	Πόροι ως % του ΑΠ	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Πόροι ως % του ΕΣ	Δείκτες εκροών
νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία προσχολικής ηλικίας (κυρίως γυναίκες).				εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση			φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων
Καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού ατόμων που υφίστανται οποιασδήποτε μορφής διάκριση και η παροχή ίσων ευκαιριών ένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο		Ειδικός Στόχος 9.3.2: Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)		05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες 11509: Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ	9.3.2.1: Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών		05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 11501: Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις
Παροχή του ελάχιστου δυνατού επιπέδου υπηρεσιών υγείας ειδικά προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού (οικονομικά ασθενείς πολίτες, ανασφάλιστοι, άνεργοι κλπ.) καθώς και η ανάπτυξη νέων τρόπων παροχής υπηρεσιών υγείας.	9iv	Ειδικός Στόχος 9.4.1: Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λουπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες	35,85%	11206: Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 11207: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια 11208: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις	9.4.1.1 Ανάπτυξη δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας.	71,99%	11202: Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) 11203: Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (ΤΟΜΥ) που λειτουργούν 11204: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας 11205: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις CV30: Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19 CV33: Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19
- Κάλυψη αναγκών ενίσχυσης των κοινωνικών υπηρεσιών με τη δημιουργία ενός δικτύου παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας μέσα από: - την ενίσχυση δομών δικτύου κοινωνικής παρέμβασης για τη φτώχεια		Ειδικός Στόχος 9.4.2: Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες		05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/ διευρυμένες υπηρεσίες	9.4.2.1: Παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες	28,01%	05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών 05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών 11201: Δημιουργία Περιφερειακού

Αναμενόμενα αποτελέσματα	Επ. Πρ.	Ειδικό Στόχο	Πόροι ως % του ΑΠ	Δείκτες αποτελέσματος	Δράσεις	Πόροι ως % του ΕΣ	Δείκτες εκροών
ο την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ευπαθών ομάδων όπως ηλικιωμένων, ΑμεΑ κλπ.							Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης
■ Δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων και καινοτομικών προϊόντων με στόχο την απασχόληση των ευπαθών ομάδων (είτε μέσω της έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας ή με την κάλυψη θέσεων απασχόλησης σε κοινωνικές επιχειρήσεις).	9v	Ειδικός Στόχος 9.5.1: Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	1,52%	11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης	9.5.1.1: Ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο.	100%	11301: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας
■ Κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση των τοπικών παραγόντων με αξιοποίηση της τοπικής δυναμικής, περιοχών με αναπτυξιακά προβλήματα, για την υποβολή ευπαθών ομάδων του πληθυσμού για έξοδο τους από τη φτώχεια	9vi	Ειδικός Στόχος 9.6.1: Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού.	3,06%	CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους CR03: Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την λήξη συμμετοχής τους	9.6.1.1: Ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης.	100%	CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Στον Άξονα Προτεραιότητας 5 συμμετέχουν **επτά (7) Επενδυτικές Προτεραιότητες** με τους ακόλουθους Δείκτες:

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 8i

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 8i στο σύνολο των πόρων του ΑΠ4 ανέρχεται στο 13,75%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 8.1.1: “Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

CO01: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Τόσο ο Δείκτης Αποτελέσματος (CR06), όσο και ο Δείκτης Εκροής (CO01) κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων, ενώ εύστοχη είναι και η μεταξύ τους σύνδεση.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9i στο σύνολο των πόρων του ΑΠ5 ανέρχεται στο 27,99%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 9.1.1: “Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους

10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων

Οι ανωτέρω δείκτες κρίνονται κατάλληλοι για την ποσοτικοποίηση των εκροών και την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ii στο σύνολο των πόρων του ΑΠ5 ανέρχεται στο 3,65%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 9.2.1: “Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες” και 9.2.2 “Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες

Κατάλληλος κρίνεται ο Δείκτης για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Ειδικού Στόχου 9.2.1.

11105: Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της

Κατάλληλος κρίνεται ο Δείκτης για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Ειδικού Στόχου 9.2.2.

05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών

Οι Δείκτες Εκροής (05502 και 05503) κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων του Ειδικού Στόχου 9.2.1.

T1634: Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ Ή αιτούντες άσυλο Ή ασυνόδευτοι ανήλικοι)

Ο Δείκτης Εκροής κρίνεται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων του Ειδικού Στόχου 9.2.2.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii στο σύνολο των πόρων του ΑΠ5 ανέρχεται στο 14,17%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 9.3.1: “Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό” και 9.3.2 “Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

10502: Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση

05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες

11509: Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ

Οι Δείκτες αποτελέσματος καλύπτουν και αποτυπώνουν πλήρως όλες τις πτυχές των αναμενομένων αποτελεσμάτων των Ειδικών Στόχων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii.

10501: Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτώμενων ατόμων

05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών

11501: Αριθμός σχολικών μονάδων που επωφελούνται από εκπαιδευτικές παρεμβάσεις

Ομοίως οι Δείκτες Εκροών κρίνονται κατάλληλοι και καλύπτουν πλήρως όλες τις πτυχές των αναμενομένων αποτελεσμάτων των Ειδικών Στόχων της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iii.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv

Η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9iv στο σύνολο των πόρων του ΑΠ5 ανέρχεται στο 35,85%, οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τους Ειδικούς Στόχους 9.4.1: “Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες” και 9.4.2 “Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

11206: Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)

11207: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια

11208: Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις

Κατάλληλοι κρίνονται οι παραπάνω Δείκτες αποτελέσματος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Ειδικού Στόχου 9.4.1.

05504: Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/ διευρυμένες υπηρεσίες

Κατάλληλος κρίνεται ο Δείκτης αποτελέσματος για την αποτύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων του Ειδικού Στόχου 9.4.2.

11202: Αριθμός ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)

11203: Αριθμός Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) που λειτουργούν

11204: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας

11205: Αριθμός ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις

CV30: Αξία των δράσεων του ΕΚΤ για την αντιμετώπιση της COVID-19

CV33: Οντότητες που έλαβαν στήριξη για την αντιμετώπιση της COVID-19

Οι ανωτέρω Δείκτες Εκροής κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων και καλύπτουν πλήρως τις αναμενόμενες εκροές των ενταγμένων πράξεων του τομέα της υγείας (Ειδικός Στόχος 9.4.1).

05502: Αριθμός υποστηριζόμενων δομών

05503: Αριθμός επωφελουμένων των υποστηριζόμενων δομών

11201: Δημιουργία Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης

Οι ανωτέρω Δείκτες Εκροής κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων του Ειδικού Στόχου 9.4.2.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ν

Μικρή είναι η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9ν στο ΑΠ5 (1,52%) οι παρεμβάσεις της οποίας υπηρετούν τον Ειδικό Στόχο 9.5.1: “Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων”, ενώ η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

11303: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης

11301: Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας

Τόσο ο Δείκτης Αποτελέσματος (11303), όσο και ο Δείκτης Εκροής (11301) κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Δείκτες Επενδυτικής Προτεραιότητας 9νi

Χαμηλή είναι η χρηματοδοτική βαρύτητα της Επενδυτικής Προτεραιότητας 9νi στον ΑΠ5 (3,06%), οι παρεμβάσεις της οποίας καλούνται να υπηρετήσουν τον Ειδικό Στόχο 9.6.1: “Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού”. Η λογική παρέμβασης εκφράζεται μέσω των ακόλουθων Δεικτών Αποτελεσμάτων και Εκροών:

CR06: Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους

CR03: Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την λήξη συμμετοχής τους

CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων

Τόσο οι Δείκτες Αποτελέσματος (CR06 & CR03), όσο και ο Δείκτης Εκροής (CO01) κρίνονται κατάλληλοι για την αποτύπωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων, ενώ εύστοχη είναι και η μεταξύ τους σύνδεση.

5.5. Συμπεράσματα από την ανάλυση της λογικής παρέμβασης του Προγράμματος

Η ανάλυση της εσωτερικής λογικής του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ 2014-2020 λαμβάνει υπόψη της, τις ανάγκες στους τομείς πολιτικής και τους Στρατηγικούς Στόχους του Προγράμματος, τους Ειδικούς Στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα των παρεμβάσεων των Επενδυτικών Προτεραιοτήτων, τις Δράσεις που αντιστοιχούνται σε συγκεκριμένες Επενδυτικές Προτεραιότητες, καθώς και τους Δείκτες Αποτελεσμάτων και Εκροών που επιλέγονται για την μέτρηση/απόδοση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Από τον έλεγχο της λογικής παρέμβασης του Προγράμματος προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα:

- Η στρατηγική του ΕΠ χαρακτηρίζεται από ικανοποιητική λογική και προγραμματική συνέχεια από το ανώτερο έως το κατώτερο επίπεδο στοχοθεσίας.
- Οι διατυπωμένες αναπτυξιακές ανάγκες αποτυπώνουν τα κρίσιμα ζητήματα που καλείται να αντιμετωπίσει η Περιφέρεια, ενώ όπου αυτό είναι αναγκαίο υποδεικνύονται κατά κανόνα οι ανάγκες που προβλέπεται να καλυφθούν από άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου,
- Οι Στρατηγικοί Στόχοι του ΕΠ απορρέουν ομαλά και εντάσσονται πλήρως στην λογική του Γενικού Αναπτυξιακού Στόχου / Οράματος της Περιφέρειας Ηπείρου και εξειδικεύονται με την σειρά τους εξ ίσου ομαλά από τους ειδικούς στόχους που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΑΠ.
- Οι Ειδικοί Στόχοι σε επίπεδο ΑΠ είναι συμβατοί με τους Στρατηγικούς Στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι σε αντιστοιχία με τις διαπιστωμένες ανάγκες και προκλήσεις των τομέων πολιτικής ευθύνης του Προγράμματος,
- Οι προβλεπόμενες Κατηγορίες Δράσεων όπως κατηγοριοποιούνται σε Επενδυτικές Προτεραιότητες είναι συμβατές με τους Ειδικούς Στόχους του ΕΠ, ενώ επιβεβαιώνεται μέσω αυτών η συμβολή του Προγράμματος στην αντιμετώπιση των αναγκών και την πραγμάτωση των επιθυμητών αποτελεσμάτων.
- Το σύστημα δεικτών του Προγράμματος, μετά και τις διαδοχικές τροποποιήσεις του, αποτυπώνει με συνεπή τρόπο το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που έχουν σχεδιασθεί και υλοποιούνται κατά την εφαρμογή του Προγράμματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

6. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020

Στην παρούσα Ενότητα παρουσιάζονται αναλυτικά οι εκτιμήσεις του Συμβούλου Αξιολόγησης για την αναθεώρηση του Προγράμματος, η οποία στηρίζεται στις εκτιμήσεις για το βαθμό ολοκλήρωσης του ΠΕΠ στο τέλος της Προγραμματικής Περιόδου 2014 -2020, με βάση τις προβλέψεις του επικαιροποιημένου Σχεδίου Δράσης της Προγράμματος (Ιούλιος 2023), καθώς και την αξιολόγηση του βαθμού επικινδυνότητας των επιμέρους έργων του, που παρουσιάστηκαν στην Ενότητα 4.2.

6.1. Αναγκαιότητα αναθεώρησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Η παρούσα πρόταση αναθεώρησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 αποτελεί την τελευταία αναθεώρηση του Προγράμματος και στοχεύει στη διασφάλιση της αποτελεσματικής και αποδοτικής ολοκλήρωσής του, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους, καθώς και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων τμηματοποίησης και «μεταφοράς» έργων, σύμφωνα με τις επιλεξιμότητες και τους διαθέσιμους πόρους της Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται **εσωτερική ανακατανομή των πόρων** του Προγράμματος και αντίστοιχες μεταβολές σε επιμέρους δείκτες του Προγράμματος, όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Με την παρούσα πρόταση αναθεώρησης οι πόροι του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 σε όρους Κοινοτικής Συνδρομής ανά Άξονα Προτεραιότητας διαμορφώνονται ως εξής:

Άξονας Προτεραιότητας	Ταμείο	Προγραμματικοί Πόροι (ΚΣ)	Πρόταση ανακατανομής πόρων 2023	Νέα ΚΣ
ΑΠ 1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ	ΕΤΠΑ	58.615.989,00	-8.800.000,00	49.815.989,00
ΑΠ 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη	ΕΤΠΑ	82.177.241,00	1.600.000,00	83.777.241,00
ΑΠ 3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών	ΕΤΠΑ	24.913.369,00	7.200.000,00	32.113.369,00
ΑΠ 4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας	ΕΤΠΑ	25.265.767,00	0,00	25.265.767,00
ΑΠ 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων	ΕΚΤ	41.833.696,00	0,00	41.833.696,00
ΑΠ 6. Τεχνική Βοήθεια (ΕΚΤ)	ΕΚΤ	229.019,00	0,00	229.019,00
ΑΠ 7. Τεχνική Βοήθεια (ΕΤΠΑ)	ΕΤΠΑ	3.368.726,00	0,00	3.368.726,00
Σύνολο ΕΠ Ήπειρος 2014-2020		236.403.807,00	0,00	236.403.807,00

Ακολουθεί περιγραφή των προτεινόμενων τροποποιήσεων του ΕΠ «Ήπειρος 2014-2020» ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα.

6.2. Παρουσίαση της πρότασης αναθεώρησης του ΕΠ «Ηπείρος 2014-2020» ανά Άξονα Προτεραιότητας, Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

6.2.1. Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ

6.2.1.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Προτείνεται μείωση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 1 κατά **11.000.000€ (-15,0%)**, η οποία διαμορφώνεται σε 62.363.967 €, που συνεπάγεται μείωση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 24,8% σε 21,1%. Η μείωση αυτή περιλαμβάνει μεταβολή της κατανομής των πόρων του ΑΠ ανά ΘΣ ως ακολούθως:

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
ΘΣ 1	9.500.000,00	7.600.000,00	-1.900.000,00	↓ -20,0%
ΘΣ 2	8.538.948,00	7.288.948,00	-1.250.000,00	↓ -14,6%
ΘΣ 3	55.231.039,00	47.381.039,00	-7.850.000,00	↓ -14,2%
	73.269.987,00	62.269.987,00	-11.000.000,00	↓ -15,0%

Η ανωτέρω μείωση επιβάλλεται κυρίως λόγω της οριζόντιας διόρθωσης ύψους 25% που επιβλήθηκε στα έργα που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας (ΔΙΑΠ) Ηπείρου, με βάση την Οριστική Έκθεση του υπ' αριθμ. 0120211003 ελέγχου της ΕΔΕΛ.

Θεματικός Στόχος 1

Προτείνεται μείωση των διαθέσιμων πόρων του **ΘΣ 1** κατά 1.900.000€ (ΚΣ 1.520.000€), με τις ακόλουθες μεταβολές ανά ΕπΠρ:

- Μηδενισμός των πόρων της ΕπΠρ 1a (500.000 € ΔΔ, 400.000€ ΚΣ), δεδομένου ότι το μοναδικό έργο που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1.1 «Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών φορέων» και αφορά στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του Κέντρου Υποστήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής Ακρίβειας (ΚΥΕΙΑ) του ΠΓΝΙ, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα μεταφερθεί στο νέο Πρόγραμμα Ηπείρου 2021-2027.
- Μείωση των πόρων της ΕπΠρ 1b κατά 1.400.000€ (ΚΣ 1.120.000€), στο πλαίσιο της οποίας ενισχύονται 45 επιχειρήσεις για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας, λόγω της οριζόντιας διόρθωσης ύψους 25% που επιβλήθηκε στα έργα που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας (ΔΙΑΠ) Ηπείρου και έχει ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση των επιλέξιμων προς συγχρηματοδότηση δαπανών.

Οι πόροι του ΘΣ 1 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
1a. Ενίσχυση των υποδομών έρευνας και καινοτομίας (Ε&Κ) και των ικανοτήτων ανάπτυξης αριστείας στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας και της προαγωγής των κέντρων ικανότητας, ιδίως των κέντρων ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος	500.000	-500.000	0
1b. Προαγωγή επιχειρηματικών επενδύσεων στην Ε&Κ, ανάπτυξης δεσμών & συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων, κέντρων έρευνας & ανάπτυξης & του τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, ιδίως μέσω της προαγωγής επενδύσεων για την ανάπτυξη προϊόντων & υπηρεσιών	9.000.000	-1.400.000	7.600.000

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
Σύνολο ΘΣ 1	9.500.000	-1.900.000	7.600.000

Θεματικός Στόχος 2

Προτείνεται **μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 2** κατά 1.250.000 € (ΚΣ 1.000.000€), με **μείωση** των διαθέσιμων πόρων της **ΕπΠρ 2b** κατά 2.000.000€ (ΚΣ 1.600.000€), λόγω της οριζόντιας διόρθωσης ύψους 25% που επιβλήθηκε στα έργα που διαχειρίζεται η ΔΙΑΠ Ηπείρου και μικρή **αύξηση** των πόρων της **ΕπΠρ 2c** κατά 750.000€ (ΚΣ 600.000€), λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων και τις εκτιμήσεις για την ολοκλήρωσή τους με βάση το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Ως εκ τούτου οι πόροι του ΘΣ 2 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
2b. Ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών ΤΠΕ και του ηλεκτρονικού εμπορίου και της ενίσχυσης της ζήτησης για ΤΠΕ	6.538.948	-2.000.000	4.538.948
2c. Ενίσχυση των εφαρμογών ΤΠΕ για ηλεκτρονική κυβέρνηση, ηλεκτρονική μάθηση, ηλεκτρονική ένταξη, ηλεκτρονικό πολιτισμό και ηλεκτρονική υγεία	2.000.000	+750.000	2.750.000
Σύνολο ΘΣ 2	8.538.948	-1.250.000	7.288.948

Θεματικός Στόχος 3

Προτείνεται **μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 3** κατά 7.850.000€ (ΚΣ 6.280.000€), με τις ακόλουθες μεταβολές ανά ΕπΠρ:

- Μείωση των διαθέσιμων πόρων της ΕπΠρ 3c κατά 10.350.000 € (ΚΣ 8.280.000€), λόγω της οριζόντιας διόρθωσης ύψους 25% που επιβλήθηκε στα έργα που διαχειρίζεται η ΔΙΑΠ Ηπείρου
- Αύξηση των πόρων της ΕπΠρ 3a κατά 2.500.000€ (ΚΣ 2.000.000€), λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων και τις εκτιμήσεις για την ολοκλήρωσή τους με βάση το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος και αφού έχει επιπρόσθετα ληφθεί υπόψη η σχετική μείωση των επιλέξιμων προς συγχρηματοδότηση δαπανών, λόγω της οριζόντιας διόρθωσης του 25%.

Οι πόροι του ΘΣ 3 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
3a. Προαγωγή της επιχειρηματικότητας, ιδίως με τη διευκόλυνση της οικονομικής αξιοποίησης νέων ιδεών και ενίσχυσης της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, μεταξύ άλλων και μέσω θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων	5.131.039	2.500.000	7.631.039
3b. Ανάπτυξη και εφαρμογή νέων επιχειρηματικών μοντέλων για ΜΜΕ, ιδίως σε σχέση με τη διεθνοποίηση	100.000	-	100.000
3c. Στήριξη της δημιουργίας και επέκτασης προηγμένων ικανοτήτων για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών	50.000.000	-10.350.000	39.650.000
Σύνολο ΘΣ 3	55.231.039	-7.850.000	47.381.039

6.2.1.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκρών

Στο σύστημα δεικτών εκρών του ΑΠ 1 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Θεματικός Στόχος 1

Επενδυτική Προτεραιότητα 1α

- **SO033** «Ερευνητικές Υποδομές που ενισχύονται»

Διαγραφή/Μηδενισμός του δείκτη, λόγω μηδενισμού των πόρων της ΕπΠρ 1α.

Θεματικός Στόχος 2

Δεν προτείνονται μεταβολές στους δείκτες του ΘΣ 2.

Θεματικός Στόχος 3

Επενδυτική Προτεραιότητα 3α

- **CO28** «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται για την εισαγωγή νέων προϊόντων στην αγορά»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 18 σε **27 επιχειρήσεις**, με βάση την αύξηση του π/υ της Δράσης 3.1.1.1 «Υποστήριξη ΜΜΕ (νέων ή υφιστάμενων) για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών» από 5.131.039€ σε 7.631.039€ (~50%).

- **CO01** «Αριθμός επιχειρήσεων που ενισχύονται»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη λόγω της αύξησης της τιμής στόχου του δείκτη CO28, από 18 σε **27 επιχειρήσεις**.

- **CO08** «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 18 σε **27 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης**, ως αποτέλεσμα της αύξησης του δείκτη CO01 (1 ισοδύναμη θέση πλήρους χρόνου απασχόλησης ανά ενισχυόμενη επιχείρηση, με βάση το μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΤΠΑ).

6.2.1.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων

Στο σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων του ΑΠ 1 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Θεματικός Στόχος 1

Επενδυτική Προτεραιότητα 1α

- **T1604** «Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τ»

Διαγραφή του δείκτη, λόγω μηδενισμού των πόρων της ΕπΠρ 1α.

6.2.1.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ 1

Η μείωση των διαθέσιμων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 1 επιφέρει την ακόλουθη **αλλαγή στο Πλαίσιο Επίδοσής** του:

- **F100** «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»: **Μείωση** της τιμής στόχου του Οικονομικού Δείκτη αντίστοιχη με την μείωση του π/υ του ΑΠ 1, από 73.269.987 € σε **62.269.987€**.

6.2.2. Άξονας Προτεραιότητας 2: Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη

6.2.2.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Προτείνεται **αύξηση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 2** κατά 2.000.000€ (+1,9%), η οποία διαμορφώνεται σε 104.721.552 €, που συνεπάγεται μικρή αύξηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 34,8% σε 35,4%. Η αύξηση αυτή περιλαμβάνει μεταβολή της κατανομής των πόρων του ΑΠ ανά ΘΣ ως ακολούθως:

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
ΘΣ 4	31.246.289,00	36.246.289,00	5.000.000,00	↑ 16,0%
ΘΣ 5	7.396.094,00	8.896.094,00	1.500.000,00	↑ 20,3%
ΘΣ 6	64.079.169,00	59.579.169,00	-4.500.000,00	↓ -7,0%
	102.721.552,00	104.721.552,00	2.000.000,00	↑ 1,9%

Θεματικός Στόχος 4

Προτείνεται **αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 4** κατά 5.000.000€ (ΚΣ 4.000.000€), με τις ακόλουθες μεταβολές ανά ΕπΠρ:

- Αύξηση των πόρων της ΕπΠρ 4e κατά 8.000.000€ (ΚΣ 6.400.000€), λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης και τις εκτιμήσεις ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο των Δράσεων 4.5.1.1 «Επενδύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των μεταφορών, ιδίως σε αστικές περιοχές» & 4.5.1.2 «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στα αστικά κέντρα» και τις εκτιμήσεις για την ολοκλήρωσή τους.
- Μείωση των διαθέσιμων πόρων της ΕπΠρ 4c κατά 3.000.000€ (ΚΣ 2.400.000€), λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την ολοκλήρωση του Γ' Κύκλου της Δράσης «Αναβάθμιση κτιρίων και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα», καθώς και την πορεία υλοποίησης και τις εκτιμήσεις ολοκλήρωσης των ενταγμένων πράξεων ενεργειακής αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Οι πόροι του ΘΣ 4 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
4c. Στήριξη της ενεργειακής απόδοσης της έξυπνης διαχείρισης της ενέργειας και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις δημόσιες υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων κτιρίων, και στον τομέα της στέγασης	29.000.000	-3.000.000	26.000.000
4e. Προαγωγή στρατηγικών χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για όλους τους τύπους περιοχών, ιδιαίτερα για τις αστικές περιοχές, συμπεριλαμβανομένης της προώθησης της αειφόρου πολυτροπικής αστικής κινητικότητας και των μέτρων προσαρμογής σχετικά με τον περιορισμό των επιπτώσεων	2.246.289	8.000.000	10.246.289
Σύνολο ΘΣ 4	31.246.289	5.000.000	36.246.289

Θεματικός Στόχος 5

Προτείνεται **αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 5** κατά 1.500.000€ (1.200.000€ ΚΣ), με αντίστοιχη αύξηση των πόρων της ΕπΠρ 5b, στο πλαίσιο της οποίας χρηματοδοτούνται δράσεις αντιμετώπισης κινδύνων και

καταστροφών, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των ενταγμένων έργων και τις εκτιμήσεις για την ολοκλήρωσή τους με βάση το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος.

Οι πόροι του ΘΣ 5 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
5b. Προαγωγή επενδύσεων για την αντιμετώπιση ειδικών κινδύνων, εξασφαλίζοντας την ανθεκτικότητα σε καταστροφές και αναπτύσσοντας συστήματα διαχείρισης καταστροφών	7.396.094	1.500.000	8.896.094
Σύνολο ΘΣ 5	7.396.094	1.500.000	8.896.094

Θεματικός Στόχος 6

Προτείνεται **μείωση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 6** κατά 4.500.000€ (ΚΣ 3.600.000€), με τις ακόλουθες μεταβολές ανά ΕπΠρ:

- Μείωση των πόρων των ΕπΠρ 6b κατά 8.400.000€ (ΚΣ 6.720.000€), λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις για την ολοκλήρωση των ενταγμένων έργων διαχείρισης υδάτινων πόρων (πόσιμο νερό) και διαχείρισης λυμάτων, καθώς και την τμηματοποίηση 5 έργων της ΕπΠρ 6b, εκ των οποίων τα 2 εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 118α του ΚΚΔ 2021-2027, αξιοποιώντας τις δυνατότητες τμηματοποίησης που παρασχέθηκαν με τον κανονισμό (ΕΕ) 2022/2039-FAST CARE.
- Αύξηση των πόρων των ΕπΠρ 6c και 6e κατά 2.900.000 € (ΚΣ 2.320.000€) και 1.000.000€ (ΚΣ 800.000€) αντίστοιχα, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των σχετικών δράσεων και τη δυνατότητα ολοκλήρωσής τους εντός της τρέχουσας ΠΠ.

Οι πόροι του ΘΣ 6 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
6b. Επενδύσεις στον τομέα των υδάτων για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του κεκτημένου της Ένωσης στον τομέα του περιβάλλοντος και για την αντιμετώπιση των αναγκών που έχουν προσδιορισθεί από τα κράτη μέλη για επενδύσεις που υπερβαίνουν τις εν λόγω απαιτήσεις	48.550.000	-8.400.000	40.150.000
6c. Διατήρηση, προστασία, προαγωγή και ανάπτυξη φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς	10.000.000	2.900.000	12.900.000
6d. Προστασία και αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και του εδάφους και προαγωγή των υπηρεσιών των οικοσυστημάτων μέσω και του δικτύου NATURA 2000 και των «πράσινων» υποδομών	400.000	0	400.000
6e. Ανάληψη δράσης για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος, την ανάπλαση των πόλεων, την αναζωογόνηση και την απολύμανση των υποβαθμισμένων περιβαλλοντικά εκτάσεων	5.129.169	1.000.000	6.129.169
Σύνολο ΘΣ 6	64.079.169	-4.500.000	59.579.169

6.2.2.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκρών

Στο σύστημα δεικτών εκρών του ΑΠ 2 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Θεματικός Στόχος 4

Επενδυτική Προτεραιότητα 4ε

- **CO34** «Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου»

Αύξηση της τιμής στόχου από 617 σε **2.992 τόνους ισοδύναμου CO₂**, λόγω της αύξησης του π/υ της ΕπΠρ 4ε.

Η νέα τιμή στόχος διαμορφώνεται με βάση το νέο π/υ της ΕπΠρ 4ε και τις επιμέρους παραδοχές που έχουν υιοθετηθεί για τον υπολογισμό του δείκτη με βάση το μεθοδολογικό έγγραφο υπολογισμού δεικτών ΕΤΠΑ.

Θεματικός Στόχος 5

Επενδυτική Προτεραιότητα 5b

- **08706** «Ενέργειες αναβάθμισης δομών πολιτικής προστασίας»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 1 σε **2**, με βάση την αύξηση του π/υ της Δράσης 5.2.1.3 «Ενίσχυση των δομών πολιτικής προστασίας και των δομών καταπολέμησης των δασικών πυρκαγιών».

Θεματικός Στόχος 6

Επενδυτική Προτεραιότητα 6b

- **CO19** «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων»

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 44.443 σε **35.145 ισοδύναμο πληθυσμού**, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 6.2.1.2 «Επενδύσεις στη διαχείριση λυμάτων» (μείωση κατά 21%).

Επενδυτική Προτεραιότητα 6c

- **CO09** «Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 6.665 σε **8.598 επισκέψεις ανά έτος**, αναλογικά με τη αύξηση του π/υ της Δράσης 6.3.1.1 «Επενδύσεις για την ανάδειξη της τοπικής οικονομίας με την αξιοποίηση του πολιτιστικού και φυσικού αποθέματος» (αύξηση κατά 29%).

Επενδυτική Προτεραιότητα 6ε

- **CO38** «Ανοιχτοί χώροι που δημιουργούνται ή αποκαθίστανται σε αστικές περιοχές»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 85.000 σε **101.150 τετραγωνικά μέτρα**, αναλογικά με τη αύξηση του π/υ της Δράσης 6.5.1.2 «Επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης» (αύξηση κατά 19%).

6.2.2.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων

Οι ανωτέρω αλλαγές **δεν επιφέρουν τροποποιήσεις στο σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων του ΑΠ 2** του Προγράμματος.

6.2.2.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ 2

Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 2 και οι αλλαγές στην στοχοθεσία επιμέρους δεικτών εκροών επιφέρουν τις ακόλουθες **αλλαγές στο Πλαίσιο Επίδοσής** του:

- ▶ **CO19** «Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων»: **Μείωση** της τιμής στόχου του δείκτη από 44.443 σε 35.145 ισοδύναμο πληθυσμού.
- ▶ **CO09** «Αειφόρος Τουρισμός: Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών»: Αύξηση της τιμής στόχου από 6.665 σε **8.598 επισκέψεις ανά έτος**.
- ▶ **F100** «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»: Αύξηση της τιμής στόχου του Οικονομικού Δείκτη αντίστοιχη με την αύξηση του π/υ του ΑΠ 2, από 102.721.552 € σε **104.721.552 €**.

6.2.3. Άξονας Προτεραιότητας 3: Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

6.2.3.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Προτείνεται **αύξηση της συγχρηματοδοτούμενης δημόσιας δαπάνης του Άξονα Προτεραιότητας 3** κατά 9.000.000€ (+28,9%), η οποία διαμορφώνεται σε 40.141.712 €, που συνεπάγεται αύξηση της χρηματοδοτικής βαρύτητας του Άξονα στο Πρόγραμμα από 10,5% σε 13,6%. Η αύξηση αυτή προκαλεί και αντίστοιχη αύξηση στους διαθέσιμους πόρους του ΘΣ 7.

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
ΘΣ 7	31.141.712,00	40.141.712,00	9.000.000,00	↓ +28,9%
	31.141.712,00	40.141.712,00	9.000.000,00	↓ +28,9%

Θεματικός Στόχος 7

Προτείνεται **αύξηση των διαθέσιμων πόρων του ΘΣ 7** κατά 9.000.000€ (ΚΣ 7.200.000€), με αντίστοιχη αύξηση των πόρων της **ΕπΠρ 7b**, λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και την δυνατότητα ολοκλήρωσής τους σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης για το «κλείσιμο» του Προγράμματος, καθώς και τις επιπτώσεις της ενεργειακής κρίσης και της επακόλουθης αύξησης των τιμών σε πρώτες ύλες και υλικά κατασκευής, ως απόρροια των επιπτώσεων του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, οι οποίες οδήγησαν σε αύξηση του κόστους των παραγόμενων έργων.

Οι πόροι του ΘΣ 7 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
7b. Ενίσχυση της περιφερειακής κινητικότητας μέσω της σύνδεσης δευτερευόντων και τριτευόντων κόμβων στην υποδομή ΔΕΔ-Μ, συμπεριλαμβανομένων των πολυτροπικών κόμβων	31.141.712	9.000.000	40.141.712
Σύνολο ΘΣ 7	31.141.712	9.000.000	40.141.712

6.2.3.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών

Στο σύστημα δεικτών του ΑΠ 3 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Θεματικός Στόχος 7

Επενδυτική Προτεραιότητα 7b

- ▶ **CO13** «Συνολικό μήκος νέων δρόμων»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 5,4 σε **7 χιλιόμετρα**, αναλογικά με την αύξηση των διαθέσιμων πόρων της ΕπΠρ 7b (αύξηση κατά ~30%).

6.2.3.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων

Οι ανωτέρω αλλαγές δεν επιφέρουν τροποποιήσεις στο σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων του ΑΠ 3 του Προγράμματος.

6.2.3.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ3

Η αύξηση των διαθέσιμων πόρων του Άξονα Προτεραιότητας 3 επιφέρει την ακόλουθη αλλαγή στο Πλαίσιο Επίδοσής του:

- **F100 «Ποσό Πιστοποιημένων Δαπανών»:** Αύξηση της τιμής στόχου του Οικονομικού Δείκτη αντίστοιχη με την αύξηση του π/υ του ΑΠ 3, από 31.141.712 € σε **40.141.712 €**.

6.2.4. Άξονας Προτεραιότητας 4: Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

Δεν προτείνονται μεταβολές στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων του ΑΠ4 και στους δείκτες του.

6.2.5. Άξονας Προτεραιότητας 5: Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

6.2.5.1. Τροποποίηση διαθέσιμων πόρων ανά Θεματικό Στόχο και Επενδυτική Προτεραιότητα

Διατηρείται η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη του Άξονα Προτεραιότητας 5 με μεταβολή στην κατανομή των πόρων του ανά ΘΣ ως ακολούθως:

	Π/Υ ΔΔ	Νέος Π/Υ ΔΔ	Απόλυτη Μεταβολή	% Μεταβολής
ΘΣ 8	7.188.195,00	4.888.195,00	-2.300.000,00	↑ -32,0%
ΘΣ 9	45.103.925,00	47.403.925,00	+2.300.000,00	↑ 5,1%
	52.292.120,00	52.292.120,00	0,00	- 0,0%

Οι ανωτέρω μεταβολές βασίζονται στην πορεία υλοποίησης των επιμέρους δράσεων και την δυνατότητα ολοκλήρωσής τους σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος.

Θεματικός Στόχος 8

Προτείνεται **μείωση** των διαθέσιμων πόρων του **ΘΣ 8** κατά 2.300.000€ (ΚΣ 1.840.000€), με αντίστοιχη **μείωση** των πόρων της **ΕπΠρ 8i**, κυρίως λόγω της οριζόντιας διόρθωσης ύψους 25% που επιβλήθηκε στα έργα που διαχειρίζεται η Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας (ΔΙΑΠ) Ηπείρου, με βάση την Οριστική Έκθεση του υπ' αριθμ. 0120211003 ελέγχου της ΕΔΕΛ, μεταξύ των οποίων και τα έργα της πρόσκλησης 79/2019 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα».

Οι πόροι του ΘΣ 8 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
8i. Πρόσβαση στην απασχόληση για αναζητούντες θέση εργασίας και οικονομικά μη ενεργά άτομα, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων και των ατόμων που έχουν αποκοπεί επί μακρόν από την αγορά εργασίας, μέσω επίσης τοπικών πρωτοβουλιών για την απασχόληση και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων	7.188.195	-2.300.000	4.888.195
8ν. Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές	0	0	0

Σύνολο ΘΣ 8	7.188.195	-2.300.000	4.888.195
--------------------	------------------	-------------------	------------------

Θεματικός Στόχος 9

Προτείνεται **αύξηση** των διαθέσιμων πόρων του **ΘΣ 9** κατά 2.300.000€ (ΚΣ 1.840.000€), με τις ακόλουθες μεταβολές ανά ΕπΠρ:

- Αύξηση των πόρων της ΕπΠρ 9i κατά 1.500.000€ (ΚΣ 1.200.000€), λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης και τις δυνατότητες ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο της Δράσης 9.1.1.1 «Δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση».
- Αύξηση των πόρων της ΕπΠρ 9iii κατά 1.600.000€ (ΚΣ 1.280.000€), λαμβάνοντας τις εκτιμήσεις ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων στο πλαίσιο των Δράσεων 9.3.1.1 «Παρεμβάσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών» και 9.3.2.1 «Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης».
- Μείωση των πόρων της ΕπΠρ 9vi κατά 800.000€ (ΚΣ 640.000€), λαμβάνοντας υπόψη την πορεία υλοποίησης και τις δυνατότητες ολοκλήρωσης των ενταγμένων έργων σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος.

Οι πόροι του ΘΣ 9 ανά Επενδυτική Προτεραιότητα διαμορφώνονται ως εξής:

Επενδυτική Προτεραιότητα	Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)	Μεταβολή 2023	Νέοι Προγραμματικοί Πόροι (ΔΔ)
9i. Ενεργός ένταξη, με σκοπό, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών και της ενεργού συμμετοχής και της βελτίωσης της απασχολησιμότητας	14.638.125	1.500.000	16.138.125
9ii. Κοινωνικοοικονομική ενσωμάτωση περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά	1.910.174	0	1.910.174
9iii. Καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων και την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών	7.410.628	1.600.000	9.010.628
9iv. Βελτίωση της πρόσβασης σε οικονομικά προσιτές, βιώσιμες και υψηλής ποιότητας υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων της υγειονομικής περίθαλψης και των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος	18.749.086	0	18.749.086
9v. Προαγωγή της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και της επαγγελματικής ένταξης σε κοινωνικές επιχειρήσεις καθώς και την προώθηση της κοινωνικής οικονομίας και της οικονομίας της αλληλεγγύης προκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην απασχόληση	795.912	0	795.912
9vi. Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων	1.600.000	-800.000	800.000
Σύνολο ΘΣ 9	45.103.925	2.300.000	47.403.925

6.2.5.2. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Εκροών

Στο σύστημα δεικτών εκροών του ΑΠ 5 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Θεματικός Στόχος 9

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

- ▶ **10501** «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 11.100 σε **12.232 συμμετέχοντες**, αναλογικά με την αύξηση των πόρων της ΕπΠρ 9i (αύξηση κατά 10,2%).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

- ▶ **T1634** «Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (ΡΟΜΑ ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι)»

Διαγραφή του δείκτη δεδομένου ότι η δράση 9.2.2.1. «Υποστήριξη ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση», που τον τροφοδοτεί, δεν θα υλοποιηθεί (δεν υπήρξε ενδιαφέρον).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

- ▶ **10501** «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 334 σε **406 συμμετέχοντες**, αναλογικά με την αύξηση των πόρων της ΕπΠρ 9iii (αύξηση κατά 21,6%).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9vi

- ▶ **CO01** «Συμμετέχοντες άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων»

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 272 σε **136 συμμετέχοντες**, αναλογικά με τη μείωση των πόρων της ΕπΠρ 9vi (μείωση κατά 50%).

- ▶ **CO05** «Απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων»

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 30 σε **15 συμμετέχοντες**, αναλογικά με τη μείωση των πόρων της ΕπΠρ 9vi (μείωση κατά 50%).

6.2.5.3. Αναμενόμενες επιπτώσεις σε επίπεδο Δεικτών Αποτελεσμάτων

Στο σύστημα δεικτών αποτελεσμάτων του ΑΠ 5 προτείνονται οι ακόλουθες αλλαγές:

Θεματικός Στόχος 9

Επενδυτική Προτεραιότητα 9i

- ▶ **10502** «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 5.273 σε **5.810 συμμετέχοντες**, λόγω της αύξησης του συνδεόμενου δείκτη εκροών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων». Η νέα τιμή στόχος του δείκτη υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των ωφελούμενων, όπως αυτός προκύπτει από τον δείκτη εκροών ο οποίος τον τροφοδοτεί (10501) και το ποσοστό επιτυχίας 47,5%, το οποίο έχει προκύψει από τα αποτελέσματα των δράσεων εναρμόνισης 2015-2020, σύμφωνα με το μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9ii

- ▶ **11105** «Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»

Διαγραφή του δείκτη δεδομένου ότι η δράση 9.2.2.1. «Υποστήριξη ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση», που τον τροφοδοτεί, δεν θα υλοποιηθεί (δεν υπήρξε ενδιαφέρον).

Επενδυτική Προτεραιότητα 9iii

- ▶ **10502** «Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν

θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους»

Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 119 σε **144 συμμετέχοντες**, λόγω της αύξησης της τιμής στόχου του συνδεδεμένου δείκτη εκροών 10501 «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων». Η νέα τιμή στόχος του δείκτη υπολογίστηκε με βάση τον αριθμό των ωφελούμενων, όπως αυτός προκύπτει από τον δείκτη εκροών ο οποίος τον τροφοδοτεί (10501) και το ποσοστό επιτυχίας 35,5%, το οποίο έχει προκύψει από τα αποτελέσματα των δράσεων εναρμόνισης 2015-2020, σύμφωνα με το μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ.

Επενδυτική Προτεραιότητα 9νι

- ▶ **CR06** «Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους»

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 27 σε **13 συμμετέχοντες**, με βάση τη μείωση της τιμής του κοινού δείκτη εκροών CO01 ο οποίος τον τροφοδοτεί και με την εκτίμηση ότι το 10% των ωφελούμενων θα κατέχουν θέση εργασίας μετά την συμμετοχή τους, σύμφωνα με το μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ.

- ▶ **CR03** «Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την λήξη συμμετοχής τους»

Μείωση της τιμής στόχου του δείκτη από 15 σε **7 συμμετέχοντες**, με βάση τη μείωση της τιμής του κοινού δείκτη εκροών CO05 ο οποίος τον τροφοδοτεί και με την εκτίμηση ότι το 50% των συμμετεχόντων θα αποκτήσουν «εξειδίκευση» που θα προέρχεται από διαδικασία πιστοποίησης τους αμέσως (εντός 4 εβδομάδων) μετά τη λήξη της συμμετοχής τους στη δράση, σύμφωνα με το μεθοδολογικό έγγραφο δεικτών ΕΚΤ.

6.2.5.4. Αναμενόμενες επιπτώσεις στο πλαίσιο επίδοσης του ΑΠ5

Οι αλλαγές στην στοχοθεσία επιμέρους δεικτών εκροών του ΑΠ 5 επιφέρουν τις ακόλουθες **αλλαγές στο Πλαίσιο Επίδοσής** του:

- ▶ **10501** «Άτομα που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων»: Αύξηση της τιμής στόχου του δείκτη από 11.434 σε **12.638 άτομα**.

6.2.6. Άξονες Προτεραιότητας Τεχνικής Βοήθειας

Δεν προτείνονται μεταβολές στην κατανομή των διαθέσιμων πόρων των ΑΠ 6 & 7 της Τεχνικής Βοήθειας και στους δείκτες τους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

7. ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

7.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ΣΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Στην παρούσα ενότητα εκτιμάται η συμβολή του ΕΠ στους ειδικούς στόχους με βάση την πορεία υλοποίησης των δεικτών αποτελέσματος, τις δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος και το ευρύτερο μακροοικονομικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό πλαίσιο, με κύριο στόχο την διερεύνηση και τον προσδιορισμό των παραγόντων που θα κάνουν εφικτή την αποτύπωση του αντίκτυπου της υλοποίησης των παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Σε ex ante επίπεδο και πέρα από τον τομέα του περιβάλλοντος όπου η εκτίμηση των επιπτώσεων του ΕΠ αποτέλεσε ειδικό αντικείμενο της ΣΜΠΕ, οι δράσεις του Προγράμματος θεωρείται ότι θα έχουν θετικό πρόσημο στο κοινωνικό και οικονομικό σύστημα της Περιφέρειας. Ποιοτικά, οι αναμενόμενες επιπτώσεις των παρεμβάσεων του ΠΕΠ ανά τομέα εκτιμάται ότι θα είναι:

- Οικονομία: Αύξηση κύκλου εργασιών / εξαγωγών / ΑΠΑ ως τελικό αποτέλεσμα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας και της αύξησης της επιχειρηματικότητας και σε περιφερειακό επίπεδο η αύξηση του ΑΕΠ και η βελτίωση της θέσης της Περιφέρειας Ηπείρου ως προς την οικονομική της σύγκληση.
- Κοινωνία: Η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης (μείωση φτώχειας, βελτίωση παροχής υπηρεσιών γενικά ή/και προς ειδικές ομάδες), η αύξηση της απασχόλησης (γενική και ειδικών ομάδων πληθυσμού), και η βελτίωση των δημογραφικών τάσεων με την συγκράτηση του πληθυσμού.
- Περιβάλλον: η βελτιστοποίηση της διαχείρισης πόρων, εκρών και περιοχών.

Η εκτίμηση των επιπτώσεων αυτών του Προγράμματος, καθώς και η διερεύνηση τυχόν αρνητικών επιπτώσεων, θα αποτελέσει το ειδικό αντικείμενο της Τελικής Αξιολόγησης Επιπτώσεων του ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020.

Βασικό ζητούμενο για τις αξιολογήσεις επιπτώσεων αποτελεί ο προσδιορισμός του ποσοτικού αποτελέσματος, όπως αυτό ορίζεται από τους Δείκτες Αποτελέσματος κάθε Ειδικού Στόχου. Επισημαίνεται ότι οι Δείκτες Αποτελέσματος εκφράζουν μία μόνο ή περιορισμένες από τις διαστάσεις ενός Ειδικού Στόχου, του οποίου τα συνολικά αναμενόμενα αποτελέσματα μπορεί να είναι πολύ περισσότερα.

Η προσέγγιση αυτή δημιουργεί ορισμένες αντικειμενικές δυσκολίες για την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Στις περισσότερες περιπτώσεις το αποτέλεσμα (όπως μετράται από τον δείκτη) διαμορφώνεται από την συνδυασμένη δράση πολλών προγραμμάτων και εξαρτάται από ένα σύνολο κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων που δεν μπορούν να απομονωθούν. Στο πλαίσιο αυτό, μια ολοκληρωμένη μεθοδολογική προσέγγιση θα πρέπει να εστιάζει πρωτίστως στην περιγραφή/κατανόηση των μηχανισμών που διαμορφώνουν τα αποτελέσματα και δευτερευόντως στη διατύπωση προσεγγίσεων για την ποσοτική εκτίμηση της συνεισφοράς του Προγράμματος στη διαμόρφωση περιφερειακών μεγεθών.

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται ανά Άξονα Προτεραιότητας και Ειδικό Στόχο του Προγράμματος, η εκτίμηση της συμβολής των υλοποιούμενων παρεμβάσεων στους αντίστοιχους δείκτες αποτελέσματος και προσδιορίζονται ποιοτικά οι λοιποί παράγοντες που επιδρούν στη διαμόρφωση των επιμέρους αποτελεσμάτων. Η ανάλυση αυτή συμπληρώνεται στο επόμενο κεφάλαιο του παρόντος Παραδοτέου, όπου προσεγγίζονται οι μέθοδοι προσδιορισμού των επιπτώσεων του Προγράμματος στους Ειδικούς Στόχους, μέσω των Αξιολογήσεων Επιπτώσεων.

7.1.1. Άξονας Προτεραιότητας 1. Ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας με ανάπτυξη της καινοτομίας και των ΤΠΕ

7.1.1.1. Ειδικός Στόχος 1.1.1. Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της 6^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ για το 2023 έχει προταθεί η διαγραφή του Ειδικού Στόχου 1.1.1., καθώς και η διαγραφή του δείκτη T1604.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1604
ΔΕΙΚΤΗΣ	Μέσος ετήσιος αριθμός συμμετοχών ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τα
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	6,8
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	10,6
Πηγή στοιχείων	Διαχειριστική Αρχή
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	18,44 (2022)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ελήφθησαν υπόψη τα στοιχεία των: α) Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης που αφορούν την συμμετοχή σε εγκεκριμένα έργα του Ορίζοντα 2020 του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για τα έτη 2014-2022, β) ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για τα έτη 2014-2022 που αφορούν το «Ερευνώ Καινοτομώ» και γ) ΕΥΔ Ηπείρου που αφορούν τη δράση «Ενίσχυση των συστάδων και συνεργασιών μεταξύ του ερευνητικού τομέα και των επιχειρήσεων». Παρατηρώντας την πορεία εξέλιξης των τιμών υλοποίησης του δείκτη τα τελευταία έτη, εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί ο στόχος για το 2023.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προκύπτει από την δράση «1.1.1.1 Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών φορέων» και εκτιμάται ότι θα είναι μηδενική δεδομένου ότι το μοναδικό έργο που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω Δράσης και αφορά στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του Κέντρου Υποστήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής Ακρίβειας (ΚΥΕΙΑ) του ΠΓΝΙ, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα μεταφερθεί στο νέο Πρόγραμμα Ηπείρου 2021-2027. Μπορεί, όμως, να θεωρηθεί ότι στον δείκτη συνεισφέρουν τα ερευνητικά προγράμματα που υλοποιούνται στο πλαίσιο άλλου ειδικού στόχου (Ε.Σ.1.2.1) και συγκεκριμένα στο πλαίσιο της πρόσκλησης 44/2017 «Ενίσχυση Επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας». Στη συγκεκριμένη πρόσκληση έχουν ενταχθεί 45 πράξεις στο πλαίσιο των οποίων ενισχύονται επιχειρήσεις για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Ορίζοντας 2020, Προγράμματα της ΓΓΕΤ που χρηματοδοτούνται από το ΕΠΑΝΕΚ («Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ»), Χρηματοδότηση ΕΛΚΕ-ΠΔΕ
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η εκτίμηση της συμβολής στο δείκτη αποτελέσματος μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω πρωτογενούς απογραφικής έρευνας στους ερευνητικούς φορείς της Περιφέρειας. Οι ερευνητικοί φορείς θα πρέπει να δηλώσουν τον αριθμό συμμετοχών τους σε εθνικά και διεθνή προγράμματα συνεργασίας Ε&Τα, καθώς και ποιες από αυτές τις συμμετοχές υποστηρίχθηκαν άμεσα ή έμμεσα από παρεμβάσεις του ΠΕΠ. Περαιτέρω διερεύνηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ ως προς τον δείκτη αφορά στην διερεύνηση των ακόλουθων θεμάτων/ερωτημάτων: - Αν η χρηματοδότηση από το ΠΕΠ ήταν κρίσιμη ή αν σε περίπτωση που απουσίαζε, η ερευνητική συνεργασία θα καλυπτόταν από εναλλακτικές πηγές. - Τα αποτελέσματα από τη συμμετοχή του ερευνητικού φορέα στο πρόγραμμα συνεργασίας.

7.1.1.2. Ειδικός Στόχος 1.2.1. Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1605
ΔΕΙΚΤΗΣ	Δαπάνη Ε&Α των επιχειρήσεων
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ευρώ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	3.430.000
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	4.116.000
Πηγή στοιχείων	Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας – Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ανά 2 έτη
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	9.400.000 (2021)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία αφορούν το 2021 και προκύπτουν από το Δελτίο Δ10 - Δαπάνες Ε&Α ανά περιφέρεια (NUTS2) του ΕΚΤ.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 45 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 44/2017, οι οποίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Ορίζοντας 2020, ΕΠΑΝΕΚ, Επενδυτικός Νόμος, Ίδιοι πόροι των επιχειρήσεων
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Όπως προαναφέρεται, τα στοιχεία για το δείκτη αποτελέσματος T1605 παρακολουθούνται από το ΕΚΤ. Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη μπορούν να αξιοποιηθούν τα στοιχεία χρηματοδότησης των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις πράξεις του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου. Οι πόροι του ΠΕΠ για τις ανωτέρω πράξεις (μαζί με την ίδια συμμετοχή των συμμετεχόντων επιχειρήσεων) θα μετατραπούν σε δαπάνες Ε&Α. Η αποτύπωση της συμβολής του ΠΕΠ θα είναι εφικτή μετά την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων και τη δημοσιοποίηση των σχετικών στατιστικών στοιχείων από το ΕΚΤ.

7.1.1.3. Ειδικός Στόχος 2.2.1. Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1606
ΔΕΙΚΤΗΣ	Ακαθάριστη προστιθέμενη αξία ΤΠΕ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	εκ. €
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	79,0
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2011
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	86,9
Πηγή στοιχείων	Ελληνική Στατιστική Αρχή
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	47,0 (2020)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Η πιο πρόσφατη τιμή αφορά το 2020 (47 εκ. €) και προκύπτει από το ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ της ΕΛΣΤΑΤ "ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ: Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία για το έτος 2020 και αναθεωρημένα στοιχεία για το έτος 2019". Τα στοιχεία έγιναν διαθέσιμα 31/01/2023.

Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 102 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business)» οι οποίες έχουν ολοκληρωθεί, καθώς και από 572 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης «Ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-business) II», οι οποίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠΑΝΕΚ
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Τα στοιχεία για την ΑΠΑ του κλάδου ΤΠΕ παρακολουθούνται από την ΕΛΣΤΑΤ. Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη, μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του συγκεκριμένου Ειδικού Στόχου θα πρέπει να αναζητηθεί η μεταβολή που θα προκληθεί στα σχετικά στατιστικά στοιχεία για την Περιφέρεια, λαμβάνοντας υπόψη και το ευρύτερο μακροοικονομικό πλαίσιο και δεδομένα για την γενικότερη οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Η συνεισφορά των πράξεων του ΠΕΠ μπορεί να εκτιμηθεί ως άθροισμα της ΑΠΑ των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν ανά έτος. Επίσης, για να προσδιοριστεί η καθαρή συνεισφορά των πράξεων αυτών θα πρέπει να συγκριθεί η ετήσια διακύμανση της ΑΠΑ των επιχειρήσεων που ενισχυθήκαν με τα αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου της Περιφέρειας.

7.1.1.4. Ειδικός Στόχος 2.3.1. Αποτελεσματική διαχείριση, υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	07904
ΔΕΙΚΤΗΣ	Πολίτες που χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσοστό (%)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	39%
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	45%
Πηγή στοιχείων	Eurostat
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	44% (2021)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Τα στοιχεία του δείκτη λήφθηκαν από την Eurostat, δελτίο "Individuals who used the internet for interaction with public authorities", αφορά το έτος 2021 (NUTS EL6 Kentriki Ellada) και εκδόθηκε το 2022 (last update: 7/03/2023).
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 19 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 56/2018, 57/2018 και 64/2018, μέσω των οποίων αναπτύσσονται ή αναβαθμίζονται 45 ψηφιακά συστήματα, προϊόντα ή υπηρεσίες από διάφορους Φορείς της Περιφέρειας. Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος, 2 από τις ανωτέρω πράξεις θα απενταχθούν και οι υπόλοιπες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠΑΝΕΚ, Ε.Π. Μεταρρύθμιση Δημοσίου Τομέα
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Τα δεδομένα για τον υπολογισμό του δείκτη στηρίζονται στην ετήσια έρευνα που διεξάγει η Eurostat, μέσω των εθνικών στατιστικών οργανισμών για τη χρήση των ΤΠΕ στα νοικοκυριά και σε ατομικό επίπεδο. Καθώς δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για την Περιφέρεια Ηπείρου, για τον υπολογισμό του δείκτη χρησιμοποιούνται τα δεδομένα που αντιστοιχούν στο NUTS Kentriki Ellada. Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη θα ήταν χρήσιμη η καταγραφή ετήσιων στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας των ιστοσελίδων ή/και χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών των φορέων/οργανισμών που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου. Η καταγραφή θα πρέπει να γίνει τόσο πριν όσο και μετά την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων, ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση μεταξύ τους και η αποτύπωση της μεταβολής.

7.1.1.5. Ειδικός Στόχος 3.1.1. Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1608
ΔΕΙΚΤΗΣ	Ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσοστό (%)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	27,8%
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	29,2%
Πηγή στοιχείων	ΓΓΕΤ, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ανά 2 έτη
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	53,6% (2016 - 2018) 71,9% (2018 – 2020) με βάση τις νέες κατευθύνσεις του εγχειριδίου Oslo 2018.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία δόθηκαν από το ΕΚΤ και αφορούν το ποσοστό επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες στο σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας τις διετίες 2014-2016 (35,98%) και 2016-2018 (53,60%) και παρουσιάζονται στους Πίνακες Δεδομένων "ΜμΕ που εισάγουν καινοτομίες προϊόντος ή/και διαδικασίας, ως ποσοστό (%) των ΜμΕ". Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο συγκεκριμένος δείκτης δεν υπολογίζεται πλέον. Το ΕΚΤ υπολόγισε μόνο για την περίοδο 2016-2018 τους δείκτες προκειμένου να μην διακοπεί η χρονοσειρά. Σύμφωνα με τη 4η έκδοση του εγχειριδίου Oslo (Oslo Manual 2018, Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition), η οποία ακολουθείται από τη Eurostat, και ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, για τη μέτρηση της καινοτομίας (Community Innovation Survey), διακρίνονται πλέον δύο τύποι καινοτομίας. Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγχειριδίου Oslo διέκριναν τέσσερις τύπους καινοτομίας. Ειδικότερα, με τη νέα έκδοση του εγχειριδίου Oslo επήλθαν σημαντικές μεταβολές στους ορισμούς των τύπων καινοτομίας. Διακρίνονται πλέον δύο τύποι καινοτομίας: καινοτομίες που αλλάζουν τα προϊόντα της επιχείρησης (καινοτομίες προϊόντων) και καινοτομίες που αλλάζουν τις επιχειρησιακές διαδικασίες της επιχείρησης (καινοτομίες επιχειρησιακών διαδικασιών). Στα προϊόντα περιλαμβάνονται τα αγαθά και οι υπηρεσίες της επιχείρησης, ή συνδυασμός αυτών. Στις επιχειρησιακές διαδικασίες περιλαμβάνονται όλες οι βασικές δραστηριότητες της επιχείρησης που αφορούν στην παραγωγή προϊόντων και όλες οι άλλες υποστηρικτικές δραστηριότητες. Οι προηγούμενες εκδόσεις του εγχειριδίου Oslo διέκριναν τέσσερις τύπους καινοτομίας: την καινοτομία προϊόντος, που παραμένει, και την καινοτομία διαδικασίας, την οργανωσιακή καινοτομία και την καινοτομία μάρκετινγκ, που αποτελούν πλέον τον νέο τύπο της καινοτομίας επιχειρησιακών διαδικασιών. Κατά συνέπεια, από την τριετία 2016-2018 και εφεξής οι τύποι καινοτομίας δεν είναι διαχρονικά συγκρίσιμοι με τις προηγούμενες τριετίες αναφοράς. Καθώς η καινοτομία διαδικασίας δεν καταμετρείται ξεχωριστά δεν είναι δυνατός ο ακριβής υπολογισμός του δείκτη για τις τριετίες από το 2018 και μετά.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 79 ενταγμένες πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών».
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠΑΝΕΚ, Επενδυτικός Νόμος, Λοιπά προγράμματα ενίσχυσης ΜΜΕ, Ίδιοι πόροι ή δάνεια των επιχειρήσεων.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη, θα πρέπει να αναζητηθούν σχετικά στοιχεία από το ΕΚΤ, μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου. Στο σύνολο των επιχειρήσεων που ανέπτυξαν καινοτόμα προϊόντα και διαδικασίες, σύμφωνα με το ΕΚΤ, πρέπει να εντοπιστούν οι επιχειρήσεις που ενισχύθηκαν από το ΠΕΠ και να υπολογιστεί το ποσοστό τους ως προς το σύνολο των επιχειρήσεων της Περιφέρειας.

	Για την μέτρηση του δείκτη και την αντίστοιχη εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ ισχύουν τα όσα αναφέρθηκαν ανωτέρω σχετικά με την τροποποίηση των τύπων καινοτομίας με τις νέες κατευθύνσεις του εγχειριδίου Oslo 2018.
--	---

7.1.1.6. Ειδικός Στόχος 3.2.1. Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1609
ΔΕΙΚΤΗΣ	Εξαγωγές Περιφέρειας Ηπείρου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ευρώ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	209.432.000
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	340.000.000
Πηγή στοιχείων	ΣΕΒΕ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	413.100.000 (2021)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Τα πιο πρόσφατα στοιχεία αφορούν το 2021 και προκύπτουν από την Έκθεση του ΣΕΒΕ "Χαρτογράφηση της εξαγωγικής δραστηριότητας της Ελλάδας ανά Περιφέρεια" Περίοδος 2019-2021, η οποία δημοσιεύτηκε το 2023 και επικαιροποιεί τα στοιχεία των ετών 2017-2019 της προηγούμενης Έκθεσης.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 2 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 77/2019 «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια».
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠΑΝΕΚ, Επενδυτικός Νόμος, Λοιπά προγράμματα ενίσχυσης ΜΜΕ, Ίδιοι πόροι ή δάνεια των επιχειρήσεων.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη, μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί έρευνα πεδίου (ερωτηματολόγια, συνεντεύξεις) στις επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν, ώστε να προσδιοριστεί η αξία των εξαγωγών τους. Θα πρέπει βέβαια να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που πιθανώς να οδήγησαν στη μεταβολή της αξίας των εξαγωγών, πέραν της στήριξης από το ΠΕΠ, όπως λοιπές ενισχύσεις που μπορεί να έχουν λάβει οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις, το γενικό οικονομικό κλίμα στην Περιφέρεια, λοιπές δράσεις που μπορεί να βελτίωσαν την εταιρική στρατηγική (π.χ. μάρκετινγκ, διείσδυση σε αγορές, κλπ.).

7.1.1.7. Ειδικός Στόχος 3.3.1. Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της Περιφέρειας

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1610
ΔΕΙΚΤΗΣ	Επενδύσεις παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Ηπείρου
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ευρώ
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	740.500.000
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2010
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	750.000.000
Πηγή στοιχείων	ΕΛΣΤΑΤ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια

Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	293.000.000 (2020)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Η πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή αφορά το 2020 και προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που έγιναν διαθέσιμα το 2023 στο δελτίο "01. Ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου κατά γεωγραφική ζώνη, περιφέρεια και κλάδο (Προσωρινά Στοιχεία) (2000 - 2020)".
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από την πράξη «Συμμετοχή Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Ηπείρου στο Ταμείο Επιχειρηματικότητας II», η οποία έχει ως στόχο την ενίσχυση 150 επιχειρήσεων της Περιφέρειας και τιμή υλοποίησης 147 επιχειρήσεις. Επίσης, στον δείκτη συμβάλουν και 44 πράξεις της πρόσκλησης 74/2018 «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού και εξοικονόμησης ενέργειας».
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠΑΝΕΚ, Επενδυτικός Νόμος, Λοιπά προγράμματα ενίσχυσης ΜΜΕ, Ίδιοι πόροι ή δάνεια των επιχειρήσεων.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη, μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, θα πρέπει να υπολογιστεί το άθροισμα των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου των επιχειρήσεων που ενισχύθηκαν από το ΠΕΠ. Το ποσό αυτό θα αποτελεί μέρος του συνόλου των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου επιχειρήσεων της Περιφέρειας, που προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. Η καταγραφή των επενδύσεων παγίου κεφαλαίου των ανωτέρω επιχειρήσεων θα πρέπει να γίνει και πριν την ενίσχυση, ώστε να προσδιοριστεί η μεταβολή της τιμής και να εκτιμηθεί η καθαρή συμβολή του ΠΕΠ. Και σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι παράγοντες που πιθανώς να οδήγησαν στη μεταβολή αυτή (π.χ. γενικό οικονομικό κλίμα). Επίσης, θα ήταν χρήσιμη μία έρευνα στις ωφελούμενες επιχειρήσεις, ώστε να τεκμηριωθεί η χρησιμότητα της χρηματοδότησης από το ΠΕΠ και να απαντηθούν ερωτήματα, όπως το αν οι επιχειρήσεις θα προχωρούσαν στις συγκεκριμένες επενδύσεις ανεξάρτητα από τη στήριξη που έλαβαν από το ΠΕΠ.

7.1.2. Άξονας Προτεραιότητας 2. Προστασία του περιβάλλοντος και αειφόρος ανάπτυξη

7.1.2.1. Ειδικός Στόχος 4.3.1. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1613
ΔΕΙΚΤΗΣ	Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ktoe
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	57,99
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2013
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	902,1
Πηγή στοιχείων	ΥΠΕΝ ΕΣΔΕΑ (Μέτρα πολιτικής του άρθρου 7 της οδηγίας 2012/27/ΕΕ)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	3 έτη
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	894,75 (2021)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Τα πιο πρόσφατα δεδομένα αφορούν το έτος 2021 και δόθηκαν από το ΥΠΕΝ το 2023. Έκθεση Προόδου για τα έτη αναφοράς 2020 και 2021 [ΕΣΔΕΑ (μέτρα πολιτικής του άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ)]. Οι τιμές που δίνονται είναι σωρευτικές από το έτος βάσης.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη προέρχεται από 2 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 53/2018 και 85/2019, μέσω των οποίων αναβαθμίζονται κτίρια και βελτιώνεται η ενεργειακή απόδοση στον οικιακό κτιριακό τομέα. Επίσης, στον δείκτη συμβάλλουν 4 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 72/2018, που περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια

	κτίρια. Μια από τις ανωτέρω 4 πράξεις θα μεταφερθεί στην ΠΠ 2021-2027, ενώ οι υπόλοιπες 3 πράξεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΕΚ
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Ο δείκτης προκύπτει από την έκθεση του άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ. Η σχετική έκθεση υποβλήθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 2013 και στην συνέχεια υποβάλλεται ως τμήμα του ΕΣΔΕΑ (Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση), το οποίο υποβάλλεται κάθε τρία χρόνια σύμφωνα με την ίδια Οδηγία. Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη αποτελέσματος αφορούν το εθνικό επίπεδο καθώς η επενδυτική προτεραιότητα 4c του ΠΕΠ συμβάλλει στο εθνικό στόχο και την εθνική πολιτική. Η συμβολή του ΠΕΠ στον δείκτη μπορεί να υπολογιστεί βάσει των ενεργειακών πιστοποιητικών των έργων (κατανάλωση τελικής ενέργειας πριν και μετά την ολοκλήρωση των παρεμβάσεων). Το συνολικό αποτέλεσμα που θα προκύψει από την άθροιση όλων των έργων που χρηματοδοτούνται από το ΠΕΠ θα συγκριθεί με τα στοιχεία των Εκθέσεων της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ, προκειμένου να εκτιμηθεί η συμβολή του στον συνολικό εθνικό στόχο.

7.1.2.2. Ειδικός Στόχος 4.5.1. Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1614
ΔΕΙΚΤΗΣ	Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Τόνοι Ισοδύναμου CO ₂
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	48.726.297
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2012
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	58.858.799
Πηγή στοιχείων	ΥΠΕΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	43.941.100 (2021)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Η τιμή του δείκτη δόθηκε από το ΥΠΕΝ το 2023 και σύμφωνα με τα στοιχεία των απογραφών των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου, η τιμή του δείκτη για το 2021 είναι: 43.941.100.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στο δείκτη προέρχεται από 29 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 14/2016, 15/2016, 35/2016, 81/2019 και 102/2020 που περιλαμβάνουν σχέδια βιώσιμης αστικής κινητικότητας, σχέδια δράσης για τη βιώσιμη ενέργεια και ανάπτυξη συστήματος μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Από τις ανωτέρω πράξεις, 8 έχουν ολοκληρωθεί, 6 θα μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027 και οι υπόλοιπες 15 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν έως 31.12.23.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, ΠΔΕ, ίδιοι πόροι ΟΤΑ.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η τιμή βάσης και η τιμή στόχος του συγκεκριμένου δείκτη αποτελέσματος αφορούν το εθνικό επίπεδο, καθώς η επενδυτική προτεραιότητα 4e του ΠΕΠ συμβάλλει στο εθνικό στόχο και την εθνική πολιτική. Οι συγκεκριμένες τιμές έχουν προσδιοριστεί από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (Γενική Γραμματεία Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ) βάσει της μεθοδολογίας με την οποία συντάσσεται η ετήσια έκθεση της χώρας για την κλιματική αλλαγή προς τα Ηνωμένα Έθνη. Δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε περίοδο αναπτυξιακής ύφεσης, είναι αναμενόμενο από το 2012 έως το 2023 (διάστημα στο οποίο αναμένεται ανάκαμψη) οι εκπομπές CO ₂ να αυξηθούν. Η αύξηση αυτή θα είναι περιορισμένη λόγω των προβλεπόμενων μέτρων. Εξάλλου, οι συγκεκριμένες τιμές σε επίπεδο χώρας συνδέονται και με τους στόχους της χώρας σε σχέση με τη Στρατηγική Ε2020. Ο στόχος της

	χώρας για το 2020 για το δείκτη «εκπομπές CO₂ για τομείς εκτός ΣΕΔΕ» είναι «-4% σε σχέση με τις τιμές του 2005». Επειδή από το 2005 έως το 2012 η μείωση ήταν ήδη της τάξης του 29%, υπάρχουν περιθώρια αύξησης έως το στόχο που έχει τεθεί σε σχέση με την Ε2020. Συμπερασματικά, η αύξηση του στόχου σε σχέση με την πιο πρόσφατα διαθέσιμη τιμή βάσης (2012) συνδέεται με τους ρυθμούς ανάπτυξης της χώρας και με τις υποχρεώσεις της ως προς την Στρατηγική Ε2020 (-4% επί των τιμών του 2005). Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη θα πρέπει να προσδιοριστεί η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που υλοποιούνται από το ΠΕΠ στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου. Χρήσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό αυτό θα μπορούσαν να προκύψουν από τις σχετικές μελέτες, στις οποίες βασίζονται τα συγκεκριμένα έργα.
--	---

7.1.2.3. Ειδικός Στόχος 5.2.1. Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1616
ΔΕΙΚΤΗΣ	Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Km ²
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	939
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	850
Πηγή στοιχείων	ΥΠΕΝ/Ειδική Γραμματεία Υδάτων
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ανά 2 έτη
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Δεν υπάρχει μεταβολή στην τιμή του δείκτη, καθώς δεν υπάρχουν ακόμη δεδομένα για την υλοποίηση παρεμβάσεων και τα αποτελέσματα αυτών. Η τιμή στόχος του δείκτη θα πρέπει να αναθεωρηθεί, καθώς το μοναδιαίο κόστος που χρησιμοποιήθηκε στον καθορισμό της τιμής αυτής ίσως να μην ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα που προκύπτουν από τα ενταγμένα έργα που υλοποιούνται στην παρούσα φάση.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 10 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 55/2018, 59/2018 και 86/2019, αν και έχει καταχωρηθεί και σε πράξεις των προσκλήσεων 34/2016 και 65/2018, οι οποίες θεωρείται ότι δεν σχετίζονται άμεσα και θα πρέπει να αφαιρεθεί ο δείκτης από τις αντίστοιχες πράξεις. Επίσης, σημειώνεται ότι ο δείκτης δεν έχει εισαχθεί σε όλες ενταγμένες πράξεις των ανωτέρω προσκλήσεων, οι οποίες συνεισφέρουν στην υλοποίηση του δείκτη. Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω σχετικές πράξεις περιλαμβάνουν αντιπλημμυρικά έργα με στόχο την προστασία περιοχών συνολικής έκτασης 19 km² και 3 από τις πράξεις αυτές με στόχο την προστασία περιοχών συνολικής έκτασης 5,6 km² θα μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, Υποδομές εγγείων βελτιώσεων του ΠΑΑ.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Για τον υπολογισμό της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη, μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, θα πρέπει να υπολογιστεί η συνολική έκταση των περιοχών που προστατεύονται από αντιπλημμυρικά έργα και μέτρα αντιπλημμυρικής προστασίας. Για τις συγκεκριμένες περιοχές θα πρέπει, επίσης, να εκτιμηθεί (σε συνεργασία με την ΕΓΥ) αν μετά την υλοποίηση των ανωτέρω παρεμβάσεων ανήκουν ή όχι στις περιοχές υψηλού κινδύνου πλημμύρας.

7.1.2.4. Ειδικός Στόχος 6.2.1. Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1661
ΔΕΙΚΤΗΣ	Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσοστό (%)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	80%
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	75%
Πηγή στοιχείων	Δ/νση Υδάτων Περιφέρειας Ηπείρου
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ανά 6 έτη
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	75% (2017)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης προστέθηκε στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ. Η τιμή του δείκτη το 2017 προκύπτει από την "1η Αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου", σύμφωνα με την με αριθμ. Ε.Γ. οικ. 907/21-12-17 (ΦΕΚ 4664/Β/29-12-2017) απόφαση έγκρισης από την Εθνική Επιτροπή Υδάτων. Είναι σε εξέλιξη η 2η Αναθεώρηση του ΣΔΛΑΠ και αναμένεται να ολοκληρωθεί, συμπεριλαμβανομένης της δημόσιας διαβούλευσης, τον Δεκέμβριο του 2023.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 21 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 5/2015, 6/2015, 16/2016, 19/2016, 70/2018 και 90/2019, που περιλαμβάνουν επενδύσεις στη διαχείριση υδατινών πόρων και λυμάτων, υλοποίηση Διαχειριστικού Σχεδίου Λεκανών Απορροής Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου και δράσεις για την εφαρμογή της Οδηγίας για τα ύδατα κολύμβησης, υλοποίηση Σχεδίων Ασφάλειας Νερού και οριοθέτηση ζωνών προστασίας σημείων υδροληψίας υπόγειου νερού.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Ο στόχος του δείκτη για το 2023 τέθηκε με σκοπό να αναχαιτιστεί η πτωτική τάση της ποιότητας των υδατινών συστημάτων της Περιφέρειας με την υλοποίηση των σχετικών πράξεων του ΠΕΠ. Για τον υπολογισμό της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη, μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου και αναφέρονται παραπάνω, θα πρέπει να αντληθούν στοιχεία για την κατάσταση των υδάτων της Περιφέρειας. Η ολοκλήρωση της 2ης Αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου, η οποία θα παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες, αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2023.

7.1.2.5. Ειδικός Στόχος 6.3.1. Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1662
ΔΕΙΚΤΗΣ	Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	994.770
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	1.297.949

Πηγή στοιχείων	ΕΛΣΤΑΤ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	1.521.405 (2022)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Τα στοιχεία προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου: Αφίξεις και διανυκτερεύσεις στα καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ (οριστικά στοιχεία) της ΕΛΣΤΑΤ. Η πιο πρόσφατη τιμή του δείκτη αφορά το 2022, με βάση τα στοιχεία που δημοσιεύτηκαν στις 18.07.2023.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 8 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 13/2015, 40/2017, 91/2019 και 92/2020 που περιλαμβάνουν δράσεις για την αξιοποίηση του πολιτιστικού αποθέματος της Περιφέρειας και δράσεις δικτύωσης και προβολής του τουρισμού. Οι πράξεις αυτές δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, ΕΠΑΝΕΚ, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg).
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη, θα πρέπει αρχικά να αναλυθεί και να ερμηνευθεί ο τρόπος που συνεισφέρουν οι δράσεις του ΠΕΠ (ποιοτικά) στην ποιότητα του τουριστικού προϊόντος. Απαιτείται μια σύνθετη προσέγγιση που θα αναλύσει ποιοτικά στοιχεία της τουριστικής ανάπτυξης της Περιφέρειας που σχετίζονται με τον πολιτισμό, όπως οι αλλαγές στην εποχικότητα, η συσχέτιση της εποχικής ζήτησης με πολιτιστικά γεγονότα, η σύγκριση και συσχέτιση των μεταβολών της επισκεψιμότητας των τουριστικών πόρων με την μεταβολή του αριθμού διανυκτερεύσεων στα ξενοδοχεία ανά προορισμό κ.α. Τα παραπάνω στοιχεία θα πρέπει να συμπληρωθούν μέσα από έρευνες ερωτηματολογίου σε επισκέπτες, όπου θα εστιάσουν στο να αναλύσουν τα κίνητρα επίσκεψης και να καταγράψουν τις τουριστικές συνήθειες τους. Μεταξύ άλλων θα πρέπει να αναζητηθούν στοιχεία όπως: ■ Ποιους από τους χώρους (μνημεία, μουσεία κλπ) που ενισχύθηκαν από πράξεις του ΠΕΠ επισκέφτηκαν (στην ευρύτερη περιοχή διαμονής τους). ■ Πώς αξιολογούν την ποιότητα της εμπειρίας τους στους χώρους αυτούς και τις παρεχόμενες υπηρεσίες. ■ Αν είχαν γνώσεις για τα πολιτιστικά στοιχεία ή συνέλεξαν πληροφορίες για αυτά πριν την επίσκεψη τους στους προορισμούς της Περιφέρειας και αν και σε ποιο βαθμό οι πληροφορίες αυτές καθόρισαν την επιλογή τους. ■ Αν η επίσκεψη σε έναν χώρο τους ενημέρωσε και τους οδήγησε στο να επισκεφτούν άλλους χώρους. Επίσης θα πρέπει να διερευνηθεί η συμβολή του ΠΕΠ στην προστασία και αειφορική ανάδειξη μνημείων και αρχαιολογικών χώρων με την περιγραφή των ενεργειών που υλοποιήθηκαν προς τον στόχο αυτό σε κάθε έργο.

7.1.2.6. Ειδικός Στόχος 6.4.1. Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1663
ΔΕΙΚΤΗΣ	Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσοστό (%)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	62,69%
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	100%
Πηγή στοιχείων	Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ανά 2 έτη

Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	100% (2021)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Το «Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών με Εργαλεία Διαχείρισης» το 2021 ανήλθε σε 100%, δεδομένης της σύστασης και λειτουργίας του «Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής» που αποτελεί τον καθολικό διάδοχο του Ε.Κ.Π.Α.Α. και των 36 Φ.Δ.Π.Π. Η διαδικασία διαδοχής και μετονομασία του Ε.Κ.Π.Α.Α. σε Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. καθορίστηκε με τις διατάξεις του ν. 4685/2020 (Α 92) όπως τροποποιήθηκε από τους ν. 4722/2020 (Α 177) & ν. 4819/2021 (Α 129). Ο Φορέας εποπτεύεται από το Υπ. Περιβάλλοντος, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας. Δεδομένου αυτού του νέου συστήματος διακυβέρνησης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας, καλύπτεται το εργαλείο διαχείρισης που αφορά την «ύπαρξη σχήματος διοίκησης» κατά 100% σε όλες τις Προστατευόμενες Περιοχές της Περιφέρειας.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 5 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 48/2017, που περιλαμβάνουν επενδύσεις για τη διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας για την Περιφέρεια Ηπείρου και έχουν ολοκληρωθεί.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, LIFE, Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg).
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του ΠΕΠ στο δείκτη προέρχεται από τις ανωτέρω 5 ολοκληρωμένες πράξεις που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου. Με την ολοκλήρωση των πράξεων αυτών, η συνολική έκταση των προστατευόμενων περιοχών της Περιφέρειας που διαθέτουν εργαλεία διαχείρισης εκτιμάται σε 102.883,50 εκτάρια. Για να προσμετρηθεί μια περιοχή του δικτύου Natura 2000 στο δείκτη θα πρέπει να καλύπτεται από κάποιο εργαλείο διαχείρισης σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%.

7.1.2.7. Ειδικός Στόχος 6.5.1. Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1620
ΔΕΙΚΤΗΣ	Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 µg/m ³ που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός ημερών κατ' έτος
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	33
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	35
Πηγή στοιχείων	Περιφέρεια Ηπείρου
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	47 (2022)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Τα στοιχεία του δείκτη διατίθενται από την Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Περιφέρειας Ηπείρου και καταγράφονται από τον σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικών ρύπων. Η τιμή στόχος 2023 προσδιορίζεται βάσει των στόχων της Οδηγίας 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του αέρα και της προγενέστερης ΚΥΑ 3277/209. Η τιμή στόχος προσδιορίζεται ως μέγιστη επιθυμούμενη τιμή. Το ότι η τιμή στόχος δηλώνεται μεγαλύτερη από την τιμή βάσης (ενώ επί της ουσίας ο ΕΣ προσδοκά την μείωση της ρύπανσης) οφείλεται στο γεγονός ότι οι τάσεις για την περιοχή των Ιωαννίνων όπως έχουν τεκμηριωθεί από πρόσφατες ερευνητικές και επιστημονικές εκθέσεις δείχνουν μια σημαντική αύξηση της συγκέντρωσης των ΑΣ10 πράγμα που σημαίνει ότι χωρίς την λήψη μέτρων το όριο των 35 ημερών θα ξεπεραστεί άμεσα. Στόχος συνεπώς της πολιτικής

	για την ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί η ανακοπή αυτής της τάσης σε επίπεδα τέτοια, ώστε να είναι "ανεκτά", να εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και να μην επηρεάζεται το επίπεδο διαβίωσης.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος προκύπτει από 7 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 12/2015, 47/2017 και 52/2017 (δεν έχει καταχωρηθεί σε όλες τις πράξεις), που περιλαμβάνουν επενδύσεις σε έργα αστικής αναζωογόνησης και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη. Οι δράσεις του Ειδικού Στόχου αναμένεται να επιδράσουν τόσο στην μείωση της παραγωγής των ρύπων, όσο και στην δυνατότητα αυτοκαθαρισμού - διασποράς και απορρόφησης των ρύπων.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Ε.Π. ΥΜΕΠΕΡΑΑ, Πράσινο Ταμείο, Ίδιοι πόροι ΟΤΑ.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη αποτελεί μία αρκετά δύσκολη διαδικασία, καθώς ο αντίκτυπος των έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου δεν απευθύνεται μόνο στην μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, αλλά κυρίως στη βελτίωση της ποιότητας του αστικού χώρου και των υπηρεσιών προς τους κατοίκους, στη βελτίωση του μικροκλίματος των αστικών περιοχών, κλπ. Ορισμένες πληροφορίες θα μπορούσαν ίσως να αντληθούν από τις μελέτες στις οποίες βασίζονται τα ανωτέρω έργα, όπου μπορεί να παρέχονται εκτιμήσεις για μείωση των ατμοσφαιρικών ρύπων ΑΣ10, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης των έργων.

7.1.3. Άξονας Προτεραιότητας 3. Ενίσχυση υποδομών μεταφορών

7.1.3.1. Ειδικός Στόχος 7.2.1. Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1667
ΔΕΙΚΤΗΣ	Χρονοαπόσταση
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Λεπτά
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	60
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	21
Πηγή στοιχείων	Διαχειριστική Αρχή/ Έρευνα πεδίου - Μελέτες νέων έργων
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ανά 2 έτη
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Δεν υπάρχει αλλαγή στην τιμή καθώς δεν ολοκληρώθηκαν παρεμβάσεις στους ενταγμένους οδικούς άξονες.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Στον δείκτη, σύμφωνα με τα στοιχεία των εντάξεων, συμβάλουν 4 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 22/2016, 50/2017, 51/2017 και 71/2018 που αφορούν έργα υποδομών μεταφορών, εκ των οποίων οι 2 θα αποτελέσουν τμηματοποιημένα έργα. Η τμηματοποίηση των 2 έργων που συμβάλλουν στο δείκτη εκτιμάται ότι θα επηρεάσει την επίτευξη του στόχου του δείκτη για το 2023.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Εθνικοί Πόροι, Ίδιοι Πόροι ΟΤΑ.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη μπορεί να γίνει άμεσα με την ολοκλήρωση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου και την εκτίμηση της μείωσης της χρονοαπόστασης μεταξύ των περιοχών που θα εξυπηρετούνται από τα συγκεκριμένα έργα.

7.1.3.2. Ειδικός Στόχος 7.2.2. Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1624
ΔΕΙΚΤΗΣ	Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου (τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες/ έτος)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	128
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2013
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	100
Πηγή στοιχείων	Ελληνική Αστυνομία / ΕΛΣΤΑΤ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	106 (2021)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτουν από το Δελτίο τύπου Οδικά τροχαία ατυχήματα (2021) της ΕΛΣΤΑΤ, που δημοσιοποιήθηκαν 28/3/2023 και αφορούν το έτος 2021.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 1 ενταγμένη πράξη της πρόσκλησης 38/2017, που αφορά συστήματα παροχής πληροφόρησης και προμήθεια εξοπλισμού για την πρόληψη των κινδύνων οδικής ασφάλειας.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Εθνικοί Πόροι, Ίδιοι Πόροι ΟΤΑ.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της πράξης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, να αναζητηθούν και να επεξεργαστούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία από την ΕΛΣΤΑΤ για την Περιφέρεια. Σημειώνεται, όμως, ότι υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν το συγκεκριμένο δείκτη (π.χ. ενημέρωση – ευαισθητοποίηση για ορθή οδηγική συμπεριφορά, κατάσταση υποδομών οδικού δικτύου), καθώς και ότι δεν είναι εφικτή η ποσοτικοποίηση της επίδρασης του Προγράμματος στην εξέλιξη (θετική ή αρνητική) του συγκεκριμένου δείκτη.

7.1.4. Άξονας Προτεραιότητας 4. Ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης, υγείας και πρόνοιας

7.1.4.1. Ειδικός Στόχος 9.1.1. Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1649
ΔΕΙΚΤΗΣ	Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός Επισκέψεων
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	951.311
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2013
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	1.008.390
Πηγή στοιχείων	Υπουργείο Υγείας (Στοιχεία Easynet) - Διαχειριστική Αρχή
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια

Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	1.337.576 (2022)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία κοινοποιήθηκαν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υπουργείου Υγείας και αφορούν το 2022, οπότε οι επισκέψεις ανέρχονται σε 1.337.576. Η εξαγωγή των πρωτογενών δεδομένων έγινε από την ηλεκτρονική πλατφόρμα του BI-FORMS του συστήματος Επιχειρηματικής Ευφυΐας ΕΣΥ (BI-Health).
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στο δείκτη με 3 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 11/2015, που αφορούν βελτίωση των υποδομών υγείας, εκ των οποίων η 1 έχει ολοκληρωθεί.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠ ΜΔΤ, Παρεμβάσεις στον κάθετο τομέα πολιτικής «Υγεία».
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση των πράξεων που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, να αναζητηθούν και να επεξεργαστούν τα σχετικά στατιστικά στοιχεία από το BI-Health του Υπουργείου Υγείας, που αφορούν τον αριθμό των επισκέψεων στις υποδομές υγείας που ενισχύθηκαν.

7.1.4.2. Ειδικός Στόχος 9.2.1. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1666
ΔΕΙΚΤΗΣ	Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	0
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	1
Πηγή στοιχείων	ΟΠΣ-ΕΣΠΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης προστέθηκε στην 2η Αναθεώρηση του ΕΠ με αρχικό στόχο 5. Η τιμή στόχος του δείκτη μειώθηκε σε 1 στην αναθεώρηση του 2021, αναλογικά με τη μείωση του π/υ της Δράσης 9.2.1.1. «Υποδομές για περιθωριοποιημένες κοινότητες».
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με το έργο «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή Ελευθεροχωρίου Φιλιππιάδας», το οποίο έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της πρόσκλησης 104/2020 και είναι σε εξέλιξη.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	-
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Με την ολοκλήρωση του έργου «Βελτίωση υποδομών στην περιοχή Ελευθεροχωρίου Φιλιππιάδας» θα επιτευχθεί και η τιμή στόχος του δείκτη για το 2023.

7.1.4.3. Ειδικός Στόχος 10.1. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	T1631
ΔΕΙΚΤΗΣ	Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσοστό (%)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	10,6%
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2013
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	9,7%
Πηγή στοιχείων	ΕΛΣΤΑΤ/EUROSTAT
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Σύμφωνα με την αναφορά της ΕΛΣΤΑΤ (κατά την απογραφή πληθυσμού 2011) 10,8%, του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών της Περιφέρειας Ηπείρου, είχε ανώτερο ολοκληρωμένο επίπεδο εκπαίδευσης, τριτάξιο Γυμνάσιο. Δεν έχουν ακόμα δημοσιοποιηθεί τα επικαιροποιημένα στοιχεία από την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ του 2021.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στη μείωση του ποσοστού του δείκτη με 7 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 18/2016, 37/2017, 41/2017, 45/2017 και 46/2017, που αφορούν υποδομές προσχολικής και σχολικής εκπαίδευσης και εξοπλισμό εργαστηρίων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων οι 4 έχουν ολοκληρωθεί. Σημειώνεται ότι δεν έχει καταχωρηθεί σε όλες τις σχετικές πράξεις στο ΟΠΣ.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Επικαιροποιημένα στοιχεία θα προκύψουν από την νέα απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, βάσει των οποίων θα είναι εφικτός ο υπολογισμός του ποσοστού του πληθυσμού της Περιφέρειας που έχει ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη θα μπορούσε να γίνει με έρευνα στον πληθυσμό που σχετίζεται με τις υποδομές που ενισχύονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου. Ωστόσο, δεν θα μπορούσε να τεκμηριωθεί με βεβαιότητα ότι η μεταβολή του ποσοστού οφείλεται στη βελτίωση των συγκεκριμένων υποδομών και όχι σε άλλους παράγοντες (π.χ. αύξηση εισοδήματος, αλλαγή εκπαιδευτικού συστήματος κ.α.).

7.1.5. Άξονας Προτεραιότητας 5. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Κοινωνική ένταξη και καταπολέμηση διακρίσεων

7.1.5.1. Ειδικός Στόχος 8.1.1. Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	CR06
ΔΕΙΚΤΗΣ	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	0

ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	58
Πηγή στοιχείων	Έρευνα
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια έκθεση 2019 και 2025
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις που περιλαμβάνουν προγράμματα απασχόλησης ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς αιχμής για την περιφερειακή οικονομία.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη είναι μηδενική στην παρούσα φάση, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί σχετικές δράσεις. Αναμένεται όμως η υλοποίηση να αυξηθεί, αφού από το 2020 έχουν ενταχθεί και είναι σε εξέλιξη 261 πράξεις της πρόσκλησης 79/2019, που αφορούν στην επιχορήγηση επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠΑΝΕΚ, ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΟΑΕΔ.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Τα δεδομένα για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη συμβολή του ΠΕΠ παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας του συγκεκριμένου Κοινού Δείκτη Αποτελεσμάτων. Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη είναι τα μικροδεδομένα των συμμετεχόντων, που καταχωρούνται από τους δικαιούχους των πράξεων στα αντίστοιχα απογραφικά δελτία. Η περαιτέρω εκτίμηση των επιπτώσεων από τις πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου θα μπορούσε να γίνει με έρευνα πεδίου στους ωφελούμενους των συγκεκριμένων πράξεων, μετά την πάροδο ορισμένου χρονικού διαστήματος από τη λήξη της συμμετοχής τους.

7.1.5.2. Ειδικός Στόχος 9.1.1. Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	10502
ΔΕΙΚΤΗΣ	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση εργασίας τους, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	750
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2016
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	5.273
Πηγή στοιχείων	ΟΠΣ, microdata
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	6.974 (2022 σωρευτική τιμή)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση

Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 7 ενταγμένες πράξεις των προκλήσεων 01/2015, 29/2016, 42/2017, 66/2018, 83/2019, 95/2020 και 109/2021.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	Εθνικοί πόροι, ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Τα δεδομένα για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη συμβολή του ΠΕΠ παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας του συγκεκριμένου Δείκτη Αποτελεσμάτων. Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη είναι τα μικροδεδομένα των συμμετεχόντων, που καταχωρούνται από τους δικαιούχους των πράξεων στα αντίστοιχα απογραφικά δελτία στο ΟΠΣ. Η περαιτέρω εκτίμηση των επιπτώσεων από τις πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου θα μπορούσε να γίνει με έρευνα πεδίου στους ωφελούμενους των συγκεκριμένων πράξεων.

7.1.5.3. Ειδικός Στόχος 9.2.1. Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	05504
ΔΕΙΚΤΗΣ	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	0
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	10
Πηγή στοιχείων	Έρευνα
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ολοκλήρωση μελέτης αξιολόγησης
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	10 (Οκτώβριος 2023)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις υποστήριξης κοινωνικά ευπαθών ομάδων για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 10 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 25/2016 και 54/2018 (Κέντρα Κοινότητας).
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η τελική τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 10 και προέκυψε από την επαναληπτική μέτρηση του δείκτη μέσω ερωτηματολογίου στις υποστηριζόμενες δομές (Οκτώβριος 2023).

7.1.5.4. Ειδικός Στόχος 9.2.2. Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της 6^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ για το 2023 έχει προταθεί η διαγραφή του Ειδικού Στόχου 9.2.2.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	11105
ΔΕΙΚΤΗΣ	Συμμετέχοντες σε μειονεκτική θέση (Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που

	αποκτούν εξειδίκευση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	39
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	1
Πηγή στοιχείων	ΟΠΣ, microdata
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις υποστήριξης ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχουν ενταχθεί σχετικές πράξεις. Η υλοποίηση του δείκτη θα παραμείνει μηδενική, καθώς δεν προβλέπεται η ένταξη δράσεων υποστήριξης/ αύξησης της απασχόλησης ατόμων σε μειονεκτική θέση, στο πλαίσιο της επενδυτικής προτεραιότητας 9ii. Ειδικότερα, η δράση 9.2.2.1. «Υποστήριξη ατόμων σε μειονεκτική θέση (πχ Ρομά ή αιτούντες άσυλο ή ασυνόδευτοι ανήλικοι) για την κοινωνικοοικονομική τους ενσωμάτωση», που τροφοδοτεί το δείκτη, δεν θα υλοποιηθεί (δεν υπήρξε ενδιαφέρον).
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση, ΟΑΕΔ.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του προγράμματος στο δείκτη είναι μηδενική.

7.1.5.5. Ειδικός Στόχος 9.3.1. Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	10502
ΔΕΙΚΤΗΣ	Συμμετέχοντες που αποδεσμεύονται από τη φροντίδα εξαρτημένων ατόμων και που δραστηριοποιούνται σε αναζήτηση εργασίας, που συμμετέχουν σε εκπαίδευση/κατάρτιση, που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, ή που διατηρούν τη θέση
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	37
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2016
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	119
Πηγή στοιχείων	ΟΠΣ, microdata
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	154 (2022, σωρευτική τιμή)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων που έχουν την φροντίδα παιδιών ΑμεΑ
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 7 ενταγμένες πράξεις των προκλήσεων 02/2015, 30/2016, 43/2017, 67/2018, 84/2019, 100/2020 και 110/2021 που αφορούν παροχή υπηρεσιών προσχολικής αγωγής για ΑμεΑ και παροχή υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για ΑμεΑ.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Τα δεδομένα για την εκτίμηση των αποτελεσμάτων και τη συμβολή του ΠΕΠ παρακολουθούνται σύμφωνα με το Δελτίο Ταυτότητας του συγκεκριμένου Δείκτη Αποτελεσμάτων. Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη είναι τα μικροδεδομένα των συμμετεχόντων, που καταχωρούνται από τους δικαιούχους των πράξεων στα αντίστοιχα απογραφικά δελτία στο ΟΠΣ. Η περαιτέρω εκτίμηση των επιπτώσεων από τις πράξεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου θα μπορούσε να γίνει με έρευνα πεδίου στους ωφελούμενους των συγκεκριμένων πράξεων.

7.1.5.6. Ειδικός Στόχος 9.3.2. Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες (ΑΜΕΑ, μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, κακοποιημένες γυναίκες)

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	05504
ΔΕΙΚΤΗΣ	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	0
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	7
Πηγή στοιχείων	Έρευνα
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ολοκλήρωση μελέτης αξιολόγησης
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	4 (2018)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 7 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 20/2016, 21/2016, 33/2016 και 87/2017, που περιλαμβάνουν λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο, ξενώνων φιλοξενίας, Κέντρων Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία και Στέγης Υποστηριζόμενης Διαβίωσης (ΣΥΔ). Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω πράξεις, μόνο 1 εντάχθηκε στο πλαίσιο του Ε.Σ. 9.3.2, ενώ οι υπόλοιπες 6 πράξεις εντάχθηκαν στον Ε.Σ. 9.3.1
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η υφιστάμενη τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι 4 (με βάση τη συμβολή των δομών κακοποιημένων γυναικών) και δεν θα μεταβληθεί λόγω της μη λειτουργίας του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος, που αποτελεί ένα από τα δύο κριτήρια για να λάβει θετική τιμή ο συγκεκριμένος δείκτης στις λοιπές υποστηριζόμενες δομές. Η αντιμετώπιση του κριτηρίου αυτού στην Τελική Έκθεση του Προγράμματος θα γίνει με βάση τις οδηγίες που θα δοθούν κεντρικά. Το άλλο κριτήριο σχετίζεται με την «υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα γενικότερα», το οποίο με βάση τα αποτελέσματα της επαναληπτικής μέτρησης του

	δείκτη μέσω ερωτηματολογίου στις υποστηριζόμενες δομές, εκπληρώνεται για το σύνολο των υπόλοιπων υποστηριζόμενων δομών (9) . Οπότε η τιμή επίτευξης του δείκτη χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της λειτουργίας του Γεωπληροφοριακού θα ανερχόταν σε 13.
--	--

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	11509
ΔΕΙΚΤΗΣ	Ποσοστό σχολείων που παρέχουν υπηρεσίες εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης σε μαθητές ΑΜΕΑ
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσοστό (%)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	2,3%
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2016
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	3,8%
Πηγή στοιχείων	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια Έκθεση 2019 και τελική Ετήσια Έκθεση.
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	1,52% (2019)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την προώθηση της ισότητας των ευκαιριών
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 3 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 3/2015, 31/2016 και 68/2018 που περιλαμβάνουν την παράλληλη στήριξη παιδιών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Σημειώνεται ότι από τις ανωτέρω πράξεις, μόνο 1 εντάχθηκε στο πλαίσιο του Ε.Σ. 9.3.2, ενώ οι υπόλοιπες 2 πράξεις εντάχθηκαν στον Ε.Σ. 9.3.1.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση.
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ στον δείκτη θα αξιοποιηθούν δεδομένα εκρών και αποτελεσμάτων που παρέχονται από το Πληροφοριακό Σύστημα της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ του Τομέα Παιδείας.

7.1.5.7. Ειδικός Στόχος 9.4.1. Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λοιπές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	11206
ΔΕΙΚΤΗΣ	Ποσοστό ατόμων που πλήττονται από τη φτώχεια και ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από τις υπηρεσίες των Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY)
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσοστό (%)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	0
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	35,7%
Πηγή στοιχείων	Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας από εφαρμογές ΗΔΙΚΑ
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια

Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	17,32% (2022)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις ανάπτυξης δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 1 ενταγμένη πράξη της πρόσκλησης 76/2018 που περιλαμβάνει τη λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας (TOMY) 6ης ΥΠΕ στην Περιφέρεια Ηπείρου.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	ΕΠ ΜΔΤ (πιλοτική εφαρμογή των TOMY)
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του ΠΕΠ στον δείκτη θα προκύψει από την αποτίμηση της λειτουργίας των μονάδων που ενισχύονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, σε σχέση με το ποσοστό των εξυπηρετούμενων πολιτών και μάλιστα αυτών που πλήττονται από την φτώχεια. Τα στοιχεία θα συλλεχθούν από την Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Υγείας.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	11207
ΔΕΙΚΤΗΣ	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στις συγχρηματοδοτούμενες δομές στο σύνολο των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες ψυχικής υγείας στην Περιφέρεια
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσοστό (%)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	1,39%
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	2,94%
Πηγή στοιχείων	www.psychargos.gov.gr
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις ανάπτυξης δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 6 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 63/2018, που περιλαμβάνουν δράσεις για την παροχή υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην Κοινότητα.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του ΠΕΠ στον δείκτη θα προκύψει από την αποτίμηση της λειτουργίας των δομών παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας που ενισχύονται στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία εκροών και αποτελεσμάτων που παρέχονται από τους φορείς λειτουργίας των ανωτέρω δομών.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	11208
ΔΕΙΚΤΗΣ	Ποσοστό των ατόμων που ωφελούνται από υπηρεσίες υγείας για εξαρτήσεις προς το σύνολο των ατόμων που αιτήθηκαν υπηρεσίες για εξαρτήσεις

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Ποσοστό (%)
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	0
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	31,4%
Πηγή στοιχείων	Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ)
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια Έκθεση ΕΚΤΕΠΝ
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	67,47% (2021)
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις ανάπτυξης δικτύου προστασίας της υγείας των πολιτών της Περιφέρειας.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 5 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 62/2018, που περιλαμβάνουν δράσεις για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	-
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η συμβολή του ΠΕΠ στον δείκτη θα προκύψει από την αποτίμηση της λειτουργίας των δομών που ενισχύονται και της υλοποίησης λοιπών δράσεων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στο πλαίσιο του Ειδικού Στόχου, λαμβάνοντας υπόψη και τα στοιχεία εκροών και αποτελεσμάτων που παρέχονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ).

7.1.5.8. Ειδικός Στόχος 9.4.2. Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	05504
ΔΕΙΚΤΗΣ	Αριθμός δομών που προσφέρουν βελτιωμένες/διευρυμένες υπηρεσίες
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	0
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	25
Πηγή στοιχείων	Έρευνα
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ολοκλήρωση μελέτης αξιολόγησης
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας σε ευπαθείς ομάδες.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 19 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 26/2016, 27/2016 και 28/2016, που περιλαμβάνουν Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Κοινωνικά Παντοπωλεία, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικά Φαρμακεία και Δομές αστέγων.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	-

Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η υφιστάμενη τιμή υλοποίησης του δείκτη είναι μηδενική και <u>θα παραμείνει μηδενική</u> λόγω της μη λειτουργίας του Ενιαίου Γεωπληροφοριακού Συστήματος, που αποτελεί ένα από τα δύο κριτήρια για να λάβει θετική τιμή ο συγκεκριμένος δείκτης. Η αντιμετώπιση του κριτηρίου αυτού στην Τελική Έκθεση του Προγράμματος θα γίνει με βάση τις οδηγίες που θα δοθούν κεντρικά. Το άλλο κριτήριο σχετίζεται με την «υλοποίηση δράσεων δικτύωσης και συνεργασίας με κοινωνικούς φορείς / φορείς παροχής κοινωνικών υπηρεσιών, Κέντρα Κοινότητας και την τοπική κοινότητα γενικότερα», το οποίο με βάση τα αποτελέσματα της επαναληπτικής μέτρησης του δείκτη μέσω ερωτηματολογίου στις υποστηριζόμενες δομές, εκπληρώνεται για το σύνολο των υποστηριζόμενων δομών. Οπότε η τιμή επίτευξης του δείκτη χωρίς να ληφθεί υπόψη το κριτήριο της λειτουργίας του Γεωπληροφοριακού θα ανερχόταν σε 25.
---	--

7.1.5.9. Ειδικός Στόχος 9.5.1. Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	11303
ΔΕΙΚΤΗΣ	Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	3
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	8
Πηγή στοιχείων	ΠΣΚΕ, Έρευνα Πεδίου
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	1 έτος μετά την ολοκλήρωση των πράξεων
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με δράσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Το πρόγραμμα συμβάλει στον δείκτη με 13 ενταγμένες πράξεις της πρόσκλησης 97/2020 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας». Η συμβολή του προγράμματος στον δείκτη είναι μηδενική στην παρούσα φάση, καθώς δεν έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές δράσεις.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	-
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ μπορεί να γίνει με έρευνα πεδίου, μετά την ολοκλήρωση των σχετικών πράξεων, στους φορείς ΚΑΛΟ που θα ενισχυθούν από το ΠΕΠ.

7.1.5.10. Ειδικός Στόχος 9.6.1. Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	CR06
ΔΕΙΚΤΗΣ	Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης, εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός

ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	92
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	27
Πηγή στοιχείων	Έρευνα
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια έκθεση 2019 και 2025.
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης σχετίζεται με ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης.
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Στο δείκτη συμβάλλουν 3 ενταγμένες πράξεις στο πλαίσιο των προσκλήσεων 98/2020 & 101/2020, με τιμή στόχου 17.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη είναι τα μικροδεδομένα των συμμετεχόντων, που καταχωρούνται από τους δικαιούχους των πράξεων στα αντίστοιχα απογραφικά δελτία στο ΟΠΣ.

ΚΩΔ. ΔΕΙΚΤΗ	CR03
ΔΕΙΚΤΗΣ	Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά την λήξη συμμετοχής τους
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	Αριθμός
ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ	0
ΕΤΟΣ ΒΑΣΗΣ	2014
ΣΤΟΧΟΣ (2023)	15
Πηγή στοιχείων	ΟΠΣ, microdata
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ	Ετήσια
Πλέον πρόσφατη διαθέσιμη τιμή (έτος αναφοράς)	-
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	Ο δείκτης CR03 προστέθηκε στην αναθεώρηση του 2021 για την μέτρηση των αποτελεσμάτων της δράσης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων απασχολούμενων» στο πλαίσιο των ΤΑΠΤΟΚ».
Εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Στο δείκτη συμβάλλουν 1 ενταγμένο έργο στο πλαίσιο της πρόσκλησης 99/2020 με τιμή στόχο 15.
Λοιπές πηγές που συμβάλλουν στον δείκτη	
Μεθοδολογική προσέγγιση για την εκτίμηση της συμβολής του ΠΕΠ	Η πηγή για τη μέτρηση των τιμών του δείκτη είναι τα μικροδεδομένα των συμμετεχόντων, που καταχωρούνται από τους δικαιούχους των πράξεων στα αντίστοιχα απογραφικά δελτία στο ΟΠΣ.

7.2. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

7.2.1. Προβλεπόμενες Αξιολογήσεις Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Η διερεύνηση των επιπτώσεων των παρεμβάσεων του ΠΕΠ περιλαμβάνει την εξέταση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων, στοχεύοντας κατ' αρχάς στην αναγνώριση τους και στην συνέχεια στη διαπίστωση του ρόλου που διαδραμάτισαν οι υλοποιημένες παρεμβάσεις στην διαμόρφωση τους, στην αναγνώριση λοιπών παραγόντων και συνθηκών που επέδρασαν, στο πόσο οι αλλαγές που συντελέστηκαν είναι βιώσιμες και διατηρήσιμες μετά το πέρας της προγραμματικής στήριξης, στο κατά πόσο, αλλά και πως οι αλλαγές επέδρασαν στους δικαιούχους και στις ομάδες στόχους των παρεμβάσεων. Πέρα όμως από τη διατύπωση των αναμενόμενων αποτελεσμάτων και την κατανόηση του τρόπου με τον οποίο αυτά επιτεύχθηκαν από το Πρόγραμμα, η Αξιολόγηση των Επιπτώσεων περιλαμβάνει ως εξίσου σημαντικό τμήμα της, την διερεύνηση των μη αναμενόμενων θετικών ή αρνητικών αποτελεσμάτων και των επιπτώσεων που αυτά έχουν στην υπό εξέταση Περιφέρεια.

Οι Αξιολογήσεις Επιπτώσεων αποτελούν βασικό εργαλείο υποστήριξης της πολιτικής της περιφερειακής ανάπτυξης, στοχεύοντας στην παροχή πληροφόρησης αναφορικά με:

- το σωρευτικό αποτέλεσμα που προκύπτει από την εφαρμογή του μείγματος των παρεμβάσεων του Προγράμματος,
- το βαθμό συνεισφοράς των παρεμβάσεων του Προγράμματος στη διαμόρφωση των περιφερειακών μεγεθών που προκύπτουν από την "φυσική" εξέλιξη των μεγεθών, αλλά και την επίδραση άλλων μέσων πολιτικής,
- την κατανόηση των τρόπων που θα μπορούσε να μεταφερθεί, ενισχυθεί ή προσαρμοστεί μια πρακτική που οδηγεί σε θετικά αποτελέσματα,
- την κατανόηση των τρόπων που θα μπορούσαν να περιορισθούν οι μη επιδιωκόμενες αρνητικές συνέπειες / αποτελέσματα μιας παρέμβασης ή μιας ομάδας παρεμβάσεων,
- τη σκοπιμότητα επέκτασης ή αναδιαμόρφωσης μιας παρέμβασης ή μιας ομάδας παρεμβάσεων.

Η εκτίμηση του βαθμού συμβολής των παρεμβάσεων στο συνολικό αποτέλεσμα περιλαμβάνει δύο βασικές προσεγγίσεις:

- Την πραγματολογική (factual) που εστιάζει στη σύγκριση των υλοποιημένων αποτελεσμάτων με αυτά που αναμένονται εάν η Θεωρία της Αλλαγής (ΘΤΑ) ήταν αληθής. Εξετάζεται το πότε, το πού και για ποιον έλαβαν χώρα οι επιπτώσεις. Εξετάζεται επίσης αν είναι τα αποτελέσματα συνεπή με τη θεωρία, αν η παρέμβαση προκάλεσε ή συνέβαλε στα αποτελέσματα. Αναγνωρίζονται ακόμα τα συμπληρωματικά μέσα που επέδρασαν στην διαμόρφωση του αποτελέσματος (π.χ. άλλα Προγράμματα) και πραγματοποιείται βάση των εκρικών επιμερισμός του συνολικού αποτελέσματος. Η προσέγγιση αυτή αποτελεί την βάση των Αξιολογήσεων με βάση την θεωρία (theory based).

Οι αξιολογήσεις με βάση τη θεωρία θα πρέπει να απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με το πώς και γιατί ένα πρόγραμμα έχει ή δεν έχει αντίκτυπο. Μια θεωρητική προσέγγιση θα διερευνήσει την αιτιώδη συνάφεια που συνδέει τις εισροές, τις δραστηριότητες και τις εκροές με τις επιπτώσεις. Ο κύριος στόχος του είναι να εξηγήσει γιατί συνέβη μια δεδομένη αλλαγή και πώς μια παρέμβαση προκάλεσε αυτή την αλλαγή. Έτσι, μια θεωρητική προσέγγιση θα εξετάσει με ακρίβεια όλες τις υποθέσεις που αποτελούν τη βάση του αιτιώδους δεσμού.

- Την αντισταθμιστική (counterfactuals), που εστιάζει στην εκτίμηση για το τι θα συνέβαινε απουσία της παρέμβασης. Στην περίπτωση αυτή η διερεύνηση εμβαθύνει στην εξέταση της επίπτωσης σε διαφορετικές ομάδες ωφελούμενων που καθορίζονται με βάση το είδος (ή την πηγή) της υποστήριξης που λάβανε. Στην

συνήθη περίπτωση η αντισταθμιστική μέθοδος εστιάζει στο να ερμηνεύσει την "καθαρή" επίπτωση συγκρίνοντας τα αποτελέσματα μεταξύ ενός δείγματος.

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι προσέγγισης του αντιπαραδείγματος: α) χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα που παρατηρείται για τους μη «δικαιούχους» και β) χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμα που παρατηρείται για τους δικαιούχους πριν «εκτεθούν» στην παρέμβαση.

Μετά την 3^η αναθεώρηση του (Ιούνιος 2023) το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ Ηπείρου περιλαμβάνει συνολικά 14 Αξιολογήσεις εκ των οποίων οι 4 αποτελούν αξιολογήσεις επιπτώσεων επιμέρους παρεμβάσεων του Προγράμματος.

Από τις προβλεπόμενες 4 αξιολογήσεις επιπτώσεων:

- 3 είναι οριζόντιες και υλοποιούνται οι 2 από την ΕΥΣΣΑΕ σε συνεργασία με την ΕΥΣΕΚΤ και 1 από την ΕΥΚΕ.
- 1 αξιολόγηση αφορά στη συνολική αξιολόγηση των παρεμβάσεων του ΠΕΠ και έχει ως στόχο να αποτυπώσει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων του Προγράμματος και να εκτιμήσει το βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, αναμενόμενες ή μη.

Στον Πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες, με βάση το Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ, αξιολογήσεις επιπτώσεων και η διασύνδεσή τους με τους Ειδικούς Στόχους του Προγράμματος.

Πίνακας 54. Αντιστοίχιση Αξιολογήσεων Επιπτώσεων με τους Ειδικούς Στόχους του ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020

ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ	ΘΣ	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ				Αρ. Αξιολ.
		ΑΞ 9 Μελέτη αποτίμησης της επίδρασης των πόρων του ΕΣΠΑ για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας την περίοδο της πανδημίας της COVID-19*	ΑΞ 11 Οριζόντια αξιολόγηση των δράσεων Έξυπνης Εξειδίκευσης στα ΠΕΠ 2014-20*	ΑΞ 12 Αξιολόγηση επιπτώσεων των χωρικών εργαλείων στην Ελλάδα 2014-2020*	ΑΞ 14 Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020	
ΕΣ 1.1.1 Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο	ΘΣ 1				✓	1
ΕΣ 1.2.1 Ανάπτυξη των συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών φορέων και επιχειρήσεων της Περιφέρειας			✓			1
ΕΣ 2.2.1 Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα	ΘΣ 2		✓			1
ΕΣ 2.3.1 Αποδοτική διαχείριση υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ				✓		1
ΕΣ 3.1.1 Αύξηση των καινοτομών ΜΜΕ στους τομείς RIS3 της Περιφέρειας	ΘΣ 3		✓			1
ΕΣ 3.2.1 Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας			✓			1
ΕΣ 3.3.1 Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της περιφέρειας		✓	✓			2
ΕΣ 4.3.1 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας	ΘΣ 4				✓	1
ΕΣ 4.5.1 Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας					✓	1
ΕΣ 5.2.1 Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών	ΘΣ 5				✓	1
ΕΣ 6.2.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων	ΘΣ 6				✓	1
ΕΣ 6.3.1 Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία				✓		1
ΕΣ 6.4.1 Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας					✓	1
ΕΣ 6.5.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών				✓		1
ΕΣ 7.2.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος	ΘΣ 7			✓		1
ΕΣ 7.2.2 Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου					✓	1
ΕΣ 9.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες	ΘΣ 9 / ΕΤΠΑ				✓	1
ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων				✓		1
ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου					✓	1
ΕΣ 10.1.1 Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση	ΘΣ 10 / ΕΤΠΑ				✓	1
ΕΣ 8.1.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα	ΘΣ 8		✓			1
ΕΣ 9.1.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση	ΘΣ 9 / ΕΚΤ					0
ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες						0
ΕΣ 9.2.2 Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους					✓	1
ΕΣ 9.3.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ατόμων που πλήττονται από φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό						0
ΕΣ 9.3.2 Βελτίωση της παροχής κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών εκπαιδευτικής υποστήριξης σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες						0
ΕΣ 9.4.1 Βελτίωση της παροχής υπηρεσιών υγείας σε άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και λουτές ευπαθείς κοινωνικά ομάδες						0
ΕΣ 9.4.2 Βελτίωση της προσβασιμότητας των κοινωνικά ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές και ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες						0
ΕΣ 9.5.1 Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων					✓	1
ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού				✓		1

* Οριζόντιες Αξιολογήσεις

Αρ. Ειδικών Στόχων	1	6	6	12
--------------------	---	---	---	----

Επισημαίνεται ότι η χρησιμότητα της εστίασης των αξιολογήσεων επιπτώσεων στα ποσοτικά αποτελέσματα, περιορίζεται εν μέρει από τον χρονικό προγραμματισμό τους, με βάση τον οποίο η υλοποίησή τους συμπίπτει με την περίοδο ολοκλήρωσης επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΠ και σε κάθε περίπτωση δεν έχει επέλθει ικανό χρονικό διάστημα από την ολοκλήρωσή τους. Στην συγκεκριμένη αυτή περίοδο ενδέχεται να μην είναι ακόμα ορατά και μετρήσιμα τα μακροχρόνια αποτελέσματα και οι επιπτώσεις των παρεμβάσεων του Προγράμματος (λαμβάνοντας υπόψη και την παρούσα σχετική υστέρηση στην πρόοδο υλοποίησης επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΠ) και επιπρόσθετα ο βαθμός αξιοποίησης των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων επιπτώσεων στο σχεδιασμό της επόμενης ΠΠ 2021-2027 ουσιαστικά μηδενίζεται. Παρόλα αυτά, οι προβλεπόμενες αξιολογήσεις επιπτώσεων μπορούν να αξιοποιηθούν ως εργαλείο βελτίωσης ή εξειδίκευσης του σχεδιασμού αντίστοιχων παρεμβάσεων καθώς και ως εργαλείο υποστήριξης της πολιτικής για την περιφερειακή ανάπτυξη.

7.2.2. Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020

Στις ενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο υφιστάμενος σχεδιασμός της Αξιολόγησης Επιπτώσεων που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της ΕΥΔ (Αξιολόγηση Νο 14) με βάση το Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης (ΔΤΑ), επισημαίνονται οι πηγές άντλησης των απαιτούμενων δεδομένων και εξετάζεται η δυνατότητα εξασφάλισής τους.

7.2.2.1. Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης

Πίνακας 55. Δελτίο Ταυτότητας Αξιολόγησης 14 με βάση το εγκεκριμένο Σχέδιο Αξιολόγησης του ΠΕΠ Ήπειρος 2014-2020

ΑΞ 14	Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020
Αντικείμενο Αξιολόγησης	Η αξιολόγηση επιπτώσεων και αποτελέσματος του Ε.Π., έχει ως στόχο να αποτυπώσει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων και να εκτιμήσει το βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, αναμενόμενες ή μη. Τελικό σκοπό θα έχει να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν ήταν χρήσιμες και συνέβαλαν στην επίλυση των προβλημάτων που αρχικά στόχευαν. Το ζητούμενο από την εν λόγω αξιολόγηση εκτός από την κάλυψη των κανονιστικών υποχρεώσεων και τον έλεγχο της επίτευξης των τεθέντων στόχων και της ικανοποίησης των αναγκών, είναι η αποτίμηση της κατάστασης της Περιφέρειας Ηπείρου μετά την υλοποίηση του Ε.Π., σε κοινωνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό επίπεδο. Η συνολική αξιολόγηση των δράσεων του προγράμματος, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη της Περιφέρειας μετά τη λήξη του Ε.Π. Ηπείρου 2014-2020, αφού θα συμβάλλει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση μελλοντικά εμπεριστατωμένων παρεμβάσεων.
Περιεχόμενο	Η συνολική αυτή αξιολόγηση θα αφορά σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες/ειδικούς στόχους (αφού θα συνοψίζει τα αποτελέσματα όλων των αξιολογήσεων και επιπλέον θα αξιολογεί αναλυτικά τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των επενδυτικών προτεραιοτήτων/ειδικών στόχων) που δεν αξιολογήθηκαν ως προς τις επιπτώσεις σε οριζόντιες ή/και θεματικές αξιολογήσεις. Σύμφωνα με τις κανονιστικές δεσμεύσεις θα αξιολογηθεί τελικά ο τρόπος με τον οποίο τα ΕΔΕΤ συνέβαλαν στην επίτευξη των στόχων για κάθε άξονα προτεραιότητας, τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου Προγραμματισμού.
Κριτήριο αξιολόγησης	✓ Η αποτελεσματικότητα του Προγράμματος σε σχέση με την επίτευξη των στόχων που είχαν αρχικά τεθεί. ✓ Η αποδοτικότητα των στόχων του Προγράμματος που επιτεύχθηκαν σε σχέση με το κόστος τους. ✓ Η επίπτωση του Προγράμματος στους ωφελούμενους, αλλά και γενικότερα στην περιοχή. ✓ Η βιωσιμότητα του Προγράμματος και μετά τη λήξη του. ✓ Η καταλληλότητα του αρχικού σχεδιασμού του Προγράμματος σε σχέση με τις ανάγκες που όφειλε να καλύψει.
Ερωτήματα αξιολόγησης	Αποτελεσματικότητα: 1. Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί; Επίπτωση: 2. Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα της παρέμβασης;

ΑΞ 14	Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων του Ε.Π. Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020
	3. Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στην συγκεκριμένη παρέμβαση; 4. Πώς οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις συνέβαλαν στη αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Περιφέρεια Ηπείρου; Βιωσιμότητα: 5. Είναι η παρέμβαση συμβατή με μία βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων; 6. Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης; Καταλληλότητα 7. Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός της παρέμβασης ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες; 8. Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός της παρέμβασης ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ωφελουμένων; 9. Υλοποιήθηκε η παρέμβαση όπως είχε σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι; 10. Σε ποιο βαθμό η παρέμβαση λειτουργήσε κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος; Αποδοτικότητα: 11. Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση της παρέμβασης;
Μέθοδος	Η μέθοδος που θα επιλεγεί να εφαρμοστεί είναι η «Theory based method». Θα γίνει συνδυασμός με ποσοτικές εκτιμήσεις για την επιβεβαίωση των συμπερασμάτων. Θα χρησιμοποιηθεί η ανάλυση στοιχείων δεικτών εκρών και αποτελέσματος του συστήματος παρακολούθησης, καθώς και η Βιβλιογραφική έρευνα – Στατιστική ανάλυση.
Δεδομένα	Όλοι οι κοινοί και ειδικοί δείκτες του Προγράμματος. Θα απαιτηθούν και δεδομένα που θα συλλεχθούν με τις παραπάνω μεθόδους, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα σύνταξης της εν λόγω αξιολόγησης.
Τρόπος διεξαγωγής αξιολόγησης	Η διεξαγωγή της αξιολόγησης θα γίνει από εξωτερικούς αξιολογητές.
Διάρκεια	- Εκτιμώμενη διάρκεια εκπόνησης: 8 μήνες - Εκτιμώμενη ημερομηνία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης: 10ος του 2024
Εκτιμώμενος π/υ	60.000 € (χωρίς ΦΠΑ)

7.2.2.2. Προσδιορισμός και δυνατότητα εξασφάλισης απαιτούμενων δεδομένων ανά Θεματικό Στόχο

Η συνολική αξιολόγηση επιπτώσεων και αποτελέσματος του Προγράμματος έχει ως στόχο να αποτυπώσει τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις των παρεμβάσεων του και να εκτιμήσει το βαθμό που οι παρεμβάσεις αυτές συνέβαλαν στα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, αναμενόμενες ή μη. Τελικό σκοπό θα έχει να διαπιστωθεί αν οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν ήταν χρήσιμες και συνέβαλαν στην επίλυση των προβλημάτων που αρχικά στόχευαν.

Η συνολική αυτή αξιολόγηση θα αφορά δηλαδή σε όλες τις επενδυτικές προτεραιότητες/ειδικούς στόχους, αφού θα συνοψίζει τα αποτελέσματα όλων των αξιολογήσεων και επιπλέον θα αξιολογεί αναλυτικά τις επιπτώσεις και τα αποτελέσματα των επενδυτικών προτεραιοτήτων/ειδικών στόχων που δεν αξιολογήθηκαν στις θεματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων.

Στην παρούσα Ενότητα προσδιορίζονται τα απαιτούμενα δεδομένα και οι αντίστοιχες πηγές τους αναφορικά με τους Ειδικούς Στόχους που δεν εμπίπτουν στο πεδίο των Θεματικών οριζόντιων Αξιολογήσεων Επιπτώσεων και θα αποτελέσουν βασικό αντικείμενο της Αξιολόγησης που θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της ΕΥΔ. Οι Ειδικοί Στόχοι αυτοί, όπως αποτυπώνεται και στον Πίνακα 1 ανωτέρω είναι οι εξής:

ΘΣ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΣ 1	ΕΣ 1.1.1 Βελτίωση του βαθμού δικτύωσης των ερευνητικών φορέων της Περιφέρειας με τον ελληνικό και διεθνή χώρο
ΘΣ 4	ΕΣ 4.3.1 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας ΕΣ 4.5.1 Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας

ΘΣ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΠΕΠ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΘΣ 5	ΕΣ 5.2.1 Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών
ΘΣ 6	ΕΣ 6.2.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων ΕΣ 6.4.1 Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας
ΘΣ 7	ΕΣ 7.2.2 Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου
ΘΣ 9 / ΕΤΠΑ	ΕΣ 9.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου
ΘΣ 10 / ΕΤΠΑ	ΕΣ 10.1.1.Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση
ΘΣ 9 / ΕΚΤ	ΕΣ 9.2.2 Ενίσχυση των ατόμων περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, όπως οι Ρομά, για την εργασιακή και κοινωνική ένταξή τους Ε.Σ.9.5.1 Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο της 6ης αναθεώρησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, η οποία βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης από τα αρμόδια όργανα της ΕΕ, έχει προταθεί η διαγραφή των Ειδικών Στόχων 1.1.1 & 9.2.2. Ως εκ τούτου οι ΕΣ που εμπίπτουν στο πεδίο της αξιολόγησης επιπτώσεων παρεμβάσεων του Προγράμματος καθώς και αυτοί που καλύπτονται από τις οριζόντιες θεματικές αξιολογήσεις επιπτώσεων είναι οι ακόλουθοι:

ΑΠ	ΘΣ	ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ	Αξιολόγηση επιπτώσεων δράσεων του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2020	Οριζόντιες Θεματικές Αξιολογήσεις Επιπτώσεων
ΑΠ1	ΘΣ 2	ΕΣ 2.2.1 Αύξηση προσφοράς και ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες ΤΠΕ στην τοπική επιχειρηματικότητα		✓
	ΘΣ 2	ΕΣ 2.3.1 Αποδοτική διαχείριση υποδομών, δεδομένων και υπηρεσιών των ΟΤΑ		✓
	ΘΣ 3	ΕΣ 3.1.1 Αύξηση των καινοτόμων ΜΜΕ στους τομείς της RIS3 της Περιφέρειας		✓
	ΘΣ 3	ΕΣ 3.2.1 Βελτίωση της εξωστρέφειας των ΜΜΕ της Περιφέρειας		✓
	ΘΣ 3	ΕΣ 3.3.1 Βελτίωση του τεχνολογικού επιπέδου των ΜΜΕ της περιφέρειας		✓
ΑΠ2	ΘΣ 4	ΕΣ 4.3.1 Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας	✓	
	ΘΣ 4	ΕΣ 4.5.1 Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας	✓	
	ΘΣ 5	ΕΣ 5.2.1 Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών	✓	
	ΘΣ 6	ΕΣ 6.2.1 Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων	✓	
	ΘΣ 6	ΕΣ 6.3.1 Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία		✓
	ΘΣ 6	ΕΣ 6.4.1 Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας	✓	
	ΘΣ 6	ΕΣ 6.5.1 Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών		✓
ΑΠ3	ΘΣ 7	ΕΣ 7.2.1 Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος		✓
	ΘΣ 7	ΕΣ 7.2.2 Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου	✓	
ΑΠ4	ΘΣ 9 / ΕΤΠΑ	ΕΣ 9.1.1 Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες	✓	
	ΘΣ 9 / ΕΤΠΑ	ΕΣ 9.1.2 Κάλυψη των ποιοτικών και ποσοτικών αναγκών πρόνοιας, στέγασης και σίτισης των ευπαθών ομάδων		✓
	ΘΣ 9 / ΕΤΠΑ	ΕΣ 9.2.1 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου	✓	
	ΘΣ 10 / ΕΤΠΑ	ΕΣ 10.1.1.Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση	✓	
ΑΠ5	ΘΣ 8	ΕΣ 8.1.1 Αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα		✓
	ΘΣ 9 / ΕΚΤ	Ε.Σ.9.5.1 Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων	✓	
	ΘΣ 9 / ΕΚΤ	ΕΣ 9.6.1 Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση με αξιοποίηση του τοπικού δυναμικού		✓

Στη συνέχεια παρατίθενται για τους Ειδικούς Στόχους που εμπίπτουν στο πεδίο της Αξιολόγησης Επιπτώσεων παρεμβάσεων του ΕΠ Ήπειρος η οποία θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη της ΕΥΔ, τα απαιτούμενα δεδομένα και οι αντίστοιχες πηγές τους ανά θεματικό στόχο.

Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Ειδικοί Στόχοι	■ ΕΣ 4.3.1. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας ■ ΕΣ 4.5.1. Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας
Δεδομένα	<i>Δείκτες Εκροών</i> ■ CO31. Αριθμός νοικοκυριών με καλύτερη κατηγορία ενεργειακής κατανάλωσης ■ CO32. Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτηρίων ■ CO34. Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου <i>Δείκτες Αποτελέσματος</i> ■ T1613. Ετήσια εξοικονόμηση τελικής ενέργειας ■ T1614. Εκπομπή αερίων θερμοκηπίου εκτός ΣΕΔΕ <i>Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία</i> ■ Αρχικός εγκεκριμένος π/υ αξιολογούμενων παρεμβάσεων ■ Τελικός π/υ αξιολογούμενων παρεμβάσεων / πιστοποιημένες δαπάνες
Πηγές άντλησης στοιχείων	<i>Δευτερογενή δεδομένα</i> ■ Σύστημα παρακολούθησης / Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (τιμές στόχος δεικτών εκροής, τιμή επίτευξης δεικτών εκροής, εγκεκριμένος π/υ ανά πράξη, πιστοποιημένες δαπάνες ανά πράξη) ■ Στοιχεία / δεδομένα των ενεργειακών πιστοποιητικών και των μελετών σκοπιμότητας των έργων που χρηματοδοτήθηκαν από το ΠΕΠ. ■ Στοιχεία του Δικαιούχου (Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα) για το Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ' οίκον. ■ Στοιχεία /δεδομένα των Εκθέσεων του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση. <i>Πρωτογενή δεδομένα</i> -
Δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων και τρόπος αξιοποίησής τους	■ Προσδιορισμός των τιμών επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που αναφέρονται στους Ειδικούς Στόχους που θα καλύψει η συγκεκριμένη αξιολόγηση κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της, με βάση τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης (εκροές), καθώς και τα επίσημα στοιχεία των Εκθέσεων του Άρθρου 7 της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση και στοιχεία των απογραφών των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας. ■ Προσδιορισμός/εκτίμηση του βαθμού συμβολής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων (βλ. Ενότητες 1.2.1 & 1.2.2). Ο Αξιολογητής θα διερευνήσει την συνεισφορά του ΠΕΠ στην επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος του κάθε Ειδικού Στόχου και θα προσεγγίσει τα αντίστοιχα αξιολογικά ερωτήματα. ■ Εφαρμογή της θεωρίας της επιδιωκόμενης αλλαγής για τις υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις: ο Αξιολογητής θα εξετάσει πως και γιατί οι υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις του Προγράμματος οδήγησαν στα παρατηρούμενα αποτελέσματα, θα διερευνήσει τους μηχανισμούς και τις σχέσεις αιτιώδους συνάφειας που συνέβαλαν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και τους παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος που επηρέασαν τα αποτελέσματα των υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων.

Θεματικός Στόχος 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Ειδικοί Στόχοι	ΕΣ 5.2.1. Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών
Δεδομένα	<i>Δείκτες Εκροών</i> - CO20. Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων: Πληθυσμός που ωφελείται από αντιπλημμυρικά μέτρα 08704. Συστήματα αξιολόγησης και παραγωγής πληροφοριών για τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή 08705. Δράσεις πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων από κατολισθητικά φαινόμενα 08711. Έκταση προστατευόμενης περιοχής από έργα αντιπλημμυρικής προστασίας <i>Δείκτες Αποτελέσματος</i> - T1616. Έκταση περιοχών για τις οποίες απαιτείται η αξιολόγηση και διαχείριση του κινδύνου πλημμυρών και η εφαρμογή μέτρων της οδηγίας 2007/60/ΕΚ <i>Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία</i> - Αρχικός εγκεκριμένος π/υ αξιολογούμενων παρεμβάσεων - Τελικός π/υ αξιολογούμενων παρεμβάσεων / πιστοποιημένες δαπάνες
Πηγές άντλησης στοιχείων	<i>Δευτερογενή δεδομένα</i> - Σύστημα παρακολούθησης / Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (τιμές στόχος δεικτών εκροής, τιμή επίτευξης δεικτών εκροής, εγκεκριμένος π/υ ανά πράξη, πιστοποιημένες δαπάνες ανά πράξη) - Ετήσιες Εκθέσεις Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας / Πυροσβεστικού Σώματος - Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας / Στοιχεία Ειδικής Γραμματείας Υδάτων σχετικά με την εφαρμογή μέτρων της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ. <i>Πρωτογενή δεδομένα</i> -
Δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων και τρόπος αξιοποίησής τους	- Προσδιορισμός των τιμών επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που αναφέρονται στους Ειδικούς Στόχους που θα καλύψει η συγκεκριμένη αξιολόγηση κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της, με βάση τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης (εκροές), τις έρευνες πεδίου και σε συνδυασμό με άλλα στατιστικά / διοικητικά στοιχεία (Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, ΕΓΥ). - Προσδιορισμός/εκτίμηση του βαθμού συμβολής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων (βλ. Ενότητα 1.2.3). Ο Αξιολογητής θα διερευνήσει την συνεισφορά του ΠΕΠ στην επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος του κάθε Ειδικού Στόχου και θα προσεγγίσει τα αντίστοιχα αξιολογικά ερωτήματα που έχουν προσδιοριστεί σε επίπεδο ΕΣ. - Εφαρμογή της θεωρίας της επιδιωκόμενης αλλαγής για τις υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις: ο Αξιολογητής θα εξετάσει πως και γιατί οι υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις του Προγράμματος οδήγησαν στα παρατηρούμενα αποτελέσματα, θα διερευνήσει τους μηχανισμούς και τις σχέσεις αιτιώδους συνάφειας που συνέβαλαν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και τους παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος που επηρέασαν τα αποτελέσματα των υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων.

Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Ειδικοί Στόχοι	■ ΕΣ 6.2.1. Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων ■ ΕΣ 6.3.1. Αύξηση της επίδρασης της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην περιφερειακή οικονομία ■ ΕΣ 6.4.1. Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας ■ ΕΣ 6.5.1. Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος και του μικροκλίματος των αστικών περιοχών
Δεδομένα	Δείκτες Εκροών ■ CO18. Ύδρευση: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένες υπηρεσίες ύδρευσης ■ CO19. Επεξεργασία λυμάτων: Πρόσθετος πληθυσμός που εξυπηρετείται από βελτιωμένη επεξεργασία λυμάτων ■ CO09. Αύξηση του αναμενόμενου αριθμού επισκέψεων σε ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών ■ SO006. Ενέργειες προβολής φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς ■ CO23. Επιφάνεια οικοτόπων που ενισχύονται με στόχο να αποκτήσουν καλύτερο καθεστώς διατήρησης ■ CO38. Αστική ανάπτυξη: Δημιουργία ή ανάπλαση υπαίθριων χώρων σε αστικές περιοχές Δείκτες Αποτελέσματος ■ T1661. Υδατικά συστήματα με καλή κατάσταση σε τουλάχιστον μία από τις κατηγορίες (οικολογική, χημική, ποσοτική) της Οδηγίας 2000/60/ΕΕ ■ T1662. Διανυκτερεύσεις (ημεδαπών και αλλοδαπών) σε καταλύματα ξενοδοχειακού τύπου και κάμπινγκ ■ T1663. Ποσοστό Προστατευόμενων Περιοχών (σύνολο περιοχών NATURA 2000) με Εργαλεία Διαχείρισης ■ T1620. Μέγιστος αριθμός ημερών με μέση ημερήσια συγκέντρωση ΑΣ10 μεγαλύτερη από 50 µg/m³ που καταγράφεται σε σταθμό μέτρησης Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία ■ Αρχικός εγκεκριμένος π/υ αξιολογούμενων παρεμβάσεων ■ Τελικός π/υ αξιολογούμενων παρεμβάσεων / πιστοποιημένες δαπάνες
Πηγές άντλησης στοιχείων	Δευτερογενή δεδομένα ■ Σύστημα παρακολούθησης / Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (τιμές στόχος δεικτών εκροής, τιμή επίτευξης δεικτών εκροής, εγκεκριμένος π/υ ανά πράξη, πιστοποιημένες δαπάνες ανά πράξη) ■ Ετήσιες Εκθέσεις Φορέων Διαχείρισης ■ Εκθέσεις Εποπτείας και Αξιολόγησης της Κατάστασης διατήρησης Ειδών ■ Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ηπείρου (2η αναθεώρηση, 2022) ■ Εκθέσεις παρακολούθησης υδάτων κολύμβησης ■ Εθνικά στατιστικά και διοικητικά στοιχεία για την εκτίμηση των τιμών επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της αξιολόγησης (ΕΛΣΤΑΤ, Δ/ση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Ηπείρου, Δ/ση Υδάτων Περιφέρειας Ηπείρου). Πρωτογενή δεδομένα

Δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων και τρόπος αξιοποίησής τους	- - Προσδιορισμός των τιμών επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που αναφέρονται στους Ειδικούς Στόχους που θα καλύψει η συγκεκριμένη αξιολόγηση κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της, με βάση τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης (εκροές), καθώς και τα διαθέσιμα δευτερογενή δεδομένα. - Προσδιορισμός/εκτίμηση του βαθμού συμβολής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων (βλ. Ενότητες 1.2.4, 1.2.5, 1.2.6 & 1.2.7). Ο Αξιολογητής θα διερευνήσει την συνεισφορά του ΠΕΠ στην επίτευξη των δεικτών αποτελέσματος του κάθε Ειδικού Στόχου και θα προσεγγίσει τα αντίστοιχα αξιολογικά ερωτήματα. - Εφαρμογή της θεωρίας της επιδιωκόμενης αλλαγής για τις υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις: ο Αξιολογητής θα εξετάσει πως και γιατί οι υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις του Προγράμματος οδήγησαν στα παρατηρούμενα αποτελέσματα, θα διερευνήσει τους μηχανισμούς και τις σχέσεις αιτιώδους συνάφειας που συνέβαλαν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και τους παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος που επηρέασαν τα αποτελέσματα των υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων.
--	---

Θεματικός Στόχος 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Ειδικός Στόχος	ΕΣ 7.2.1. Βελτίωση της προσβασιμότητας σε αστικά κέντρα και σε σημεία τουριστικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος ΕΣ 7.2.2. Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου.
Δεδομένα	<i>Δείκτες Εκροών</i> CO13. Οδικό δίκτυο Συνολικό μήκος νέων οδών CO14. Οδικό δίκτυο Συνολικό μήκος ανακατασκευασμένων ή αναβαθμισμένων οδών SO022. Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ασφάλειας των μεταφορών <i>Δείκτες Αποτελέσματος</i> T1667. Χρονοαπόσταση T1624. Επικινδυνότητα Οδικού Δικτύου (τροχαία ατυχήματα με σωματικές βλάβες/ έτος)
Πηγές άντλησης στοιχείων	<i>Δευτερογενή δεδομένα</i> Σύστημα παρακολούθησης / Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (τιμές στόχος δεικτών εκροής, τιμή επίτευξης δεικτών εκροής, εγκεκριμένος π/υ και πιστοποιημένες δαπάνες ανά πράξη).
Δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων και τρόπος αξιοποίησής τους	- Προσδιορισμός των τιμών επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που αναφέρονται στους Ειδικούς Στόχους που θα καλύψει η συγκεκριμένη αξιολόγηση κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της, με βάση τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης (εκροές). - Προσδιορισμός/εκτίμηση του βαθμού συμβολής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων (βλ. Ενότητες 1.3.1 & 1.3.2). - Εφαρμογή της θεωρίας της επιδιωκόμενης αλλαγής για τις υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις: ο Αξιολογητής θα εξετάσει πως και γιατί οι υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις του Προγράμματος οδήγησαν στα παρατηρούμενα αποτελέσματα, θα διερευνήσει τους μηχανισμούς και τις σχέσεις αιτιώδους συνάφειας που συνέβαλαν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και τους παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος που επηρέασαν τα αποτελέσματα των υπό αξιολόγηση παρεμβάσεων.

Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης - ΕΤΠΑ

Ειδικός Στόχος	- ΕΣ 9.1.1. Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες - ΕΣ 9.2.1. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου
Δεδομένα	<i>Δείκτες Εκροών</i> - T1626. Μονάδες υγείας που βελτιώνονται - T1628. Πληθυσμός ΡΟΜΑ με βελτιωμένες συνθήκες διαβίωσης <i>Δείκτες Αποτελέσματος</i> - T1649. Βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υπηρεσιών υγείας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια) - T1666. Αριθμός χώρων που κατασκευάστηκαν βασικές υποδομές για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης
Πηγές άντλησης στοιχείων	<i>Δευτερογενή δεδομένα</i> - Σύστημα παρακολούθησης / Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (τιμές στόχος δεικτών εκροής, τιμή επίτευξης δεικτών εκροής, εγκεκριμένος π/υ και πιστοποιημένες δαπάνες ανά πράξη). - Εθνικά στατιστικά και διοικητικά στοιχεία για την εκτίμηση των τιμών επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της αξιολόγησης.
Δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων και τρόπος αξιοποίησής τους	- Προσδιορισμός των τιμών επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που αναφέρονται στους Ειδικούς Στόχους που θα καλύψει η συγκεκριμένη αξιολόγηση κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της, με βάση τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης (εκροές). - Προσδιορισμός/εκτίμηση του βαθμού συμβολής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων (βλ. Ενότητες 1.4.1 & 1.4.2). - Εφαρμογή της θεωρίας της επιδιωκόμενης αλλαγής για τις υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις: ο Αξιολογητής θα εξετάσει πως και γιατί οι υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις του Προγράμματος οδήγησαν στα παρατηρούμενα αποτελέσματα, θα διερευνήσει τους μηχανισμούς και τις σχέσεις αιτιώδους συνάφειας που συνέβαλαν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και τους παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος που επηρέασαν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

Θεματικός Στόχος 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη διά βίου μάθηση

Ειδικός Στόχος	ΕΣ 10.1.1. Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη διά βίου μάθηση
Δεδομένα	<i>Δείκτες Εκροών</i> - CO35. Δυναμικότητα των υποδομών εκπαίδευσης που ενισχύονται <i>Δείκτες Αποτελέσματος</i> - T1631. Ποσοστό πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών που έχει ολοκληρώσει μόνο τον κατώτερο κύκλο της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
Πηγές άντλησης στοιχείων	<i>Δευτερογενή δεδομένα</i> Σύστημα παρακολούθησης / Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (τιμές στόχος δεικτών εκροής, τιμή επίτευξης δεικτών εκροής, εγκεκριμένος π/υ και πιστοποιημένες δαπάνες ανά πράξη).

	Εθνικά στατιστικά και διοικητικά στοιχεία για την εκτίμηση των τιμών επίτευξης των δεικτών αποτελέσματος κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της αξιολόγησης.
Δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων και τρόπος αξιοποίησης τους	- Προσδιορισμός των τιμών επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που αναφέρονται στους Ειδικούς Στόχους που θα καλύψει η συγκεκριμένη αξιολόγηση κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της, με βάση τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης (εκροές). - Προσδιορισμός/εκτίμηση του βαθμού συμβολής των αξιολογούμενων παρεμβάσεων του Προγράμματος στην διαμόρφωση των αποτελεσμάτων (βλ. Ενότητα 1.4.3). - Εφαρμογή της θεωρίας της επιδιωκόμενης αλλαγής για τις υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις: ο Αξιολογητής θα εξετάσει πως και γιατί οι υπό αξιολόγηση παρεμβάσεις του Προγράμματος οδήγησαν στα παρατηρούμενα αποτελέσματα, θα διερευνήσει τους μηχανισμούς και τις σχέσεις αιτιώδους συνάφειας που συνέβαλαν στην επίτευξη των αποτελεσμάτων, καθώς και τους παράγοντες του ευρύτερου περιβάλλοντος που επηρέασαν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων.

Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης - ΕΚΤ

Ειδικός Στόχος	ΕΣ 9.5.1. Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων
Δεδομένα	Δείκτες Εκροών 11301. Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας Δείκτες Αποτελέσματος 11303. Αριθμός υποστηριζόμενων υφιστάμενων και νέων φορέων κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που η λειτουργία τους συνεχίζεται ένα έτος μετά τη λήξη της παρέμβασης Λοιπά απαιτούμενα στοιχεία - Θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν και διατηρήθηκαν, ως αποτέλεσμα της υλοποίησης των έργων. - Αριθμός φορέων ΚΑΛΟ και θέσεις απασχόλησης που δημιουργήθηκαν χωρίς τη χρηματοδοτική στήριξη του ΕΠ.
Δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων και τρόπος αξιοποίησης τους	Δευτερογενή δεδομένα - Σύστημα παρακολούθησης / Στοιχεία ΟΠΣ – ΕΣΠΑ 2014-2020 (τιμές στόχος δεικτών εκροής, τιμή επίτευξης δεικτών εκροής, εγκεκριμένος π/υ και πιστοποιημένες δαπάνες ανά πράξη). - Στοιχεία Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Πρωτογενή δεδομένα - Έρευνα πεδίου σε φορείς ΚΑΛΟ που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του προγράμματος και σε επιχειρήσεις που δεν ενισχύθηκαν από το ΠΕΠ ή/και από άλλη πηγή. - Ομάδα εστιασμένης συζήτησης με εκπροσώπους φορέων που σχετίζονται με το σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και παροχή υποστήριξης για τη δημιουργία φορέων κοινωνικής οικονομίας (Περιφερειακό Παρατηρητήριο, Ειδική Υπηρεσία ΕΠ, Κέντρο Στήριξης της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας κοκ.).
Δυνατότητα εξασφάλισης δεδομένων και τρόπος αξιοποίησης τους	- Προσδιορισμός των τιμών επίτευξης των δεικτών εκροών και αποτελέσματος που αναφέρονται στον Ειδικό Στόχο που θα καλύψει η συγκεκριμένη αξιολόγηση κατά την χρονική περίοδο υλοποίησης της, με βάση τα στοιχεία του συστήματος παρακολούθησης (εκροές) και τις έρευνες πεδίου. - Διενέργεια έρευνας πεδίου στους φορείς ΚΑΛΟ που ενισχύθηκαν στο πλαίσιο των παρεμβάσεων του ΠΕΠ για την αναζήτηση ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων (βαθμός ικανοποίησης αναγκών από τις παρεμβάσεις του ΕΠ, απασχόληση που δημιουργήθηκε,

	θέσεις εργασίας που διατηρούνται, συνεργασίες με άλλους φορείς, υποστήριξη από άλλους μηχανισμούς). ■ Οργάνωση ομάδας εστιασμένης συζήτησης με εκπροσώπους φορέων και οργάνων για την εκτίμηση της καταλληλότητας της παρέμβασης, τα προβλήματα και την προστιθέμενη αξία από την εφαρμογή της.
--	--

7.3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ

Στην παρούσα Ενότητα αποτυπώνεται αναλυτικά το αντικείμενο της Τελικής Αξιολόγησης Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 και εξειδικεύονται οι προδιαγραφές της, λαμβάνοντας υπόψη τόσο το Αναθεωρημένο Σχέδιο Αξιολόγησης του Προγράμματος, όσο και την ισχύουσα λογική της παρέμβασης όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά την διαγραφή ειδικών στόχων στον πλαίσιο της 6^{ης} και τελευταίας Αναθεώρησης του ΕΠ.

7.3.1. Σκοπός και Αντικείμενο της Τελικής Αξιολόγησης Επιπτώσεων του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020

Αντικείμενο της αξιολόγησης είναι η ολοκληρωμένη αξιολόγηση των επιπτώσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος και η ανάδειξη της συμπληρωματικότητας των Ταμείων που χρηματοδοτούν το Πρόγραμμα για την επίτευξη αυτών των επιπτώσεων.

Ειδικότερα, η αξιολόγηση αναφέρεται στην εκτίμηση των επιπτώσεων του Προγράμματος, ουσιαστικά διενεργώντας μια πολυθεματική αξιολόγηση αντικτύπου, η οποία θα καλύψει επιλεγμένες δράσεις που εμπίπτουν στους ακόλουθους 10 ειδικούς στόχους (9 ΕΤΠΑ και 1 ΕΚΤ):

- ☒ **ΕΣ 4.3.1.** Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας
- ☒ **ΕΣ 4.5.1.** Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας
- ☒ **ΕΣ 5.2.1.** Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών
- ☒ **ΕΣ 6.2.1.** Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων
- ☒ **ΕΣ 6.4.1.** Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας
- ☒ **ΕΣ 7.2.2.** Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου
- ☒ **ΕΣ 9.1.1.** Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες
- ☒ **ΕΣ 9.2.1.** Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου
- ☒ **ΕΣ 10.1.1.** Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση
- ☒ **Ε.Σ.9.5.1.** Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Η Τελική Αξιολόγηση Επιπτώσεων θα εμβαθύνει στους ακόλουθους άξονες:

- χαρακτήρας επιπτώσεων (αρνητικές, θετικές, ουδέτερες),
- μέγεθος επιπτώσεων (σημαντικές, μέτριες, ουδέτερες),
- διάρκεια επιπτώσεων (βραχυπρόθεσμες, μακροπρόθεσμες),
- δυνατότητα βελτίωσης των επιπτώσεων ή/και ανάταξης/αντιμετώπισης των αρνητικών επιπτώσεων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της Τελικής Αξιολόγησης Επιπτώσεων θα αξιοποιηθούν τα σχετικά ευρήματα / συμπεράσματα των οριζόντιων θεματικών αξιολογήσεων, προκειμένου να παρουσιασθούν με ενιαίο και συνεκτικό τρόπο τα αποτελέσματα και οι επιπτώσεις του συνόλου των παρεμβάσεων του Προγράμματος που έχουν εκπονηθεί, ικανοποιώντας και τη σχετική κανονιστική υποχρέωση που προκύπτει από το άρθρο 56, παρ.

3 του Καν.1303/2013, σύμφωνα με το οποίο «Κατά την περίοδο προγραμματισμού, η διαχειριστική αρχή διασφαλίζει ότι πραγματοποιούνται αξιολογήσεις, συμπεριλαμβανομένων των αξιολογήσεων για την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας, της απόδοσης και των επιπτώσεων για κάθε πρόγραμμα βάσει του σχεδίου αξιολόγησης και ότι κάθε αξιολόγηση υπόκειται σε κατάλληλη παρακολούθηση σύμφωνα με τους ειδικούς κανόνες για κάθε Ταμείο. Τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια της περιόδου προγραμματισμού, μια αξιολόγηση εκτιμά τον τρόπο με τον οποίο η υποστήριξη από τα ΕΔΕΤ έχει συμβάλει στην επίτευξη των στόχων για κάθε προτεραιότητα».

7.3.2. Κριτήρια Αξιολόγησης και Αξιολογικά Ερωτήματα

Στον Πίνακα που ακολουθεί διατυπώνονται ανά Κριτήριο Αξιολόγησης τα βασικά «Αξιολογικά Ερωτήματα» στα οποία η Αξιολόγηση θα πρέπει να απαντήσει για το σύνολο των εξεταζόμενων παρεμβάσεων – Ειδικών Στόχων, ενώ στη συνέχεια εξειδικεύονται ανά Θεματικό Στόχο.

Πίνακας 56. Κριτήρια Αξιολόγησης και Αξιολογικά Ερωτήματα

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
1.1 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τις εκροές;
1.2 Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που έχουν τεθεί ως προς τα αποτελέσματα;
1.3 Ποιοι παράγοντες επηρέασαν (θετικά ή αρνητικά) την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων του Προγράμματος;
2. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ
2.1. Πώς αξιολογείται η αποδοτικότητα των παρεμβάσεων; Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν κατά τρόπο αποτελεσματικό σε σχέση με το κόστος;
2.2. Πώς διαφοροποιήθηκε το απολογιστικό μοναδιαίο κόστος / αποδοτικότητα των παρεμβάσεων του Προγράμματος σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό τους;
2.3. Σε ποιο βαθμό ο διαθέσιμος προϋπολογισμός του Προγράμματος ήταν κατάλληλος για την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί;
3. ΕΠΙΠΤΩΣΗ
3.1. Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα της παρέμβασης;
3.2. Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στην συγκεκριμένη παρέμβαση;
3.3. Ποιες ουσιαστικές αλλαγές μπορεί να παρατηρηθούν σε σχέση με τους στόχους μετά την υλοποίηση των δράσεων; Οι αλλαγές αυτές είναι μετρήσιμες; Από ποιους παράγοντες επηρεάζονται;
3.4. Ποια είναι η σχέση αιτίου-αιτιατού για την παρατηρούμενη αλλαγή μετά την ολοκλήρωση των δράσεων;
3.5. Ποιοι είναι οι μηχανισμοί που δημιούργησαν τον αντίκτυπο; Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα των μηχανισμών αυτών;
3.6. Πώς οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις συνέβαλαν στη αύξηση του ΑΕΠ και της απασχόλησης στην Περιφέρεια Ηπείρου;
4. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ
4.1. Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης;
4.2. Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου;
5. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ
5.1. Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της περιοχής παρέμβασης;

- 5.2. Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός της παρέμβασης ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες των ωφελούμενων;
- 5.3. Υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις όπως είχαν σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι;
- 5.4. Κατά πόσο ο σχεδιασμός των δράσεων υπήρξε συνεκτικός και υποστήριξε την επίτευξη των στόχων του Προγράμματος;

6. ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ

- 6.1. Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων του Προγράμματος;
- 6.2. Με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των παρεμβάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων δράσεων;

7.3.3. Εξειδίκευση αξιολογικών ερωτημάτων ανά Θεματικό Στόχο

Θεματικός Στόχος 4: Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς

Ειδικοί Στόχοι: 4.3.1. Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του κτιριακού αποθέματος της Περιφέρειας

4.5.1. Μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος των αστικών κέντρων της Περιφέρειας

Αποτελεσματικότητα

- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι ποσοτικοί στόχοι που είχαν τεθεί;
- Βελτιώθηκε η ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων στην Περιφέρειας (βελτίωση κατηγορίας ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών της Περιφέρειας, μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας των δημόσιων κτιρίων) και σε τι βαθμό;
- Μειώθηκε το ενεργειακό αποτύπωμα των αστικών κέντρων της Περιφέρειας και σε τι βαθμό;
- Ποιοι παράγοντες επηρέασαν (θετικά ή αρνητικά) την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
- Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ;

Αποδοτικότητα

- Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί;
- Τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων συνδέονται και με ποιόν τρόπο με το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού;
- Υπήρχαν αποκλίσεις από το αρχικό μοναδιαίο κόστος των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και που οφείλονται αυτές;
- Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρέασαν την αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;

Επίπτωση

- Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα των παρεμβάσεων;
- Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στις σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν;
- Τι θα είχε συμβεί αν δεν είχαν γίνει οι παρεμβάσεις του Προγράμματος;
- Πώς οι παρεμβάσεις επηρέασαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας;
- Τι απομένει να γίνει για την ολοκλήρωση των στόχων στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας;

- Ποια είναι η συμβολή των παρεμβάσεων του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή αποδοτικότητα;

Βιωσιμότητα

- Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης;
- Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου;
- Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν είναι συμβατές με μία βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων;

Καταλληλότητα

- Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες;
- Υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις όπως είχαν σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι;

Προστιθέμενη Αξία

- Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας του Προγράμματος;
- Με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων δράσεων;

Θεματικός Στόχος 5: Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

Ειδικό Στόχοι: 5.2.1. Ενίσχυση της ικανότητας της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών

Αποτελεσματικότητα

- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί;
- Ποιοι παράγοντες επηρέασαν (θετικά ή αρνητικά) την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
- Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ;

Αποδοτικότητα

- Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί;
- Τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων συνδέονται και με ποιόν τρόπο με το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού;
- Υπήρχαν αποκλίσεις από το αρχικό μοναδιαίο κόστος των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και που οφείλονται αυτές;
- Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρέασαν την αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;

Επίπτωση

- Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα της παρέμβασης;
- Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στις σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν;
- Ενισχύθηκε η ικανότητα της Περιφέρειας στην πρόληψη και αντιμετώπιση κινδύνων και καταστροφών και σε τι βαθμό;
- Τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει η παρέμβαση;
- Πώς οι παρεμβάσεις επηρέασαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας;

- Τι απομένει να γίνει για την ολοκλήρωση των στόχων στον τομέα της πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων και φυσικών καταστροφών;
- Ποια είναι η συμβολή των παρεμβάσεων του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών για την πρόληψη και διαχείριση κινδύνων και φυσικών καταστροφών;

Βιωσιμότητα

- Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης;
- Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου;
- Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν είναι συμβατές με μία βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων;

Καταλληλότητα

- Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες;
- Υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις όπως είχαν σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι;

Προστιθέμενη Αξία

- Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων και καταστροφών;
- Με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων δράσεων;

Θεματικός Στόχος 6: Διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

Ειδικό Στόχο: 6.2.1. Αύξηση της αποτελεσματικότητας στη διαχείριση των υδατικών πόρων

6.4.1. Αποτελεσματική διαχείριση και προστασία περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας

Αποτελεσματικότητα

- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί;
- Ποιοι παράγοντες επηρέασαν (θετικά ή αρνητικά) την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
- Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ;

Αποδοτικότητα

- Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί;
- Τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων συνδέονται και με ποιόν τρόπο με το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού;
- Υπήρχαν αποκλίσεις από το αρχικό μοναδιαίο κόστος των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και που οφείλονται αυτές;
- Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρέασαν την αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;

Επίπτωση

- Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα της παρέμβασης;
- Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στις σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν;

- Βελτιώθηκε η κατάσταση των υδατικών συστημάτων της Περιφέρειας και πώς αποτιμάται η ποιότητα τους;
- Ολοκληρώθηκε το πλαίσιο των δομών ή/και των σχεδίων διαχείρισης των περιοχών NATURA 2000; Τι πρέπει επιπλέον να γίνει;
- Τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει οι παρεμβάσεις;
- Πώς οι παρεμβάσεις επηρέασαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας;
- Τι απομένει να γίνει για την ολοκλήρωση των στόχων για κάθε έναν από τους παραπάνω τομείς του περιβάλλοντος;
- Ποια είναι η συμβολή των παρεμβάσεων του Προγράμματος στην επίτευξη των στόχων εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και στρατηγικών για την διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και την αποδοτική χρήση των πόρων;

Βιωσιμότητα

- Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης;
- Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου;
- Οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν είναι συμβατές με μία βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων;

Καταλληλότητα

- Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες;
- Υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις όπως είχαν σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι;

Προστιθέμενη Αξία

- Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων αποτελεσματικής διαχείρισης των υδατικών πόρων της Περιφέρειας;
- Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων διαχείρισης και προστασίας περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής αξίας;
- Με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων δράσεων;

Θεματικός Στόχος 7: Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων

Ειδικό Στόχο: 7.2.2. Βελτίωση οδικής ασφάλειας για τη μείωση της επικινδυνότητας του οδικού δικτύου.

Αποτελεσματικότητα

- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι στόχοι που είχαν τεθεί;
- Ποιοι παράγοντες επηρέασαν (θετικά ή αρνητικά) την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
- Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ;

Αποδοτικότητα

- Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί;
- Τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων συνδέονται και με ποιόν τρόπο με το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού;
- Υπήρχαν αποκλίσεις από το αρχικό μοναδιαίο κόστος των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και που οφείλονται αυτές;

- Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρέασαν την αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;

Επίπτωση

- Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα της παρέμβασης;
- Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στις σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν;
- Τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει η παρέμβαση;
- Σε ποιο βαθμό οι παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν βελτίωσαν το επίπεδο ασφάλειας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας;

Βιωσιμότητα

- Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης;
- Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου;

Καταλληλότητα

- Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες;
- Υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις όπως είχαν σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι;

Προστιθέμενη Αξία

- Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων βελτίωσης των συνθηκών ασφάλειας του οδικού δικτύου της Περιφέρειας;
- Με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων δράσεων;

Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης - ΕΤΠΑ

Ειδικοί Στόχοι: **9.1.1** Επέκταση και βελτίωση των υποδομών υγείας και εξασφάλιση συνθηκών πρόσβασης κυρίως στις ευπαθείς ομάδες

9.2.1 Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ΡΟΜΑ της Περιφέρειας Ηπείρου

Αποτελεσματικότητα

- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι ποσοτικοί στόχοι που είχαν τεθεί;
- Ποιοι παράγοντες επηρέασαν (θετικά ή αρνητικά) την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
- Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ;

Αποδοτικότητα

- Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί;
- Τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων συνδέονται και με ποιόν τρόπο με το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού;
- Υπήρχαν αποκλίσεις από το αρχικό μοναδιαίο κόστος των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και που οφείλονται αυτές;
- Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρέασαν την αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;

Επίπτωση

- Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα των παρεμβάσεων;
- Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στις σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν;
- Πώς οι παρεμβάσεις επηρέασαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας;

Βιωσιμότητα

- Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης;
- Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου;

Καταλληλότητα

- Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες;
- Υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις όπως είχαν σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι;

Προστιθέμενη Αξία

- Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων βελτίωσης των υποδομών υγείας, καθώς και των δράσεων βελτίωσης/ανάπτυξης υποδομών για περιθωριοποιημένες κοινότητες;
- Με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων δράσεων;

Θεματικός Στόχος 10: Επένδυση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση δεξιοτήτων και τη δια βίου μάθηση

Ειδικό Στόχοι: **10.1.1.** Βελτίωση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στην εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση

Αποτελεσματικότητα

- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι ποσοτικοί στόχοι που είχαν τεθεί;
- Ποιοι παράγοντες επηρέασαν (θετικά ή αρνητικά) την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
- Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ;

Αποδοτικότητα

- Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί;
- Τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων συνδέονται και με ποιόν τρόπο με το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού;
- Υπήρχαν αποκλίσεις από το αρχικό μοναδιαίο κόστος των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και που οφείλονται αυτές;
- Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρέασαν την αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;

Επίπτωση

- Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα των παρεμβάσεων;
- Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στις σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν;
- Πώς οι παρεμβάσεις επηρέασαν την ποιότητα ζωής των κατοίκων της Περιφέρειας;

Βιωσιμότητα

- Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης;
- Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου;

Καταλληλότητα

- Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες;
- Υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις όπως είχαν σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι;

Προστιθέμενη Αξία

- Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων βελτίωσης των υποδομών εκπαίδευσης;
- Με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων δράσεων;

Θεματικός Στόχος 9: Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης - EKT

Ειδικό Στόχοι: 9.5.1. Ενίσχυση της ίδρυσης και της λειτουργίας κοινωνικών επιχειρήσεων

Αποτελεσματικότητα

- Σε ποιο βαθμό επιτεύχθηκαν οι ποσοτικοί στόχοι που είχαν τεθεί;
- Έγινε στόχευση των μειονεκτούντων ατόμων, εκείνων που προέρχονται από περιθωριοποιημένες κοινότητες και εκείνων που εντοπίζονται στην ομάδα στόχο του ΘΣ 9; Προσεγγίστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι, όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί;
- Ποιοι παράγοντες επηρέασαν (θετικά ή αρνητικά) την αποτελεσματικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;
- Ποιος είναι ο βαθμός συμβολής των αποτελεσμάτων των αξιολογούμενων παρεμβάσεων στην αντίστοιχη στοχοθεσία του ΠΕΠ;

Αποδοτικότητα

- Σε ποιο βαθμό ήταν ο διαθέσιμος προϋπολογισμός κατάλληλος για την υλοποίηση των παρεμβάσεων και την επίτευξη των στόχων που είχαν τεθεί;
- Τα αποτελέσματα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων συνδέονται και με ποιόν τρόπο με το ύψος του διαθέσιμου προϋπολογισμού;
- Υπήρχαν αποκλίσεις από το αρχικό μοναδιαίο κόστος των αξιολογούμενων παρεμβάσεων και που οφείλονται αυτές;
- Ποιοι είναι οι κρίσιμοι παράγοντες που επηρέασαν την αποδοτικότητα των αξιολογούμενων παρεμβάσεων;

Επίπτωση

- Ποια είναι τα επιθυμητά και μη επιθυμητά αποτελέσματα των παρεμβάσεων;
- Σε ποιο βαθμό οι αλλαγές (θετικές και αρνητικές) που παρατηρήθηκαν (αναμενόμενες και μη) μπορούν να αποδοθούν στις σχετικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν;
- Πόσοι φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) (με οριστική εγγραφή στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας) και άλλοι φορείς Κοινωνικής Οικονομίας δημιουργήθηκαν με τη στήριξη της παρέμβασης και συνεχίζουν να λειτουργούν ένα χρόνο μετά την ίδρυσή τους;
- Πόσο συνέβαλαν οι χρηματοδοτικές ενισχύσεις στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης;
- Πόσες νέες θέσεις (πλήρους, μερικής, εποχικής απασχόλησης) εργασίας δημιουργήθηκαν και συνεχίζουν να διατηρούνται ένα χρόνο αργότερα;

- Τι θα είχε συμβεί αν δεν είχε γίνει η παρέμβαση (πόσοι φορείς ΚΑΛΟ έχουν δημιουργηθεί χωρίς χρηματοδοτική στήριξη ή με τη στήριξη άλλων χρηματοδοτικών μέσων, πόσες θέσεις απασχόλησης δημιούργησαν και πόσες από αυτές διατηρούνται ένα χρόνο μετά τη δημιουργία τους);

Βιωσιμότητα

- Θα διατηρηθούν τα οφέλη που παράχθηκαν από την παρέμβαση και μετά την λήξη της χρηματοδότησης;
- Τα μετρήσιμα αποτελέσματα των δράσεων είναι βιώσιμα σε βάθος χρόνου;

Καταλληλότητα

- Σε ποιο βαθμό ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων ήταν κατάλληλος να αντιμετωπίσει τις ανάγκες;
- Υλοποιήθηκαν οι παρεμβάσεις όπως είχαν σχεδιαστεί και αν όχι ποιοι οι λόγοι;

Προστιθέμενη Αξία

- Ποια η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση των δράσεων;
- Με ποιον τρόπο η αποκτηθείσα εμπειρία από τον σχεδιασμό και την εφαρμογή των σχετικών παρεμβάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν στο σχεδιασμό νέων δράσεων;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020

8. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΠ ΗΠΕΙΡΟΣ 2014-2020 ΣΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ 2020

Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» βασίζεται στο μακροπρόθεσμο όραμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη των ευρωπαϊκών χωρών και περιλαμβάνει τρεις αλληλοενισχυόμενες προτεραιότητες:

- **Α. Έξυπνη ανάπτυξη:** ανάπτυξη μιας οικονομίας βασιζόμενης στη γνώση και την καινοτομία.
- **Β. Διατηρήσιμη ανάπτυξη:** προώθηση μιας πιο αποδοτικής στη χρήση πόρων, πιο πράσινης και πιο ανταγωνιστικής οικονομίας.
- **Γ. Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς:** μια οικονομία με υψηλή απασχόληση που θα επιτυγχάνει κοινωνική και εδαφική συνοχή.

Για την παρακολούθηση της Ε2020 έχουν τεθεί από την Ένωση πέντε στόχοι–για την απασχόληση, την καινοτομία, την εκπαίδευση, την κοινωνική ένταξη και το κλίμα/ενέργεια– προς επίτευξη μέχρι το 2020 και κάθε κράτος-μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς.

Το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 σχεδιάστηκε έτσι ώστε αφενός να ανταποκρίνεται στον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Περιφέρειας, αφετέρου να συμβάλλει στις προτεραιότητες της Ε2020 και στους εθνικούς στόχους που έχουν τεθεί στο πλαίσιο αυτής.

Ειδικότερα, το σύνολο των 10 Θεματικών Στόχων του Προγράμματος, με τις δράσεις που περιλαμβάνονται σε αυτούς, συνεισφέρει στις τρεις προτεραιότητες της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 και πιο συγκεκριμένα:

Θεματικοί Στόχοι 1, 2, 3: Οι εν λόγω Θεματικοί Στόχοι (των οποίων οι πόροι αντιστοιχούν στο 24,8% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και με βάση την πρόταση 6^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ η χρηματοδοτική τους βαρύτητα θα παρουσιάσει μικρή μείωση και θα διαμορφωθεί σε 22,8%) συνδέονται άμεσα με την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης. Ως εκ τούτου συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην προτεραιότητα της Ε2020 για μια «**Έξυπνη ανάπτυξη**». Ενδεικτικές δράσεις που έχουν υλοποιηθεί/υλοποιούνται και συμβάλλουν στην εν λόγω προτεραιότητα αποτελούν οι δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για ερευνητικά έργα στους τομείς αγροδιατροφής, δημιουργικής βιομηχανίας, ΤΠΕ, υγείας και βιοτεχνολογίας, οι οποίες ενεργοποιήθηκαν με την πρόσκληση 44/2017, στο πλαίσιο της οποίας υλοποιούνται 45 πράξεις, καθώς και οι δράσεις ενίσχυσης υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών (I&II), που ενεργοποιήθηκαν με τις προσκλήσεις 60/2018 & 82/2019, στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται 18 & 61 πράξεις αντίστοιχα.

Θεματικοί Στόχοι 4, 5, 6: Οι εν λόγω Θεματικοί Στόχοι (των οποίων οι πόροι αντιστοιχούν στο 34,8% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και με βάση την πρόταση 6^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ η χρηματοδοτική τους βαρύτητα θα παρουσιάσει μικρή αύξηση και θα διαμορφωθεί σε 36,3%) συνεργούν για την επίτευξη της ολοκληρωμένης μετάβασης σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον και αποτελούν τους ΘΣ που συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην προτεραιότητα της Ε2020 για μια «**Διατηρήσιμη ανάπτυξη**». Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην εν λόγω προτεραιότητα αποτελούν: η ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων υποδομών και κατοικιών, οι επενδύσεις σε έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, καθώς και σε μέσα/συστήματα πρόληψης και αντιμετώπισης καταστροφών, δράσεις ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου ύδατος, η ανάδειξη φυσικών και πολιτιστικών πόρων, δράσεις αστικής αναζωογόνησης, κλπ.

Θεματικός Στόχος 7: Ο εν λόγω Θεματικός Στόχος (του οποίου οι πόροι αντιστοιχούν στο 10,5% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος και με βάση την πρόταση 6^{ης} Αναθεώρησης του ΕΠ η χρηματοδοτική του βαρύτητα θα παρουσιάσει μικρή αύξηση και θα διαμορφωθεί σε 11%) συνδέεται με την υλοποίηση υποδομών μεταφορών στο πλαίσιο Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης και ΟΧΕ, έργα υποστήριξης ΔΕΔ-Μ, καθώς και με δράσεις βελτίωσης της οδικής ασφάλειας. Εκτιμάται ότι υποστηρίζει κατά κύριο λόγο την προτεραιότητα της Ε2020 για μια «**Διατηρήσιμη ανάπτυξη**».

Θεματικοί Στόχοι 8, 9 (ΕΚΤ): Οι εν λόγω Θεματικοί Στόχοι (των οποίων οι πόροι αντιστοιχούν στο 17,7% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος) συνδέονται με την αναβάθμιση / υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού της περιφέρειας. Ως εκ τούτου συμβάλλουν κατά κύριο λόγο στην προτεραιότητα της Ε2020 για «**Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς**», ενώ παράλληλα επιμέρους παρεμβάσεις υποστηρίζουν και την προτεραιότητα της Ε2020 για μια «**Έξυπνη ανάπτυξη**». Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στην εν λόγω προτεραιότητα αποτελούν: δράσεις επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα, δράσεις για την ενεργό ένταξη στην αγορά εργασίας ομάδων του πληθυσμού που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, λειτουργία κοινωνικών δομών (Κέντρα Κοινότητας, Δομές Αστέγων, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης, Δομές παροχής βασικών αγαθών, ΚΔΗΦ, ΚΗΦΗ, κλπ.), ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα για την προώθηση της απασχόλησης, δράσεις για την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο, δράσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, κ.λπ.

Θεματικοί Στόχοι 9 (ΕΤΠΑ), 10: Οι εν λόγω Θεματικοί Στόχοι (των οποίων οι πόροι αντιστοιχούν στο 10,7% της Δημόσιας Δαπάνης του Προγράμματος) συνεργούν στην εξασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων της Περιφέρειας σε ποιοτικές υπηρεσίες υγείας, καθώς και στη μείωση της περιφερειακότητας και του ελλείμματος σε κοινωνικές υποδομές (υγεία- πρόνοια, εκπαίδευση). Ως εκ τούτου συμβάλλουν στην προτεραιότητα της Ε2020 για «**Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς**». Ενδεικτικές δράσεις που έχουν ενεργοποιηθεί και συμβάλλουν στα ανωτέρω αποτελούν: ενίσχυση υποδομών υγείας, δημιουργία και αναβάθμιση υποδομών πρόνοιας και κοινωνικών υποδομών, ενίσχυσης υποδομών μονάδων κοινωνικής φροντίδας, ενίσχυση υποδομών εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων.

Σε ότι αφορά τη συνεισφορά του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020 στους εθνικούς στόχους της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020, σημειώνονται τα εξής:

1. Επενδύσεις σε Ε&Α (% του ΑΕΠ) (Εθνικός Στόχος: 1,3% του ΑΕΠ)

Στον εν λόγω στόχο συνεισφέρουν οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 1 του Προγράμματος και την Επενδυτική Προτεραιότητα 1b. Επισημαίνεται ότι με βάση την πρόταση 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ μηδενίζονται οι πόροι της ΕπΠρ 1a, δεδομένου ότι το μοναδικό έργο που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο της Δράσης 1.1.1.1 «Δράσεις ενίσχυσης φορέων για την ανάπτυξη αριστείας μέσα από την υποστήριξη ερευνητικών φορέων» και αφορά στην ενίσχυση των ερευνητικών υποδομών του Κέντρου Υποστήριξης Εξατομικευμένης Ιατρικής Ακρίβειας (ΚΥΕΙΑ) του ΠΓΝΙ, σύμφωνα με το Σχέδιο Δράσης του Προγράμματος θα μεταφερθεί στο νέο Πρόγραμμα Ηπείρου 2021-2027. Οι διαθέσιμοι προγραμματικοί πόροι ανέρχονται σε 9 εκατ. € και με βάση τα στοιχεία ΟΠΣ στις 07.11.2023 έχουν ενταχθεί 45 έργα συνολικής επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης περίπου 11,7 εκατ. €, με ισόποσες συμβάσεις και δαπάνες 3,72 εκατ. € τα οποία εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός της επιλέξιμης περιόδου της ΠΠ 2014-2020, με τον εκτιμώμενο π/υ ολοκλήρωσης τους να ανέρχεται σε 8,78 εκατ. €.

Στα ανωτέρω έργα η συνεισφορά των επιχειρήσεων ανέρχεται σε 2,07 εκατ. € (προϋπολογιζόμενη ιδιωτική συμμετοχή στα εγκεκριμένα έργα) και με βάση τις εκτιμήσεις για το κλείσιμο οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις θα συνεισφέρουν με πρόσθετους πόρους ύψους 1,55 εκατ. €.

Με βάση τα ανωτέρω είναι φανερό ότι η συμβολή του Προγράμματος στο στόχο της Ε2020 για τις επενδύσεις σε Ε&Α θα ανέλθει σε 10,33 εκατ. €.

2. Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (Εθνικός Στόχος 60,05 εκ. τόνοι ισοδύναμου CO₂)¹⁷

Στο στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Στρατηγικής ΕΥΡΩΠΗ 2020 συμβάλλουν οι δράσεις του Θεματικού Στόχου 4 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 2 του Προγράμματος, με τους διαθέσιμους προγραμματικούς πόρους να ανέρχονται σε 31,25 εκατ. €. Ο στόχος που έχει τεθεί στο επίπεδο

¹⁷ Εκπομπές για τομείς εκτός ΣΕΔΕ - 4% (σε σχέση με τις τιμές του 2005), Απόφαση 406/2009/ΕΚ

του Προγράμματος για τη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου ανέρχεται σε 4.543 τόνους ισοδύναμου CO₂ (Δείκτης CO34: Εκτιμώμενη ετήσια μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου) και αυξήθηκε σε 5.762 στο πλαίσιο της 6^{ης} Αναθεώρησης του Προγράμματος.

Η συμβολή του προγράμματος στον ανωτέρω στόχο προέρχεται από 6 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 53/2018, 72/2018, 73/2018 και 85/2019, που περιλαμβάνουν την αναβάθμιση κτιρίων και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στον οικιακό κτιριακό τομέα και στα δημόσια κτίρια της Περιφέρειας (ΕπΠρ 4c), εκ των οποίων οι 5 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και 1 θα μεταφερθεί στην ΠΠ 2021-2027, καθώς και από 16 ενταγμένες πράξεις των προσκλήσεων 81/2019 και 102/2020 (ΕπΠρ 4e), εκ των οποίων οι 12 εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και οι υπόλοιπες 4 θα μεταφερθούν στην ΠΠ 2021-2027.

Η υφιστάμενη συμβολή των ανωτέρω δράσεων στη μείωση των εκπομπών των αερίων θερμοκηπίου ανέρχεται σε 8.823,61 τόνους ισοδύναμου CO₂ έως το τέλος του 2022 και εκτιμάται ότι θα σημειώσει περαιτέρω αύξηση στο κλείσιμο του Προγράμματος και θα ανέλθει σε ~11.000 τόνους ισοδύναμου CO₂ (0,44% του εθνικού στόχου).

3. Ενεργειακή απόδοση – μείωση της Κατανάλωσης Ενέργειας (Εθνικοί Στόχοι: Πρωτογενής Κατανάλωση Ενέργειας: 24,7 Mtoe και Τελική Κατανάλωση Ενέργειας: 18,4 Mtoe - Μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 2,85 Mtoe το 2020)

Στο στόχο μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας συμβάλλουν άμεσα οι δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Θεματικού Στόχου 4 του Προγράμματος μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ενεργοβόρων δημοσίων κτιρίων. Η εκτιμώμενη συμβολή προβλέπεται να είναι της τάξης των 1.000.000 kWh ανά έτος (στόχος του δείκτη CO32). Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα καλυφθεί πλήρως ή και θα υπερκαλυφθεί με την ολοκλήρωση των ενταγμένων πράξεων που συμβάλλουν σε αυτόν.

4. Ποσοστό Απασχόλησης (ηλικίες 20-64) (Εθνικός Στόχος: 70%)

Στο στόχο ενίσχυσης της απασχόλησης συμβάλλουν άμεσα ή έμμεσα κυρίως οι ακόλουθες δράσεις του Προγράμματος:

- **ΕπΠρ 3a:** Δράση 3.1.1.1 «Ενίσχυση υφιστάμενων ΜΜΕ για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών». Η δράση ενεργοποιήθηκε με τις προσκλήσεις 60/2018 & 82/2019 και τροφοδοτεί το δείκτη CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος έχει προγραμματική τιμή στόχου 18 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ο στόχος αυξάνεται σε 30 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης στο πλαίσιο της 6^{ης} Αναθεώρησης του Προγράμματος). Στον δείκτη συμβάλλουν 79 ενταγμένες πράξεις με την υφιστάμενη υλοποίηση του δείκτη να ανέρχεται σε 4,25 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών ενταγμένων έργων.
- **ΕπΠρ 3b:** Δράση 3.2.1.1 «Εκπόνηση και εφαρμογή επιχειρησιακών σχεδίων ΜΜΕ για οργανωτική αναδιάρθρωση και προσανατολισμό στην εξωστρέφεια». Η δράση ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 77/2019 και τροφοδοτεί το δείκτη CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος έχει προγραμματική τιμή στόχου 1 ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης. Στον δείκτη συμβάλλουν 2 επενδυτικά σχέδια, τα οποία εντάχθηκαν το 2020 και δεν έχουν ολοκληρωθεί και από τα οποία προκύπτει συνολικός στόχος αύξησης της απασχόλησης ίσος με 3,20 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης. Ο δείκτης εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση των σχετικών ενταγμένων έργων.
- **ΕπΠρ 3c:** Δράση 3.3.1.1.A «Ενίσχυση των ΜΜΕ για επενδύσεις τεχνολογικού εκσυγχρονισμού». Η δράση ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 74/2018 και τροφοδοτεί το δείκτη CO08 «Αύξηση της απασχόλησης σε επιχειρήσεις που ενισχύονται», ο οποίος έχει προγραμματική τιμή στόχου 50 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης και παρουσιάζει τιμή υλοποίησης 2,98, καθώς έχουν ολοκληρωθεί 17 από τις 37 ενταγμένες πράξεις που συμβάλλουν στο δείκτη. Ο στόχος των ενταγμένων έργων ανέρχεται σε 9,13 ισοδύναμα πλήρους χρόνου απασχόλησης. Ο δείκτης εκτιμάται ότι δεν θα επιτευχθεί (εκτίμηση επίτευξης ~7 ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης).

- **ΕπΠρ 8i:** Δράση 8.1.1.1 «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων των τομέων αιχμής της Περιφέρειας Ηπείρου για την απασχόληση ανέργων με υψηλά τυπικά προσόντα». Η δράση ενεργοποιήθηκε με την πρόσκληση 79/2019 και τροφοδοτεί το δείκτη CO01 «Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων», ο οποίος έχει προγραμματική τιμή στόχου 290 άνεργους. Στον δείκτη συμβάλουν 261 ενταγμένες πράξεις με συνολική τιμή στόχου 285 άνεργους, ενώ η τιμή υλοποίησης του δείκτη ανέρχεται σε 343.
- **ΕπΠρ 9vi:** Τοπικά Αναπτυξιακά Προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης ευπαθών ομάδων. Ενεργοποιήθηκαν με τις προσκλήσεις 98/2020, 101/2020 και 107/2021 και τροφοδοτούν το δείκτη CO01 «Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων», ο οποίος έχει προγραμματική τιμή στόχου 272 άνεργους. Στο δείκτη συμβάλλουν 4 ενταγμένες πράξεις με συνολικό στόχο 147 άνεργους. Η υλοποίηση του δείκτη είναι μηδενική, καθώς δεν έχει ολοκληρωθεί καμία σχετική πράξη. Εκτιμάται ότι ο στόχος του δείκτη δεν θα επιτευχθεί πλήρως.

5. Πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου (Ποσοστό πληθυσμού 18-24 ετών, Εθνικός Στόχος: 10%)

Το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει δράσεις που σχετίζονται άμεσα με τον στόχο μείωσης της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Η συμβολή του στο εν λόγω στόχο είναι έμμεση και προκύπτει μέσα από τις δράσεις της ΕπΠρ 10α που αφορούν στην αναβάθμιση των υποδομών εκπαίδευσης.

6. Ολοκλήρωση τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Ποσοστό πληθυσμού 30-34 ετών, Εθνικός Στόχος: 32%)

Όπως και στη περίπτωση του προηγούμενου στόχου για την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, το Πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει εκροές ή αποτελέσματα, τα οποία να τροφοδοτούν άμεσα το εν λόγω μέγεθος.

7. Μείωση αριθμού ατόμων σε κατάσταση ή σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού (Εθνικός Στόχος: -450.000 σε σχέση με το 2008)

Ο στόχος της καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού αποτελεί έναν από τους βασικούς τομείς στους οποίους συνεισφέρει το ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, μέσα από τις δράσεις του Θεματικού Στόχου 9, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 5.

Ειδικότερα, στον εν λόγω στόχο συμβάλουν άμεσα ή έμμεσα κυρίως οι ακόλουθες δράσεις του Προγράμματος:

- **ΕπΠρ 9i:** Δράση 9.1.1.2.A «Αναβάθμιση δεξιοτήτων σε άνεργους και ενίσχυση των προοπτικών ένταξης στην αγορά εργασίας»
- **ΕπΠρ 9ii, 9iii και 9iv:** Δράσεις για τη βελτίωση της θέσης ατόμων που κινδυνεύουν από διακρίσεις, Δράσεις βελτίωσης των παρεχομένων κοινωνικών υπηρεσιών & Δράσεις στον τομέα της Υγείας: Κέντρα Κοινότητας, Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης (Ν. 4445/2016), Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά και εφήβους με νοητική υστέρηση ή/και αναπηρίες (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ), Κέντρα Δημέρευσης - Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ), Υπηρεσίες υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών και παιδιών που υφίστανται διακρίσεις, Εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, Στέγες Υποστηριζόμενης Διαβίωσης ΑΜΕΑ (ΣΥΔ), Δομές αστέγων, παρεμβάσεις παροχής υπηρεσιών στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας, στις Εξαρτήσεις καθώς και στο πεδίο της Ψυχικής Υγείας, δράσεις διασφάλισης δημόσιας υγείας και ενίσχυση υπηρεσιών Υγείας κατά την Υγειονομική Κρίση του COVID-19.
- **ΕπΠρ 9v:** Δράση 9.5.1.1 «Επιχορήγηση Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας».

Οι προγραμματικοί πόροι του Θεματικού Στόχου 9 του ΕΚΤ ανέρχονται σε 45,1 εκατ. € και αποτελούν το 15,3% των συνολικών διαθέσιμων πόρων του Προγράμματος ενώ με βάση την πρόταση 6ης Αναθεώρησης του ΕΠ η χρηματοδοτική τους βαρύτητα θα παρουσιάσει μικρή αύξηση και θα διαμορφωθεί σε 16%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

9. ΠΛΑΝΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η διάχυση της πληροφορίας και των ευρημάτων των αξιολογήσεων, καθώς και η ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών για τη βελτίωσή τους αποτελεί σημαντικό στοιχείο για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η χρήση και διάχυση των αποτελεσμάτων ενδυναμώνει τόσο την ανεξαρτησία των αξιολογήσεων, όσο και τη διαμόρφωση συστάσεων για την παραγωγή πολιτικής ή την αναθεώρηση των Προγραμμάτων.

Βασικός στόχος είναι τόσο η διάδοση/διάχυση, όσο και η αξιοποίηση των ευρημάτων και των προτάσεων της αξιολόγησης:

- Διάδοση είναι η προγραμματισμένη διαδικασία παροχής πληροφοριών σε βασικούς παράγοντες σχετικά με τα αποτελέσματα του Προγράμματος και των ευρημάτων της αξιολόγησης. Ενεργοποιείται μόλις και εφόσον είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της. Όσον αφορά την τρέχουσα αξιολόγηση, συνίσταται η όσο το δυνατόν ευρύτερη διάδοση των ευρημάτων και των προτάσεων της.
- Αξιοποίηση είναι: α) αφενός, η προγραμματισμένη διαδικασία μεταφοράς των προτάσεων για τη λήψη αποφάσεων σε εθνικά ή ευρωπαϊκά κανονιστικά συστήματα και β) αφετέρου, η προγραμματισμένη διαδικασία που έχει σκοπό να «πείσει» τους αρμόδιους να υιοθετήσουν τις προτάσεις της Αναθεώρησης του Προγράμματος.

Η διάδοση στοχεύει στο σύνολο των συμμετεχόντων στο οικοσύστημα της αξιολόγησης, ενώ η αξιοποίηση σε αυτούς που έχουν την ευθύνη της λήψης απόφασης.

Στο πλαίσιο αυτό, βασικό στοιχείο του Πλάνου Διάδοσης Συμπερασμάτων και Συστάσεων είναι ο αναλυτικός προσδιορισμός και η τυποποίηση των ομάδων χρηστών της Αξιολόγησης, προς τους οποίους θα κατευθυνθεί η διάχυση της πληροφόρησης, καθώς και των εξειδικευμένων προϊόντων και δράσεων ανά ομάδα που είναι απαραίτητα για το σκοπό αυτό (π.χ. περίληψη με εστίαση στις ανάγκες της κάθε ομάδας χρηστών, παρουσιάσεις, φυλλάδια κλπ).

Η τυποποίηση των χρηστών στο πλαίσιο της 2ης Αξιολόγησης της εφαρμογής του ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου 2014 - 2020 περιλαμβάνει τις ακόλουθες ομάδες.

- Οι εταίροι - μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΠΕΠ
- Τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση του ΠΕΠ
- Οι πολίτες της χώρας και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό π.χ. πολίτες άλλων χωρών, εμπειρογνώμονες

Όπως προκύπτει και από το θεσμικό ρόλο της η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος εξετάζει την πρόοδο στην εφαρμογή του σχεδίου αξιολόγησης και την παρακολούθηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων. Στο πλαίσιο αυτό είτε μέσω της γραπτής διαδικασίας, είτε σε τακτική συνεδρίαση θα πρέπει να πραγματοποιηθεί αναλυτική ενημέρωση των εκπροσώπων των εταίρων – μελών της Επιτροπής με όλα τα κρίσιμα συμπεράσματα και συστάσεις που προέκυψαν από την 3η Αξιολόγηση της εφαρμογής του Προγράμματος.

Ειδική ενημέρωση, που μπορεί να συνδυαστεί με τις δραστηριότητες επικοινωνίας και διάδοσης των αποτελεσμάτων υλοποίησης του Προγράμματος, προτείνεται να διενεργηθεί με αποδέκτες τα εμπλεκόμενα στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του Προγράμματος, τους κοινωνικούς εταίρους και τους λοιπούς εμπλεκόμενους στην υλοποίησή του φορείς (η πλειονότητα των οποίων εκπροσωπούνται στην Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος) και ενδεικτικά στους ακόλουθους:

1. Φορείς άσκησης πολιτικής με έμφαση στους φορείς των τομέων πολιτικής που αποτελούν προτεραιότητα για το Πρόγραμμα
2. Επιτελικές Δομές των τομέων πολιτικής που αποτελούν προτεραιότητα για το Πρόγραμμα

3. Βασικοί Δικαιούχοι του Προγράμματος, που συγκεντρώνουν το συντριπτικό τμήμα των ενταγμένων έργων του προγράμματος
4. Συλλογικοί Φορείς / Εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
5. Οικονομικοί, Κοινωνικοί Εταίροι και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
6. Σύνδεσμοι / Ενώσεις εταιρειών και επαγγελματιών με σημαντική εμπλοκή στην υλοποίηση του Προγράμματος

Για τους εταίρους - μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης πραγματοποιείται από τη Διαχειριστική Αρχή με ανάρτηση των τελικών παραδοτέων στο ΔΙΑΥΛΟ και συζήτηση στις Επιτροπές Παρακολούθησης.

Για τα λοιπά εμπλεκόμενα μέρη, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από τους φορείς που συμμετέχουν στην Επιτροπή Παρακολούθησης, οι οποίοι οφείλουν να ενεργοποιήσουν ένα δίκτυο επικοινωνίας με τους βασικούς φορείς/ ομάδες που εκπροσωπούν.

Για τους πολίτες και τις βασικές ομάδες χρηστών, η ενημέρωση για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί εξειδικευμένα με βάση συστηματοποιημένη πληροφορία που θα έχει προκύψει κατά τη διαδικασία εκπόνησης της αξιολόγησης, η οποία θα πρέπει ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες της κάθε ομάδας χρηστών.

Επιπρόσθετα, οι συστάσεις της Αξιολόγησης και η διάδοσή τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των παρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα και συγχρηματοδοτούνται με πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών Ταμείων, με στόχο μεταξύ άλλων και την ενημέρωση όλων των ευρωπαίων πολιτών.

Βασικά εργαλεία/μέσα για την διάδοση των συμπερασμάτων της αξιολόγησης του Προγράμματος αποτελούν τα ακόλουθα:

- ▶ Δίκτυο Αξιολόγησης, στο πλαίσιο του οποίου γίνεται η παρακολούθηση των βημάτων που αφορούν στην εκπόνηση των αξιολογήσεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 και η διάχυση των πορισμάτων των αξιολογήσεων μεταξύ των συμμετεχόντων.
- ▶ Εσωτερική διαδικτυακή πλατφόρμα ΔΙΑΥΛΟΣ, μέσω της οποίας γίνεται η ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος για τις αξιολογήσεις και τα αποτελέσματά τους με βάση τα θέματα αρμοδιότητάς τους.
- ▶ Ιστοσελίδα Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Ηπείρου 2014 – 2020 (www.perproe.gr), με ανάρτηση από την Διαχειριστική Αρχή, τις επιτελικές σύνοψης της αξιολόγησης του Προγράμματος.
- ▶ Ιστοσελίδα για το ΕΣΠΑ 2014-2020 (www.espa.gr), όπου οι επιτελικές περιλήψεις των αξιολογήσεων του ΕΣΠΑ ανά ομάδα χρήστη αναρτώνται από την ΕΑΣ.

Περαιτέρω, η χρησιμότητα της αξιολόγησης έγκειται και στον τρόπο διάδοσης της πληροφορίας, η οποία θα πρέπει να παρουσιάζεται με τρόπο κατανοητό προς τους υπόλοιπους χρήστες, ώστε αυτοί να ενημερώνονται και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα τα πορίσματα των αξιολογήσεων.

Η αρχή της χρησιμότητας ενισχύεται μέσω των ακόλουθων ενεργειών:

- προσδιορισμός και τυποποίηση ομάδων χρηστών στο πλαίσιο κάθε αξιολόγησης,
- διάδοση συμπερασμάτων και συστάσεων των αξιολογήσεων σε όλους τους χρήστες, στη βάση συγκεκριμένων προτάσεων ανά ομάδα χρηστών.

Ακολουθεί περιγραφή των δράσεων για τη διάδοση των πορισμάτων της 3ης Αξιολόγησης του ΕΠ Ήπειρος 2014-2020, ανά βασική Ομάδα Χρηστών:

ΟΜΑΔΑ ΧΡΗΣΤΩΝ	ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗΣ ΣΥΝΟΨΗΣ (ΠΡΟΤΑΣΗ)	ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ/ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ
Εταίροι - μέλη της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος	Αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της 3ης Αξιολόγησης του ΕΠ, εστιάζοντας στη σαφή πληροφόρηση σχετικά με την πρόοδο αλλά και τους παράγοντες που επηρέασαν την εφαρμογή του.	Παρουσίαση και ανάλυση σε συνεδρίαση της Επιτροπής, ή ενημέρωση μέσω γραπτής διαδικασίας
Λοιπά εμπλεκόμενα μέρη στην υλοποίηση του Προγράμματος	Παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης δίνοντας έμφαση στην προβολή των αποτελεσμάτων από την υλοποίηση του προγράμματος και τις ενέργειες που πραγματοποιούνται για την επίλυση τυχόν ζητημάτων.	▪ Διαδίκτυο ▪ Διαδικτυακές ημερίδες / εκδηλώσεις
Πολίτες της χώρας και το ευρύτερο ενδιαφερόμενο κοινό π.χ. πολίτες άλλων χωρών, εμπειρογνώμονες	Σύντομη παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης του Προγράμματος	▪ Διαδίκτυο ▪ Έντυπη ενημέρωση

Οι υπηρεσίες διαδικτύου αποτελούν βασικό μέσο διάδοσης και απευθύνεται σε όλες τις ομάδες χρηστών. Στην ιστοσελίδα του ΕΠ προτείνεται η παρουσίαση των ευρημάτων συμπερασμάτων και συστάσεων της Αξιολόγησης του Προγράμματος να είναι συνοπτική όταν απευθύνεται στο ευρύ κοινό και αναλυτική για τα μέλη της επιτροπής και τα εμπλεκόμενα μέρη. Όσον αφορά στην προβολή των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης μέσω των κοινωνικών δικτύων, προτείνεται το περιεχόμενο να είναι σύντομο μέσω στοχευμένων παρουσιάσεων.

Τέλος, σημειώνεται ότι τόσο οι διαδικτυακές Ημερίδες / Εκδηλώσεις, όσο και η έντυπη ενημέρωση μπορούν να συνδυασθούν με τις δράσεις δημοσιότητας και προβολής των αποτελεσμάτων από την εφαρμογή και υλοποίηση του Προγράμματος.
